

**İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI 3. DÖNEM
İL KOORDİNASYON TOPLANTISI**

AFYONKARAHİSAR



www.ilbank.gov.tr



İLBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ



İL BANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ



www.ilbank.gov.tr

AFYONKARAHİSAR İLİ DAHİLİNDE

2 Adet İçmesuyu, 2 Adet GES, 8 Adet Üstyapı, 15 Adet Altyapı, 1 Adet Proje ve 1 Adet Harita ve İmar Planlama İşi olmak üzere toplam **29 Adet** proje ile Yerel Yönetimlerimize hizmette bulunmaktadır. Bunlardan **22** tanesi **Bitirilmiş olup**, 7 tanesi ise **Devam etmektedir**.

Toplam Proje Tutarı 300.529.963,51-TL olup, **2024** Yılı içerisinde **134.316.485,93-TL** harcama yapılmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı % 92 ve Fiziki Gerçekleşme Oranı % 93 seviyesindedir.



İÇMESUYU SEKTÖRÜNDE;
Bankamızca SUKAP kapsamında ihale edilen
Çıkrık (Afyonkarahisar) İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 13.020.142,80-TL
Sözleşme Tarihi	: 29.09.2022
Yer Teslim Tarihi	: 12.10.2022
İş Bitim Tarihi	: 19.01.2024
2024 Yılı Yapılan Harcama	: -TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 100
Fiziki Gerçekleşme	: % 100

***19.01.2024 tarihinde Geçici Kabulü Yapıldı.**

ÇIKRIK (AFYONKARAHİSAR) İÇMESUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ





İL BANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

**İÇMESUYU SEKTÖRÜNDE;
Kocatepe (Afyonkarahisar) İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi:**

İhale Bedeli	: 4.073.200,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 17.10.2023
Yer Teslim Tarihi	: 17.10.2023
İş Bitim Tarihi	: 09.01.2024
2024 Yılı Yapılan Harcama	: 3.589.945,20 -TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 100
Fiziki Gerçekleşme	: % 100

***09.01.2024 tarihinde Geçici Kabulü Yapıldı.**

KOCATEPE (AFYONKARAHİSAR) İÇMESUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ





ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

**ÜSTYAPI SEKTÖRÜNDE;
Sultandağı (Afyonkarahisar)**


**1 Adet Çelik Konstrüksiyon İlçe Giriş Kapısı ve 47 Adet Aydınlatma Direği ile
Çevre Düzenleme Yapım İşi:**

İhale Bedeli	: 3.023.400,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 01.03.2024
Yer Teslim Tarihi	: 01.03.2024
İş Bitim Tarihi	: 22.03.2024
2024 Yılı Yapılan Harcama	: 3.628.080,00-TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 100
Fiziki Gerçekleşme	: % 100

***22.03.2024 tarihinde Geçici Kabulü Yapıldı.**

www.ilbank.gov.tr

SULTANDAĞI (AFYONKARAHİSAR)
1 ADET ÇELİK KONSTRÜKSİYON İLÇE GİRİŞ KAPISI VE 47 ADET AYDINLATMA
DİREĞİ İLE ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ

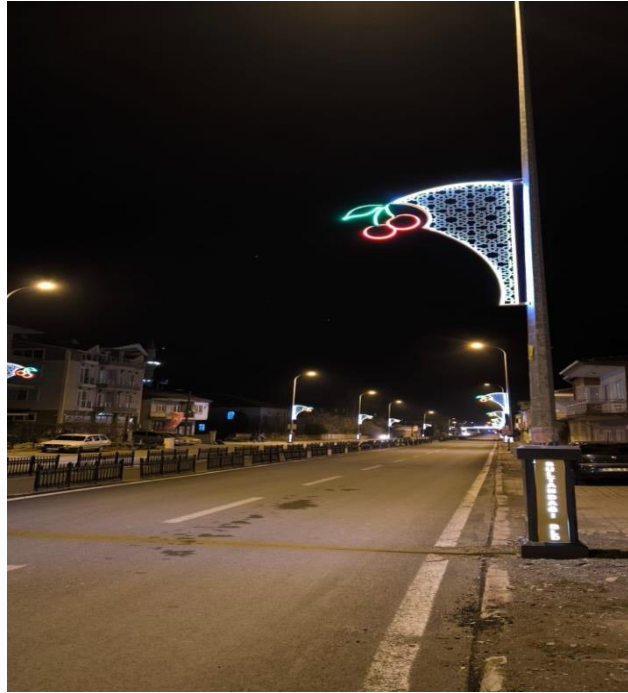



İL BANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ÜSTYAPI SEKTÖRÜNDE;

Bolvadin (Afyonkarahisar) Kentsel Yenileme Sınırları İçerisinde 927 Ada 3 Parselde İnşaat Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 44.444.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 23.06.2023
Yer Teslim Tarihi	: 23.06.2023
İş Bitim Tarihi	: 2024
2024 Yılı Yapılan Harcama	: 14.111.554,66 -TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 88
Fiziki Gerçekleşme	: % 88

***Çalışmalar Devam Ediyor.**

BOLVADİN (AFYONKARAHİSAR) KENTSEL YENİLEME YAPIM İŞİ:





İL BANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ÜSTYAPI SEKTÖRÜNDE;

Çobanlar (Afyonkarahisar) Meydan Tadilatı ve Tamirâtı Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 4.155.755,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 13.11.2023
Yer Teslim Tarihi	: 17.11.2023
İş Bitim Tarihi	: 16.01.2024
2024 Yılı Yapılan Harcama	: 2.987.988,62 -TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 100
Fiziki Gerçekleşme	: % 100

***16.01.2024 tarihinde Geçici Kabulü Yapıldı.**

ÇOBANLAR (AFYONKARAHİSAR) MEYDAN TADİLATI VE TAMİRATI YAPIM İŞİ





İL BANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

**ÜSTYAPI SEKTÖRÜNDE;
Hocalar (Afyonkarahisar) Kapalı Pazaryeri Yapım İşi:**

İhale Bedeli	: 9.191.600,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 15.04.2024
Yer Teslim Tarihi	: 15.04.2024
İş Bitim Tarihi	: 2024
2024 Yılı Yapılan Harcama	: 3.492.270,84-TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 32
Fiziki Gerçekleşme	: % 35
*Çalışmalar Devam Ediyor.	

HOCALAR (AFYONKARAHİSAR) KAPALI PAZARYERİ YAPIM İŞİ





İL BANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ÜSTYAPI SEKTÖRÜNDE;

Fethibey (Afyonkarahisar) Düğün Salonu Kaba İnşaatı Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 8.211.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 01.12.2023
Yer Teslim Tarihi	: 06.12.2023
İş Bitim Tarihi	: 09.05.2024
2024 Yılı Yapılan Harcama	: 9.853.200,00 -TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 100
Fiziki Gerçekleşme	: % 100
*09.05.2024 tarihinde Geçici Kabulü Yapıldı.	

FETHİBEY (AFYONKARAHİSAR) DÜĞÜN SALONU KABA İNŞAATI YAPIM İŞİ





İL BANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ÜSTYAPI SEKTÖRÜNDE;

Afyonkarahisar Merkez Belediyesi Sokak Sağlıklaştırma Yapım İşi 2:

İhale Bedeli	: 42.713.704,03-TL
Sözleşme Tarihi	: 27.05.2022
Yer Teslim Tarihi	: 30.05.2022
İş Bitim Tarihi	: 07.08.2024
2024 Yılı Yapılan Harcama	: 17.059.838,69-TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 100
Fiziki Gerçekleşme	: % 100
*Geçici Kabul Aşamasında.	

AFYONKARAHİSAR MERKEZ BELEDİYESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA YAPIM İŞİ 2





İL BANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

**ÜSTYAPI SEKTÖRÜNDE;
İscehisar (Afyonkarahisar) Millet Bahçesi Yapım İşi:**

İhale Bedeli	: 3.115.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 14.08.2023
Yer Teslim Tarihi	: 19.09.2023
İş Bitim Tarihi	: 2024
2024 Yılı Yapılan Harcama	: -TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 58
Fiziki Gerçekleşme	: % 58
*Çalışmalar Devam Ediyor.	

İSCEHİSAR (AFYONKARAHİSAR) MİLLET BAHÇESİ YAPIM İŞİ





İL BANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ÜSTYAPI SEKTÖRÜNDE;

Dinar (Afyonkarahisar) Kapalı Pazaryeri 2. Etap (Çatı) Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 7.245.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 25.01.2024
Yer Teslim Tarihi	: 29.01.2024
İş Bitim Tarihi	: 24.06.2024
2024 Yılı Yapılan Harcama	: 8.734.449,85-TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 100
Fiziki Gerçekleşme	: % 100
*24.06.2024 tarihinde Geçici Kabulü Yapıldı.	

DİNAR (AFYONKARAHİSAR) KAPALI PAZARYERİ 2. ETAP (ÇATI) YAPIM İŞİ





İL BANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

GES SEKTÖRÜNDE;

Sülümenli (Afyonkarahisar) 350 KW Gücünde Ges Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 7.050.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 24.01.2024
Yer Teslim Tarihi	: 25.01.2024
İş Bitim Tarihi	: 2024
2024 Yılı Yapılan Harcama	: 6.913.648,19-TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 82
Fiziki Gerçekleşme	: % 95
*Çalışmalar Devam Ediyor.	

SÜLÜMENLİ (AFYONKARAHİSAR) 350 KW GÜCÜNDE GES YAPIM İŞİ





İL BANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ALTYAPI SEKTÖRÜNDE;

Sandıklı (Afyonkarahisar) Kilitli Beton Parke Taş İle Yol Tamirâtı Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 4.618.200,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 03.01.2024
Yer Teslim Tarihi	: 04.01.2024
İş Bitim Tarihi	: 14.02.2024
2024 Yılı Yapılan Harcama	: 5.541.840,00-TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 100
Fiziki Gerçekleşme	: % 100

****14.02.2024 tarihinde Geçici Kabulü Yapıldı.**

SANDIKLI (AFYONKARAHİSAR) KİLİTLİ BETON PARKE TAŞ İLE YOL TAMİRATI YAPIM İŞİ





İL BANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

**ALTYAPI SEKTÖRÜNDE;
Sandıklı (Afyonkarahisar) Sıcak Asfalt İle Yol Yapım İşi:**

İhale Bedeli	: 7.740.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 10.01.2024
Yer Teslim Tarihi	: 10.01.2024
İş Bitim Tarihi	: 02.02.2024
2024 Yılı Yapılan Harcama	: 9.288.000,00-TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 100
Fiziki Gerçekleşme	: % 100
*02.02.2024 tarihinde Geçici Kabulü Yapıldı.	



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

SANDIKLI (AFYONKARAHİSAR) SICAK ASFALT İLE YOL YAPIM İŞİ





İL BANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ALTYAPI SEKTÖRÜNDE;

Emirdağ (Afyonkarahisar) Beton Parke Taş ve Sıcak Asfalt İle Yol Yapım İşi 1:

İhale Bedeli	: 14.550.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 06.04.2023
Yer Teslim Tarihi	: 13.04.2023
İş Bitim Tarihi	: 22.01.2024
2024 Yılı Yapılan Harcama	: 1.139.191,68-TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 100
Fiziki Gerçekleşme	: % 100
*22.01.2024 tarihinde Geçici Kabulü Yapıldı.	



İL BANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

EMİRDAĞ (AFYONKARAHİSAR) BETON PARKE TAŞ VE SICAK ASFALT İLE YOL YAPIM İŞİ 1





İL BANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ALTYAPI SEKTÖRÜNDE;

Emirdağ (Afyonkarahisar) Beton Parke Taş ve Sıcak Asfalt İle Yol Yapım İşi 2:

İhale Bedeli	: 10.599.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 12.05.2023
Yer Teslim Tarihi	: 16.05.2023
İş Bitim Tarihi	: 22.01.2024
2024 Yılı Yapılan Harcama	: 1.461.878,40-TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 100
Fiziki Gerçekleşme	: % 100
*22.01.2024 tarihinde Geçici Kabulü Yapıldı.	



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

EMİRDAĞ (AFYONKARAHİSAR) BETON PARKE TAŞ VE SICAK ASFALT İLE YOL YAPIM İŞİ 2





İL BANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ALTYAPI SEKTÖRÜNDE;

Emirdağ (Afyonkarahisar) Beton Parke Taş ve Sıcak Asfalt İle Yol Yapım İşi 3:

İhale Bedeli	: 5.528.090,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 05.05.2023
Yer Teslim Tarihi	: 10.05.2023
İş Bitim Tarihi	: 22.01.2024
2024 Yılı Yapılan Harcama	: 6.523.146,20-TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 100
Fiziki Gerçekleşme	: % 100
*22.01.2024 tarihinde Geçici Kabulü Yapıldı.	



İL BANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

EMİRDAĞ (AFYONKARAHİSAR) BETON PARKE TAŞ VE SICAK ASFALT İLE YOL YAPIM İŞİ 3





İL BANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ALTYAPI SEKTÖRÜNDE;

Emirdağ (Afyonkarahisar) Beton Parke Taş ve Sıcak Asfalt İle Yol Yapım İşi 4:

İhale Bedeli	: 11.690.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 13.11.2023
Yer Teslim Tarihi	: 14.11.2023
İş Bitim Tarihi	: 2024
2024 Yılı Yapılan Harcama	: 14.028.000,00-TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 100
Fiziki Gerçekleşme	: % 100

***Çalışmalar Tamamlandı.**

EMİRDAĞ (AFYONKARAHİSAR) BETON PARKE TAŞ VE SICAK ASFALT İLE YOL YAPIM İŞİ 4





İL BANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ALTYAPI SEKTÖRÜNDE;

Emirdağ (Afyonkarahisar) Beton Parke Taş ve Bordür Döşenmesi Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 14.550.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 29.11.2023
Yer Teslim Tarihi	: 30.11.2023
İş Bitim Tarihi	: 2024
2024 Yılı Yapılan Harcama	: 5.225.940,00-TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 100
Fiziki Gerçekleşme	: % 100

***Çalışmalar Tamamlandı.**



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

EMİRDAĞ (AFYONKARAHİSAR) BETON PARKE TAŞ VE BORDÜR DÖŞENMESİ YAPIM İŞİ



HARİTA-İMAR PLANLAMA SEKTÖRÜNDE;
Çobanlar (Afyonkarahisar) İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etüt Yapım İşi:

İhale Bedeli	: 3.746.000,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 28.03.2024
Yer Teslim Tarihi	: 28.03.2024
İş Bitim Tarihi	: 19.09.2024
2024 Yılı Yapılan Harcama	: 4.495.200,00-TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 100
Fiziki Gerçekleşme	: % 100

***19.09.2024 tarihinde Onaylandı.**



İL BANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

PROJE SEKTÖRÜNDE;
Karamıkkaracaören (Afyonkarahisar) İçmesuyu Kesin Projesi:

İhale Bedeli	: 900.010,00-TL
Sözleşme Tarihi	: 02.07.2024
Yer Teslim Tarihi	: 02.07.2024
İş Bitim Tarihi	: 2024
2024 Yılı Yapılan Harcama	: 216.002,40-TL
Nakdi Gerçekleşme	: % 20
Fiziki Gerçekleşme	: % 20
*Etap (A) çalışmaları devam ediyor.	

AFYONKARAHİSAR İLİ DAHİLİNDE HİBE/KREDİ TAHSİS EDİLEN İŞLER

BELEDİYE/YEREL YÖNETİM	İŞİN ADI	TAHSİS EDİLEN HİBE/KREDİ MİKTARI	AÇIKLAMA
FETHİBEY	Fethibey (Afyonkarahisar) Güneş Enerjisi Santrali Yapımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alım İşi	4.439.771,20-TL	Bankamızın Tahsis Etmiş Olduğu Kredinin Tamamı Malzeme Alımlarında Kullanılmıştır.
SULTANDAĞI	Sultandağı (Afyonkarahisar) Bitüm Malzeme ve Beton Parke Taş Alım İşi	1.600.000,00-TL	Bankamızın Tahsis Etmiş Olduğu Kredinin Tamamı Bitüm Malzeme ve Sıcak Asfalt Alımlarında Kullanılmıştır.
İŞIKLAR	İşıklar (Afyonkarahisar) Beton Parke Taş ve Bordür Alım İşi	2.500.000,00 –TL	Bankamızın Tahsis Etmiş Olduğu Kredinin Tamamı Beton Parke Taş Alımlarında Kullanılmıştır.
SANDIKLI	Sandıklı (Afyonkarahisar) Sıcak Asfalt ve Yol Yapımında Kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme Alım İşi	5.000.000,00-TL	Bankamızın Tahsis Etmiş Olduğu Hibenin Tamamı Malzeme ve Sıcak Asfalt Alımlarında Kullanılacaktır.

AFYONKARAHİSAR İLİ DAHİLİNDE HİBE/KREDİ TAHSİS EDİLEN İŞLER

BELEDİYE/YEREL YÖNETİM	İŞİN ADI	TAHSİS EDİLEN HİBE/KREDİ MİKTARI	AÇIKLAMA
ŞUHUT	Şuhut (Afyonkarahisar) Belediyesi Çeşitli Cadde Ve Sokaklarda Parke Taşı Yapım İşi	245.700,00-TL	01.07.2024 tarihinde Geçici Kabulü Yapıldı.
ŞUHUT	Şuhut (Afyonkarahisar) Parke Taşı Yapım İşi	240.840,00-TL	24.07.2024 tarihinde Geçici Kabulü Yapıldı.
AHMETPAŞA	Ahmetpaşa (Afyonkarahisar) Kilitli Parke Taş ve Bordür Alım İşi	2.000.000,00-TL	Bankamızın Tahsis Etmiş Olduğu Hibenin Tamamı Beton Parke Taş ve Bordür Alımlarında Kullanılmıştır.
SUSUZ	Susuz (Afyonkarahisar) Kilitli Parke Taş ve Bordür Alım İşi	3.000.000,00-TL	Bankamızın Tahsis Etmiş Olduğu Hibenin Tamamı Beton Parke Taş ve Bordür Alımlarında Kullanılmıştır.
SÜLÜMENLİ	Sülümenli (Afyonkarahisar) Yol Yapım İşi	2.000.000,00-TL	Çalışmalar Tamamlandı.



İRAP (İL RİSK AZALTMA PLANI) KAPSAMINDA

Afet ve Acil Durumlarda Kullanılmak Üzere;

Çelik Boru ve Duktıl Boru

alınarak Afyonkarahisar AFAD Müdürlüğü Yerleşkesine Depolanmıştır.



Arz Ederim...

Meral EMEL
Bölge Müdür V.

www.ilbank.gov.tr
