

2017 YILI YATIRIM PROGRAMI

2017 yılı yatırım programında;

- 22 adet Büyük Su İşi,
- 32 adet Taşkın Koruma,
 - 8 adet Taşkın Rusubat Kontrol,
- 36 adet Gölet ve Sulaması,
 - 5 adet Yerüstü Sulaması,
- 14 adet Gölet Sulaması,
- 19 adet YAS Sulaması olmak üzere 136 adet proje yer almıştır.

Söz konusu 136 adet işin Proje tutarı 1.288.490.358 TL,
2017 yılı ödeneği 174.234.739 TL, 2017 yılı Harcaması 102.156.155 TL
2016 yılı harcaması 310.381.992 TL'dir.

AFYONKARAHİSAR İLİ YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU

1-TOPLANTI DÖNEMİ	:	01 Ocak 2017 – 30 haziran 2017
2-YATIRIMCI KURULUŞUN ADI	:	DSİ 18. Bölge Müdürlüğü/ ISPARTA
3-TOPLAM PROJE SAYISI	:	136
4-PROJELERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI	:	
TARIM Sektörü	:	122
ENERJİ Sektörü	:	
HİZMET Sektörü	:	14
5-TOPLAM PROJE TUTARI	:	1.288.490.358
6-ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	:	310.381.992
7-YILI ÖDENEĞİ	:	174.234.739
8-DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	:	102.156.155
9-PARASAL GERÇEKLEŞME (%)	:	59
10-FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	:	29
11-BİTEN PROJE SAYISI	:	17
12-DEVAM EDEN PROJE SAYISI	:	64
13-İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	:	55
14-BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI	:	
BAŞLANAMAMA NEDENLERİ	:	
15- FESİH EDİLEN PROJE SAYISI	:	
16-ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR	:	
17-SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ	:	
18-ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER	:	

AFYONKARAHİSAR ÇAY SELEVİR SULAMASI YENİLEMESİ

İşin Toplam İhale Bedeli	:	43.919.600 TL
İşe Başlama Tarihi	:	26.04.2017
İş Bitim Tarihi	:	25.04.2021
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	
2017 Yılı Ödeneği	:	4.500.000TL
2017 Yılı Harcaması	:	0

Açıklamalar :


26.04.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.

AFYONKARAHİSAR ÇAY SELEVİR SULAMASI YENİLEMESİ MALZEME ALIM 1. KISIM

İşin Toplam İhale Bedeli	:	52.112.413 TL
İşe Başlama Tarihi	:	
İş Bitim Tarihi	:	
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	
2017 Yılı Ödeneği	:	500.000 TL
2017 Yılı Harcaması	:	0

Açıklamalar :

1. kısım Malzeme temini için 75.492 metre HDPE Boru ve 23.280 metre Çelik Boru temini yapılacaktır. 29.06.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.

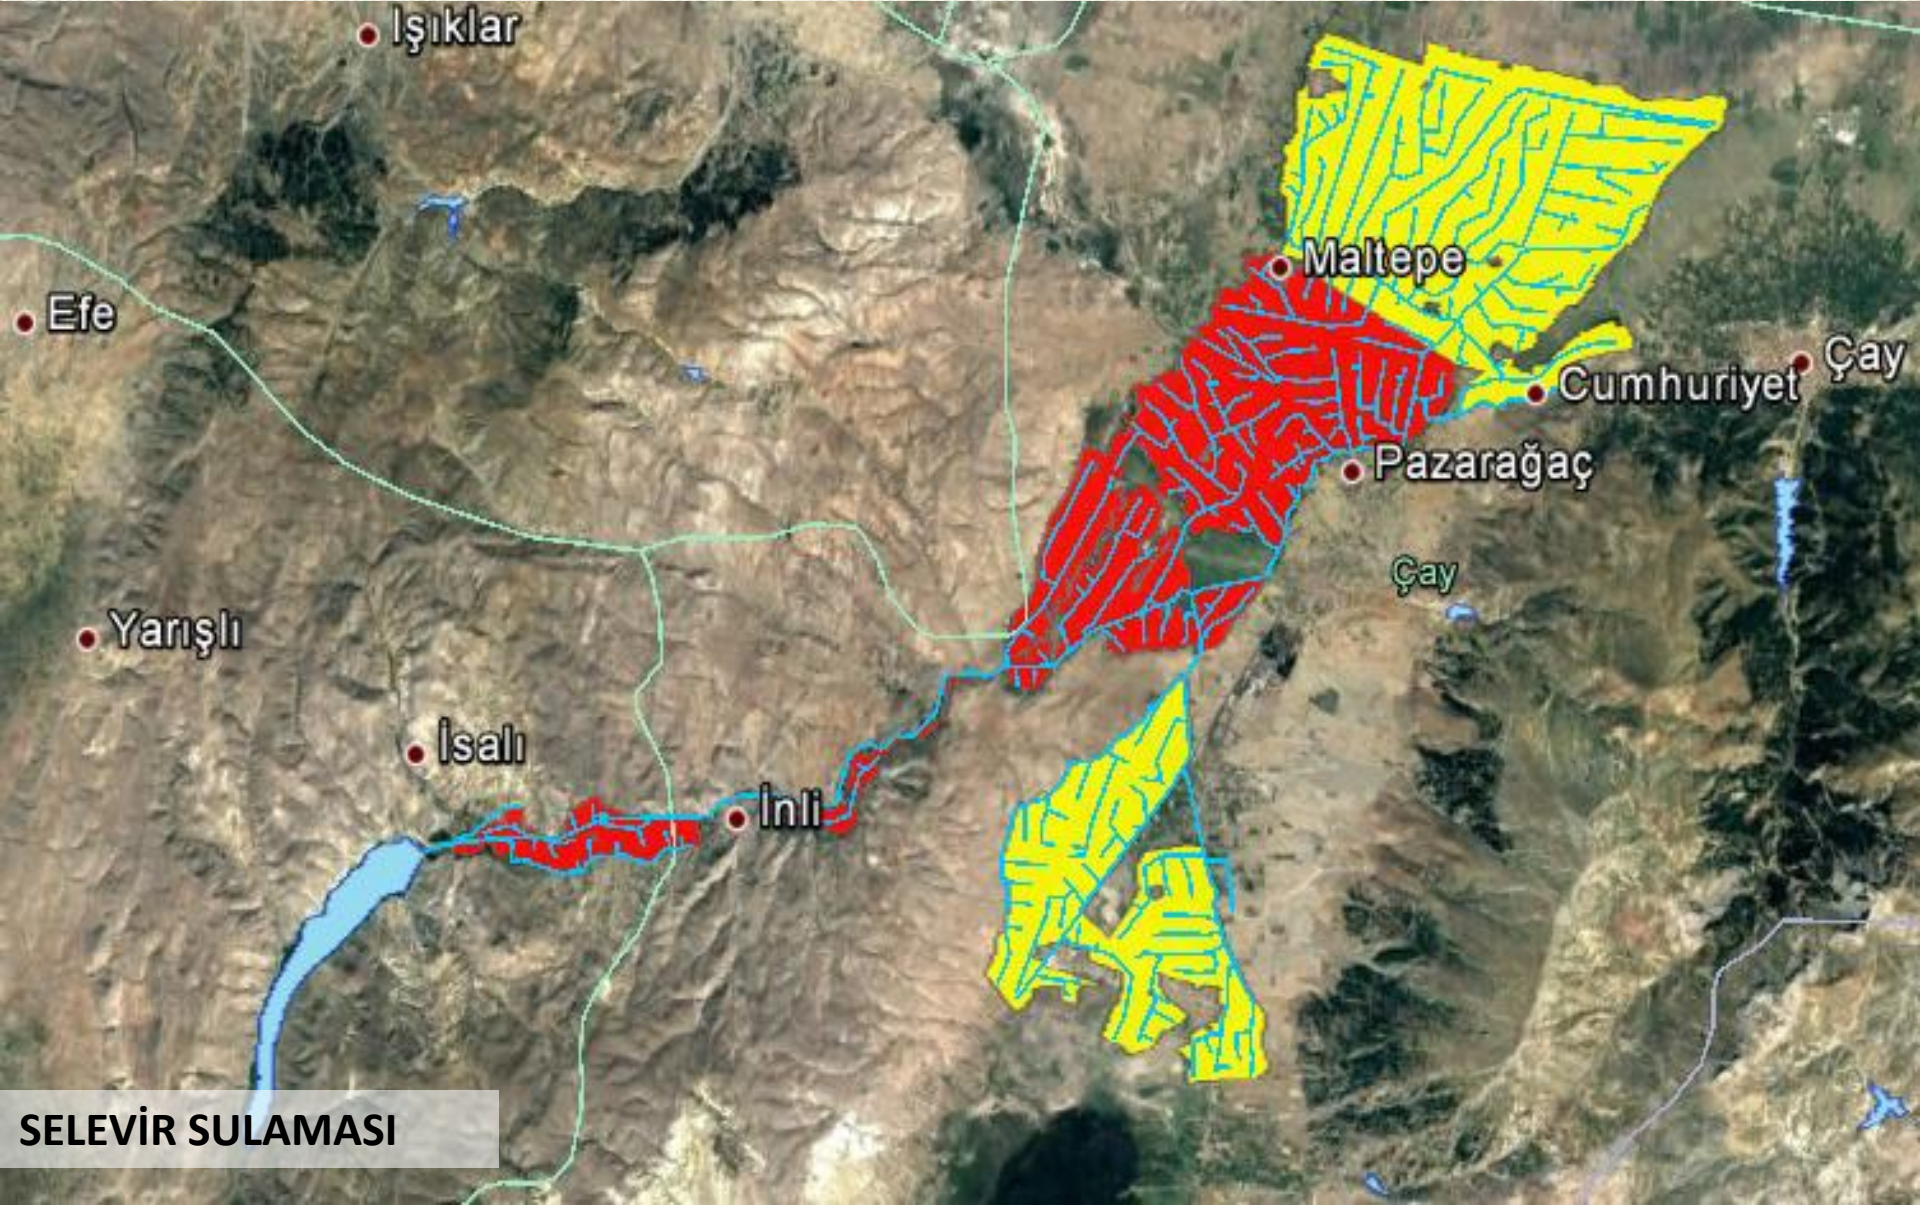

AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR SEYİTLER SULAMASI YENİLEMESİ

İşin Toplam İhale Bedeli	:	19.450.423 TL
İşe Başlama Tarihi	:	22.06.2017
İş Bitim Tarihi	:	21.06.2020
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	0
2017 Yılı Ödeneği	:	5 000 000 TL
2017 Yılı Harcaması	:	0

Açıklamalar :

22.06.2017 tarihinde işe başlanmıştır.


AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR SEYİTLER SULAMASI YENİLEME MALZEME ALIMI YENİLEME 1. KISIM

İşin Toplam İhale Bedeli	:	17.863.165 TL
İşe Başlama Tarihi	:	29.06.2017
İş Bitim Tarihi	:	26.12.2017
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	0
2017 Yılı Ödeneği	:	2 000 000 TL
2017 Yılı Harcaması	:	0

Açıklamalar :

1. kısım Malzeme temini için 53.112 metre HDPE Boru ve 4.932 metre Çelik Boru temin edilecektir.

SEYİTLER SULAMASI

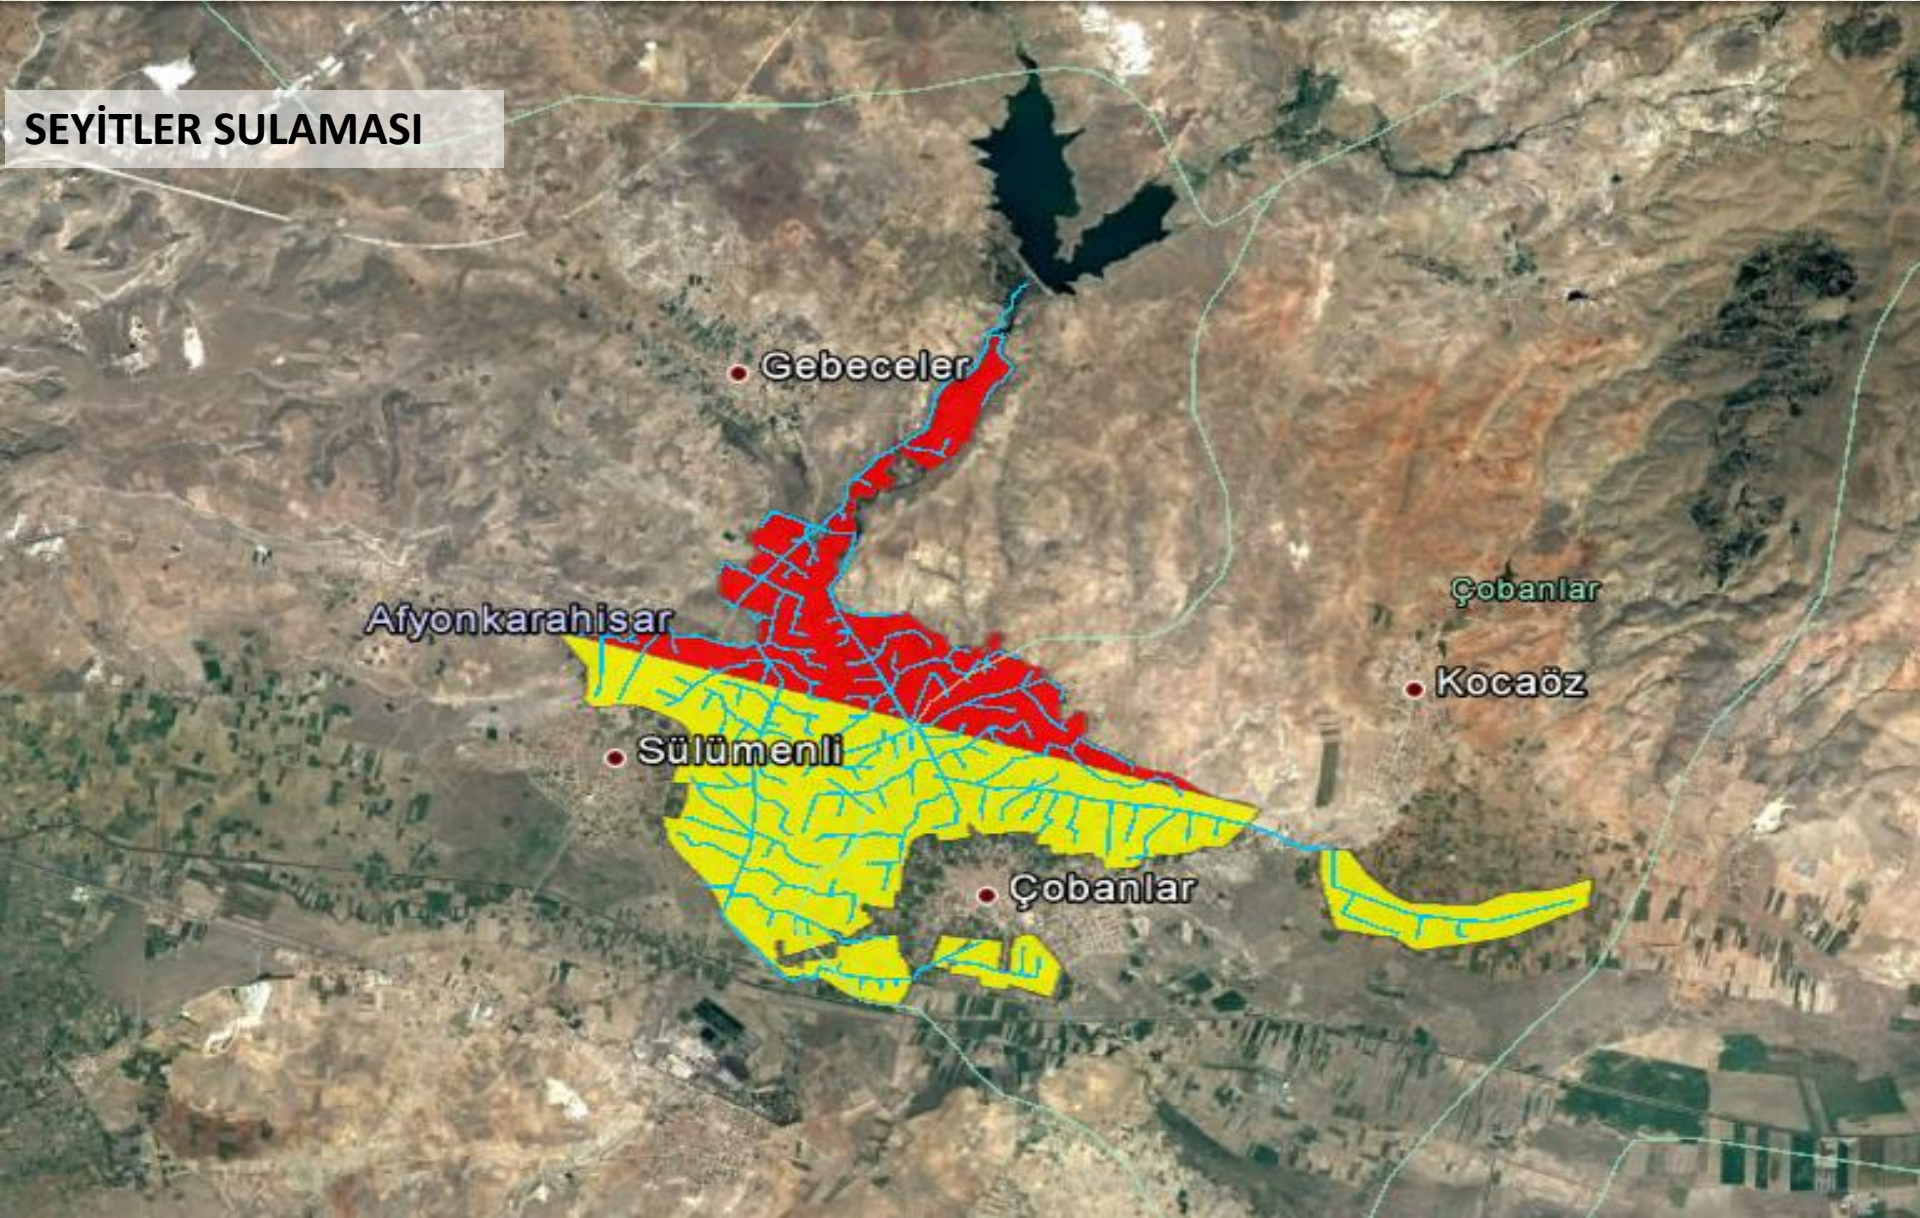

AFYONKARAHİSAR ÇAY PROJESİ

AFYONKARAHİSAR ÇAY BARAJI

İşin İhale Bedeli	: 33.503.000 TL
İhale Tarihi	: 02.09.2013
İşe Başlama Tarihi	: 24.10.2013
İş Bitim Tarihi	: 01.08.2017
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	: 67
2017 Yılı Ödeneği	: 4.154.593 TL
2017 Yılı Harcaması	: 2.673.505 TL

Açıklamalar : Onaylı revize projeye göre; mevcut kaya dolgu 1090 kotuna kadar indirilmiştir. Plint betonu imalatlarında 193 m'lik kısım tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. 20 m yüksekliğinde bordür betonu imalatları tamamlanmış olup imalat devam etmektedir. 66 adet kapak, 40 adet perde enjeksiyonu ve ara kuyularda 13 adet kuyuda enjeksiyon tamamlandı, imalat devam etmektedir. 1090 kotunda gövdeye 65.000 m3 filtre malzemesi nakli tamamlandı. Çalışmalar devam etmektedir. Mansap kum-çakıl ve filtre dolgusu ve riprap imalatı devam etmektedir.



ÇAY BARAJI




ÇAY BARAJI

AFYONKARAHİSAR ÇAY BARAJI SULAMASI

İşin İhale Bedeli	: 23.862.333 TL
İhale Tarihi	: 17.05.2016
İşe Başlama Tarihi	: 18.11.2016
İş Bitim Tarihi	: 18.11.2019
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	: 47
2017 Yılı Ödeneği	: 10.166.407 TL
2017 Yılı Harcaması	: 10.159.300 TL

Açıklamalar : 68.301 m HDPE-100 Boru şantiyeye indirilmiş, numune testleri tamamlanmış ve uygunluğu alınmıştır. Ana hat güzergahında kazı ve modelleme çalışmaları devam etmektedir. Hat güzergahının tamamına çalışmaları yayabilmek için yüklenici arazi sahipleri ile görüşmekte ve belediye imar sınırları dahilindeki güzergah ile ilgili yazışmalar devam etmektedir. DN630 ana hatta 1200m HDPE boru imalatı ile işe başlanmıştır.

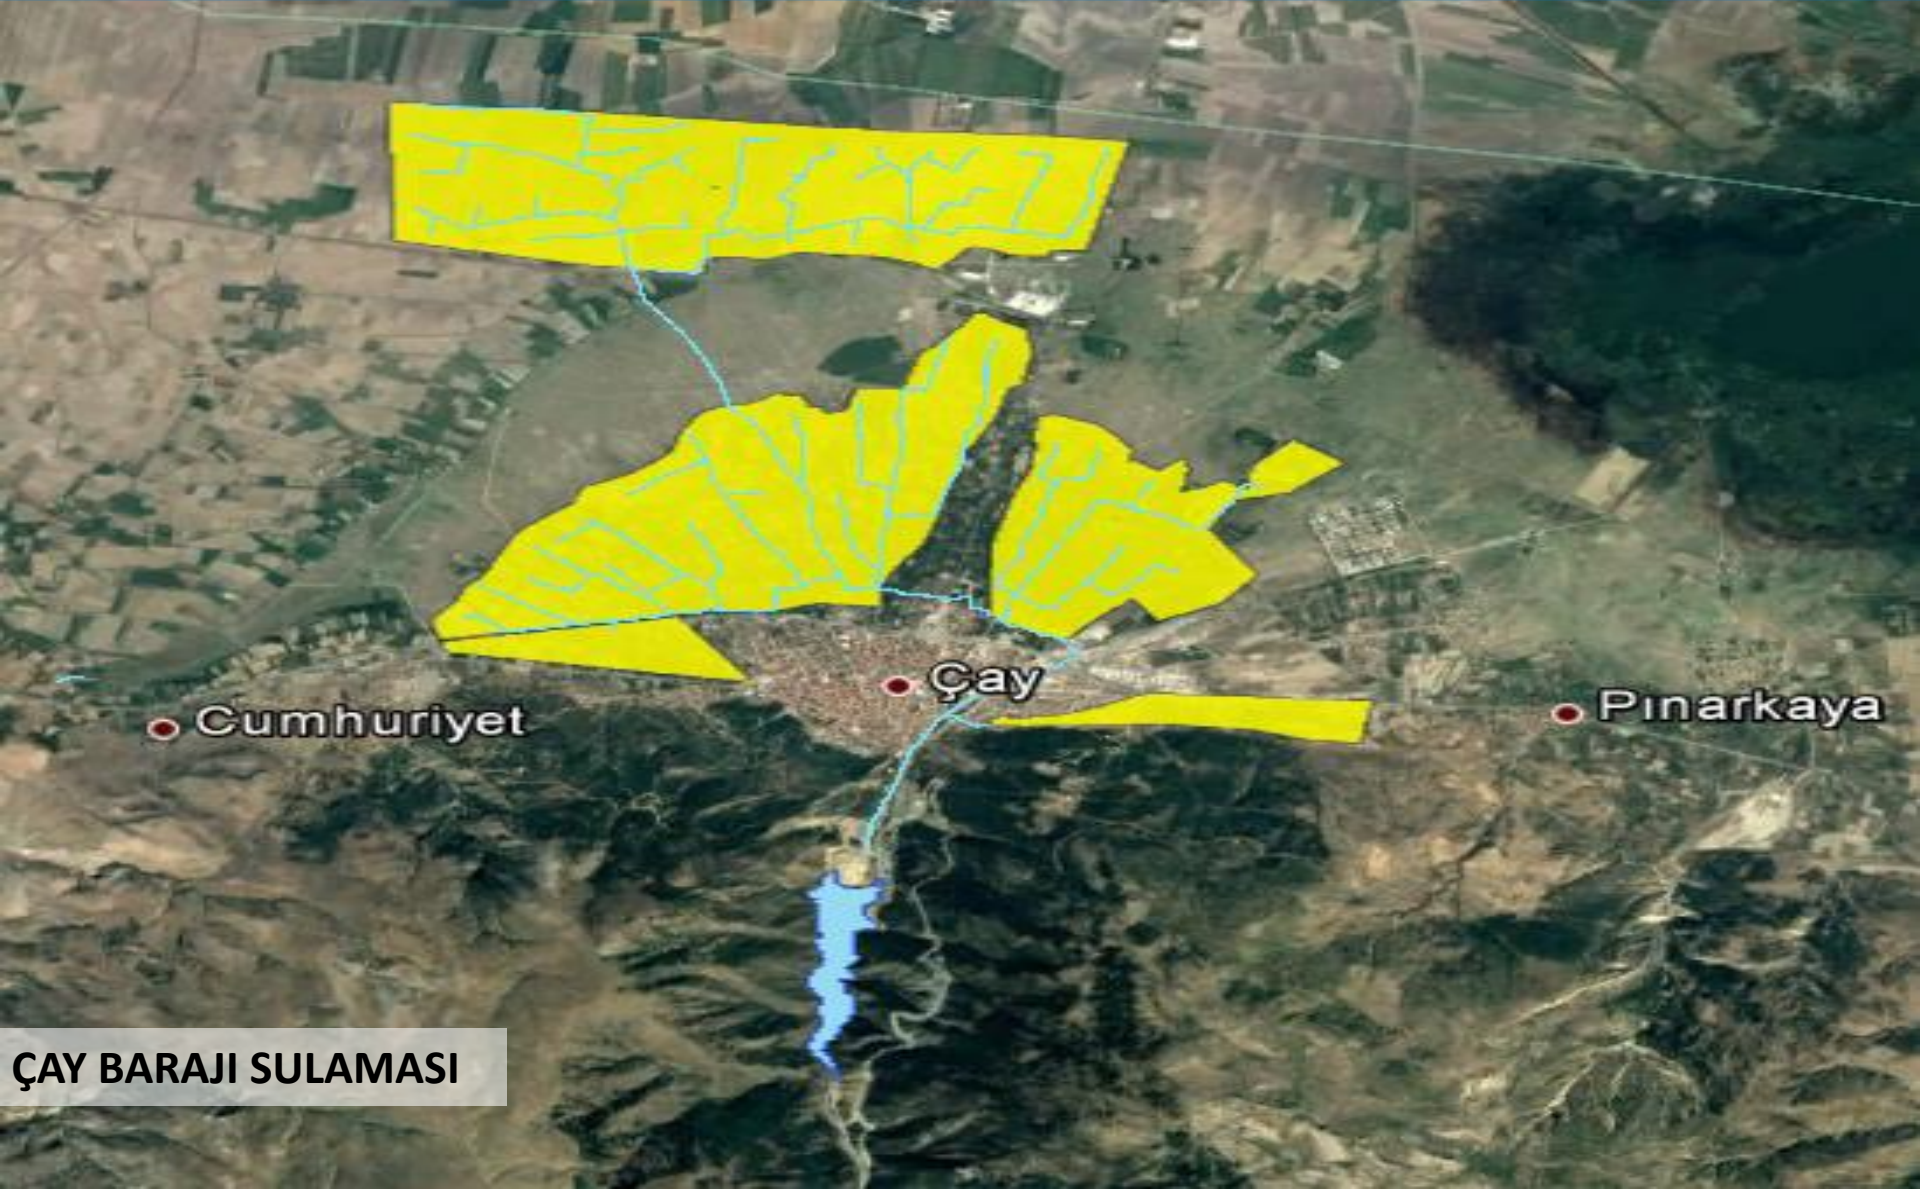

● Cumhuriyet

● Çay

● Pınarkaya

ÇAY BARAJI SULAMASI



ÇAY BARAJI SULAMASI

AFYONKARAHİSAR SANDIKLI YAVAŞLAR PROJESİ



SANDIKLI YAVAŞLAR BARAJI



SANDIKLI YAVAŞLAR BARAJI

AFYONKARAHİSAR SANDIKLI YAVAŞLAR BARAJI


İşin İhale Bedeli	: 32.369.312 TL
İhale Tarihi	: 12.05.2014
İşe Başlama Tarihi	: 22.07.2014
İş Bitim Tarihi	: 25.07.2017
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	: 96
2017 Yılı Ödeneği	: 2 500 000 TL
2017 Yılı Harcaması	: 1.053.406 TL

Açıklamalar : Gövde dolgusu tamamlanmıştır. Sandıklı-Hocalar / Uşak rölokasyon yolu araç trafiğine açılmıştır. Su tutulmuştur.

AFYONKARAHİSAR SANDIKLI YAVAŞLAR BARAJI SULAMASI

İşin İhale Bedeli	: 31.652.847 TL
İhale Tarihi	: 29.01.2016
İşe Başlama Tarihi	: 28.04.2016
İş Bitim Tarihi	: 24.08.2019
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	: 98
2017 Yılı Ödeneği	: 3.700.000 TL
2017 Yılı Harcaması	: 2.382.082 TL

Açıklamalar : Hat birleştirme imalatları devam etmektedir. Su tutulması akabinde işletmeye açılacak olup, yüklenici tarafından 3 yıl işletilecektir.

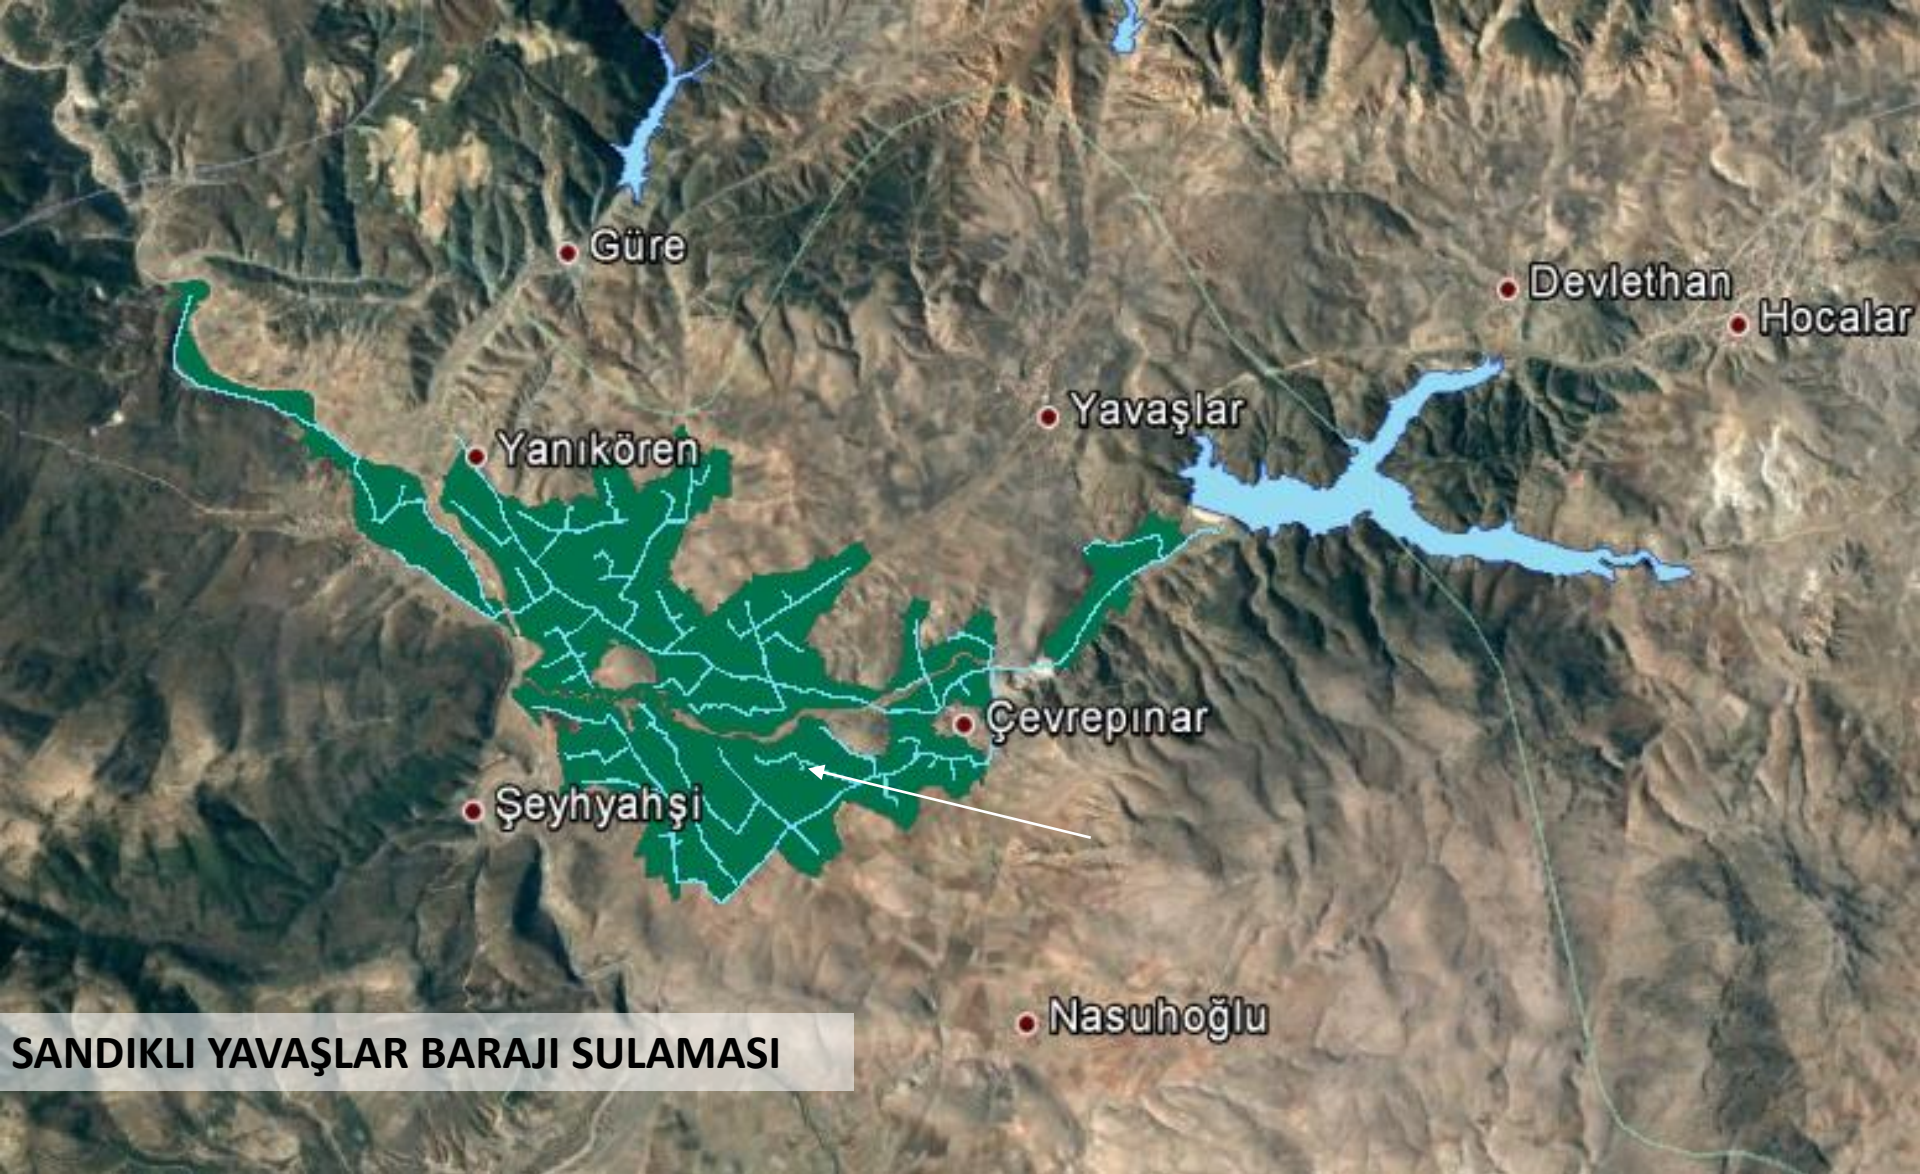

SANDIKLI YAVAŞLAR BARAJI SULAMASI

AFYONKARAHİSAR İÇMESUYU PROJESİ

Afyonkarahisar - Akarçay Havzası Kuzey Atıksu Toplama Hattı

İşin Keşif Bedeli	: 60.000.000 TL
İhale Tarihi	: 04.07.2017
İşe Başlama Tarihi	: ---
İş Bitim Tarihi	: ---
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	: 0
2017 Yılı Ödeneği	: 1.000 TL
2017 Yılı Harcaması	: 0

Açıklamalar : İş kapsamında; Fethibey, Çayırbağ, Çıkırık, Beyyazı, Susuz Beldeleri ile Erenler Köyü, Kocatepe Üniversitesi ve Organize Sanayi Bölgesi'nin toplam 5000 m³/gün atık su arıtımı sağlanacaktır. 04.07.2017 tarihinde Dsi Genel Müdürlüğü'nce ihale edilmiştir.



AFYONKARAHİSAR İÇMESUYU PROJESİ 2. MERHALE

SANDIKLI İLÇESİ İÇMESUYU TESİSLERİ

İşin İhale Bedeli	: 16.003.372 TL
İhale Tarihi	: 03.02.2017
İşe Başlama Tarihi	: 30.03.2017
İş Bitim Tarihi	: 05.05.2018
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	: 2
2017 Yılı Ödeneği	: 1.400.000 TL
2017 Yılı Harcaması	: 0

Açıklamalar : Göletlerden temin edilecek yıllık 3,71 hm³ su ile Sandıklı İlçesi ve Selçik, Dutağaç, Akin, Bekdeş, Kargın Köylerinin 2050 yılı içme suyu ihtiyaçları karşılanacaktır.

4000 ve 1500 m³ lük depo temel kazı imalatı tamamlandı, temel donatı imatları devam etmektedir. DN400 düktül demir boru imalatı devam etmektedir.

SANDIKLI İLÇESİ İÇME SUYU TESİSLERİ



HOCALAR İLÇESİ İÇMESUYU TESİSLERİ

İşin İhale Bedeli	: 2.229.020 TL
İhale Tarihi	: 03.02.2017
İşe Başlama Tarihi	: 27.03.2017
İş Bitim Tarihi	: 02.12.2017
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	: 4
2017 Yılı Ödeneği	: 350.000 TL
2017 Yılı Harcaması	: 84.149 TL

Açıklamalar : Kuyulardan temin edilecek yıllık 0,40 hm³ su ile Hocalar İlçesi ve Devlethan ve Kozluca Köylerinin 2050 yılı içme suyu ihtiyaçları karşılanacaktır. Toplama odalı terfi istasyonu beton imalatları ve Kuyu tipi terfi istasyonu temel betonarme imalatları tamamlanmış olup imalatlar devam etmektedir.



LEJANT

 Planlanan Depo

 Planlanan İsale (Terfi) Hattı


HOCALAR İLÇESİ İÇME SUYU TESİSLERİ

İHSANIYE DÖĞER BELDESİ İÇMESUYU TESİSLERİ

İşin İhale Bedeli	: 3.450.000TL
İhale Tarihi	: 07.02.2017
İşe Başlama Tarihi	: 09.03.2017
İş Bitim Tarihi	: 14.11.2017
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	: 30
2017 Yılı Ödeneği	: 3.450.000 TL
2017 Yılı Harcaması	: 1.050.506 TL

Açıklamalar : Sondaj kaynaklarından temin edilecek yıllık 0,67 milyon m³ su ile Döğer Kasabasının 2050 yılı içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır.

Su deposu temel imalatları, 1000 m³ Depo ve manevra odası betonarme imalatları ile 3,6 Km HDPE boru montajı tamamlandı. Arıtma tesisi uygulama projeleri çalışmaları devam etmektedir.

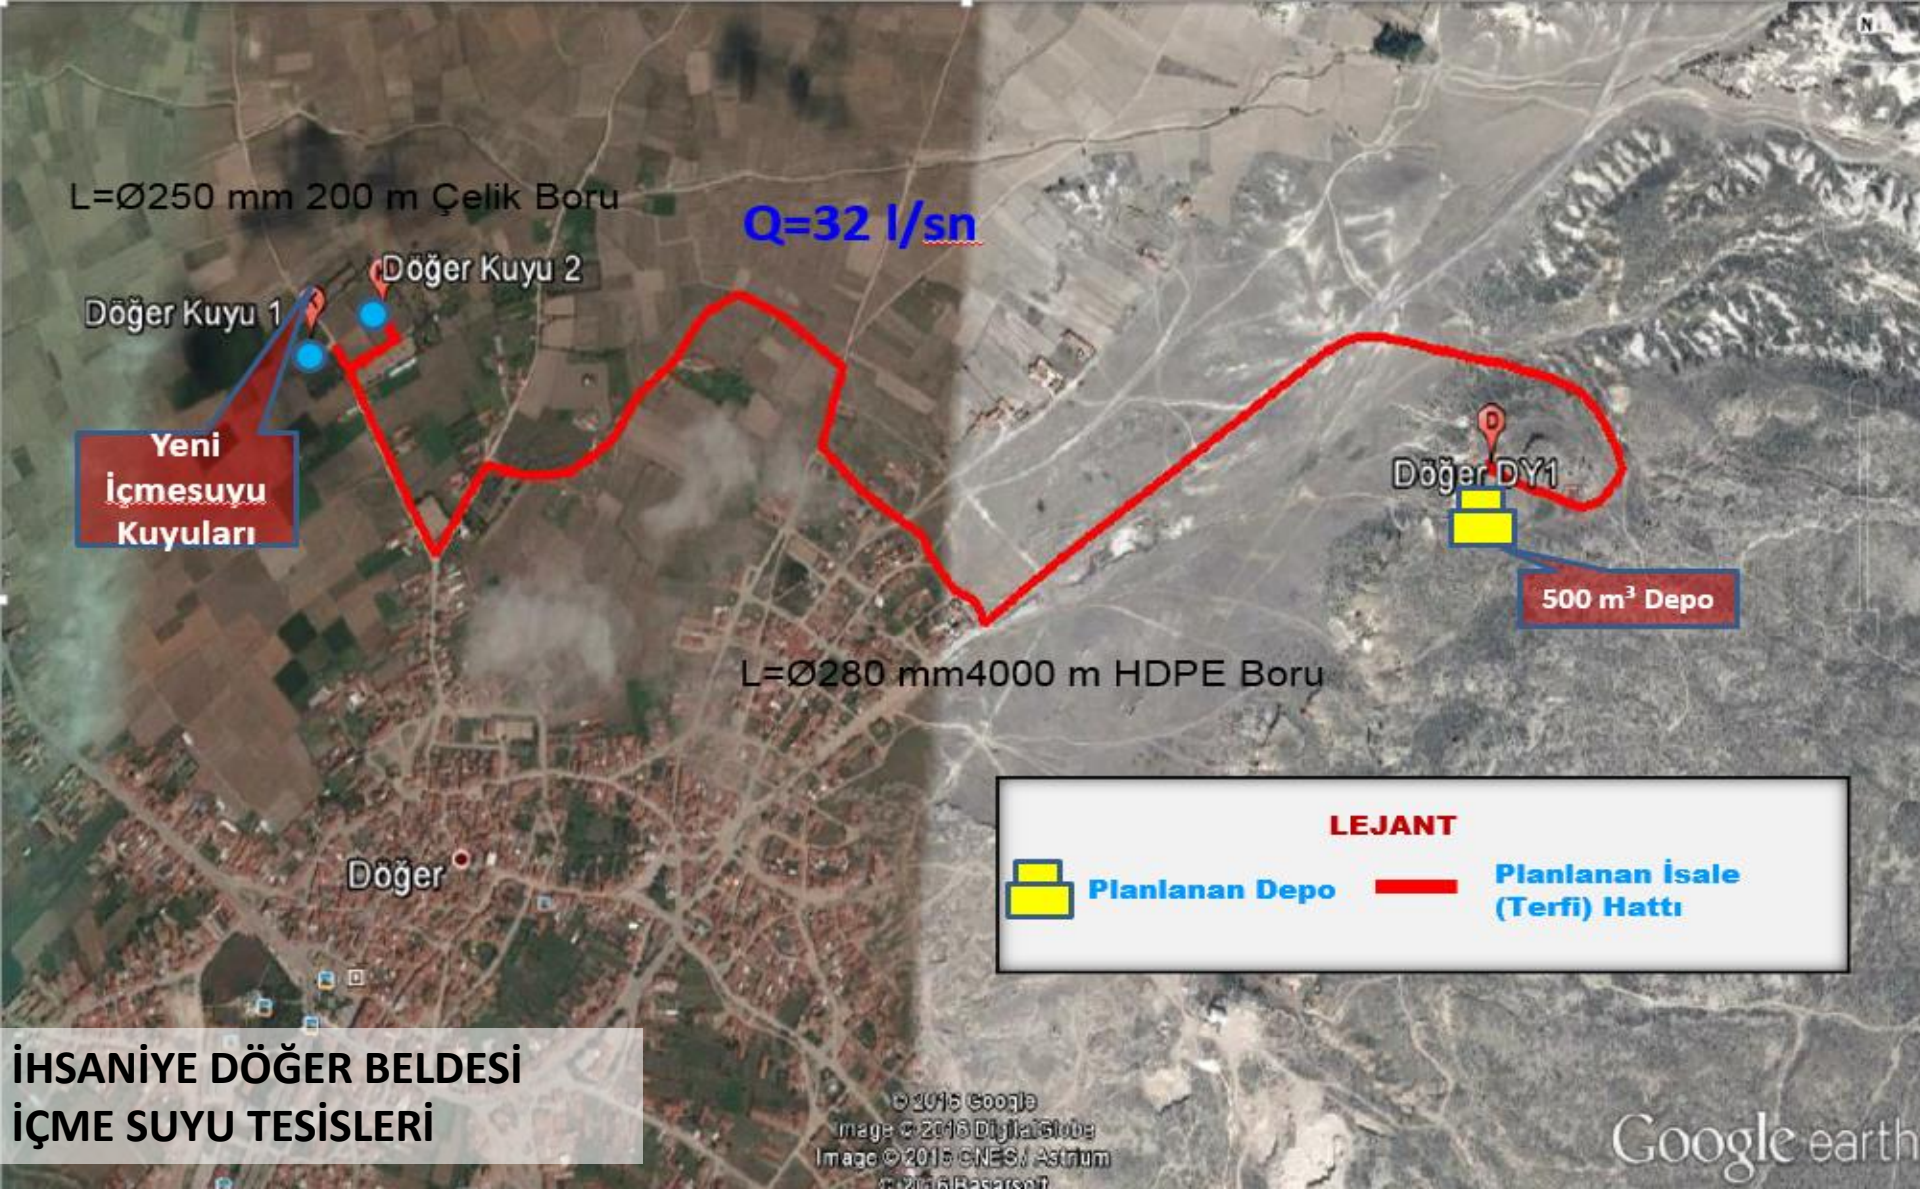

İHSANIYE DÖĞER BELDESİ İÇME SUYU TESİSLERİ

İHSANİYE DÖĞER BELDESİ İÇME SUYU TESİSLERİ



AFYONKARAHİSAR İÇMESUYU PROJESİ 2. MERHALE KAPSAMINDA İHALE EDİLECEK İÇMESUYU TESİSLERİ

	İŞİN ADI	KEŞFİ (TL)	İHALE TARİHİ
1	DİNAR TATARLI BELDESİ İÇMESUYU TESİSLERİ	2 500 000	14.07.2017
2	DİNAR HAYDARLI BELDESİ İÇMESUYU TESİSLERİ	4 500 000	17.07.2017
3	EMİRDAĞ GÖMÜ BELDESİ İÇMESUYU TESİSLERİ	4 000 000	Ağustos 2017
4	SULTANDAĞI YEŞİLÇİFTLİK BELDESİ İÇMESUYU TESİSLERİ	2 500 000	07.07.2017
5	SİNANPAŞA TAŞOLUK BELDESİ İÇMESUYU TESİSLERİ	4 000 000	09.06.2017

AFYONKARAHİSAR ÇAY VE BOLVADİN İÇMESUYU PROJESİ

ÇAY VE BOLVADİN İÇMESUYU İSALE HATTI

İşin İhale Bedeli	: 23.021.867 TL
İhale Tarihi	: 26.03.2015
İşe Başlama Tarihi	: 06.10.2015
İş Bitim Tarihi	: 04.10.2017
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	: 92
2017 Yılı Ödeneği	: 5.466.765 TL
2017 Yılı Harcaması	: 3.746.356 TL

Açıklamalar : Toplam 41,08 km muhtelif çaplardaki düktil borunun 39,3 km'si, 51 adet sanat yapısının tamamı, 2 adet içme suyu deposu ve 2 adet pompa istasyonu kaba imalatları tamamlandı, ince işçilik işleri devam etmekte. Mekanik ve elektrik aksam montajı ve DN200 hat montajı devam etmektedir.



**ÇAY VE BOLVADİN İÇME SUYU
İSALE HATTI**



**ÇAY VE BOLVADİN İÇME SUYU
İSALE HATTI**

ÇAY VE BOLVADİN İÇMESUYU ARITMA TESİSİ

İşin İhale Bedeli	: 31.591.974 TL
İhale Tarihi	: 28.10.2016
İşe Başlama Tarihi	: 22.12.2016
İş Bitim Tarihi	: 22.12.2017
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	: 24
2017 Yılı Ödeneği	: 21.624.321 TL
2017 Yılı Harcaması	: 8.220.507 TL

Açıklamalar : Belt filtre yapısının temel betonarme ve perde beton donatı imatları, filtre geri yıkama suyu kazanım tankı yapısının perde beton donatı ve kalıp imatları ile 5000 m³ içme suyu deposu temel betonarme imatları devam etmektedir. İstinat duvarında 20 m, 400 m DN500/DN700 Düktil boru imalatı tamamlanmış olup devam etmektedir. Diğer yapıların genel tesviye ve temel kazıları devam etmektedir. Hızlı kum filtresi temel imatlarına başlanmıştır



**ÇAY VE BOLVADİN İÇME SUYU
ARITMA TESİSİ**

B- KÜÇÜK SU İŞLERİ

2017 Yılı Yatırım Programında;

36 adet Gölet ve Sulaması,

14 adet Gölet Sulaması

5 adet Yerüstü Sulaması,

19 adet Yer Altı Sulaması,

32 adet Taşkın Koruma,

8 adet Taşkın Rusubat Kontrol **olmak üzere**

Toplam **114** adet “Küçük Su İşleri Yapım İşİ” yer almaktadır.

GÖLET VE SULAMALARI (35 Adet)

İşin Adı	:	SANDIKLI KIZIK GÖLETİ ve SULAMASI
İşin İhale Tarihi	:	16.07.2012
İşin İhale Bedeli	:	25.628.683 TL
İşe Başlama Tarihi	:	30.10.2012
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	96
2017 Yılı Ödeneği	:	1.019.293 TL
2017 Yılı Harcaması	:	0

Açıklamalar : Gövde ve kapama seddesinde toplamda yaklaşık 989.000,00 m3 dolgu , ayar vana odası ulaşım yolu , gövde sıyırma kazısı, dolusavak imalatı, kondüvi kazısı ve imalatı, rezervuar kazısı ile membran ve tüvenan imalatları tamamlandı. Rezervuar membran üstü koruyucu örtüde ve rıprapta çalışmalar devam etmektedir.



SANDIKLI KIZIK GÖLETİ VE SULAMASI

İşin Adı	:	BOLVADİN KEMERKAYA GÖLETİ VE SULAMASI
İşin İhale Tarihi	:	13.06.2013
İşin İhale Bedeli	:	17.840.163 TL
İşe Başlama Tarihi	:	12.08.2013
İş Bitim Tarihi	:	21.06.2017
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	100
2017 Yılı Ödeneği	:	1.987.665 TL
2017 Yılı Harcaması	:	1.986.694 TL

Açıklamalar: İş tamamlanmış olup su tutulmuştur.



**BOLVADİN KEMERKAYA
GÖLETİ VE SULAMASI**

İşin Adı	:	<i>SİNANPAŞA ÇOBANÖZÜ TOKUŞLAR GÖLETİ ve SULAMASI</i>
İşin İhale Tarihi	:	20.08.2013
İşin İhale Bedeli	:	8.663.242 TL
İşe Başlama Tarihi	:	21.10.2013
İş Bitim Tarihi	:	20.09.2017
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	93
2017 Yılı Ödeneği	:	3.106.929 TL
2017 Yılı Harcaması	:	3.106.929 TL

Açıklamalar: Gövde riprap imalatları ve rezervuar koruyucu örtü imalatları devam etmektedir.



**SİNANPAŞA ÇOBANÖZÜ
TOKUŞLAR GÖLETİ VE SULAMASI**

İşin Adı	:	ÇAY ARMUTLU GÖLETİ ve SULAMASI
İşin İhale Tarihi	:	30.09.2013
İşin İhale Bedeli	:	8.169.963 TL
İşe Başlama Tarihi	:	18.12.2013
İş Bitim Tarihi	:	07.10.2017
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	90
2017 Yılı Ödeneği	:	979.394 TL
2017 Yılı Harcaması	:	0

Açıklamalar: Gövde tamamlanmıştır. Sulama şebekesinin sit alanında kalması sebebi ile çalışma yapılamamaktadır.

ÇAY ARMUTLU GÖLETİ VE SULAMASI



İşin Adı	:	BAŞMAKÇI ÇIĞRI GÖLETİ ve SULAMASI
İşin İhale Tarihi	:	17.12.2013
İşin İhale Bedeli	:	15.968.200 TL
İşe Başlama Tarihi	:	12.03.2014
İş Bitim Tarihi	:	05.11.2017
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	32
2017 Yılı Ödeneği	:	1.000.000 TL
2017 Yılı Harcaması	:	0

Açıklamalar: Gövde ve kret ulaşım yolu ile ayar vana odası ulaşım yolu, gövde sıyırma kazısı, dolusavak ve dipsavak imalatları ile Cutoff ve memba batardosu kazısında yaklaşık 15.000 m3 kazı tamamlanmıştır. Filtre/Kırmataş üretimi ile Kazı ve üretim imalatları devam etmektedir.



BAŞMAKÇI ÇIĞRI GÖLETİ VE SULAMASI

İşin Adı	:	SANDIKLI MENTEŞ GÖLETİ ve SULAMASI
İşin İhale Tarihi	:	06.02.2014
İşin İhale Bedeli	:	18.460.204 TL
İşe Başlama Tarihi	:	16.06.2014
İş Bitim Tarihi	:	24.10.2017
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	65
2017 Yılı Ödeneği	:	1.380.881 TL
2017 Yılı Harcaması	:	1.380.881 TL

Açıklamalar: Rölokasyon yolu, gövde sıyırma kazıları, Rezervuar sıyırma kazısı, derivasyon dipsavak kondüvisi beton imalatı ve ocak ulaşım yolları tamamlandı. Çalışmalar ve proje revizyon çalışmaları devam etmektedir.



**SANDIKLI MENTEŞ GÖLETİ VE
SULAMASI**

İşin Adı	:	<i>SULTANDAĞI DOĞANCIK GÖLETİ ve SULAMASI</i>
İşin İhale Tarihi	:	23.12.2014
İşin İhale Bedeli	:	14.375.767 TL
İşe Başlama Tarihi	:	06.02.2015
İş Bitim Tarihi	:	10.07.2017
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	<i>100</i>
2017 Yılı Ödeneği	:	3.700.000 TL
2017 Yılı Harcaması	:	<i>3.558.409 TL</i>

Açıklamalar: İş tamamlanmıştır.



**SULTANDAĞI DOĞANCIK
GÖLETİ VE SULAMASI**

İşin Adı	:	ŞUHUT KOÇYATAĞI GÖLETİ VE SULAMASI
İşin İhale Tarihi	:	11.11.2016
İşin İhale Bedeli	:	47.960.569 TL
İşe Başlama Tarihi	:	02.03.2017
İş Bitim Tarihi	:	11.05.2019
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	
2017 Yılı Ödeneği	:	1.000.000 TL
2017 Yılı Harcaması	:	0

Açıklamalar: 08.05.2017 tarihi itibar ile fiilen çalışmalara başlanmıştır. Gölet ulaşım ve yayla yolu çalışmaları % 70 mertebesinde ve şantiye kurulumu çalışmaları devam etmektedir.



ŞUHUT KOÇYATAĞI GÖLETİ

İşin Adı	:	SANDIKLI YUNUSEMRE GÖLETİ VE SULAMASI
İşin İhale Tarihi	:	07.07.2015
İşin İhale Bedeli	:	12.783.529 TL
İşe Başlama Tarihi	:	21.10.2015
İş Bitim Tarihi	:	09.04.2018
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	49
2017 Yılı Ödeneği	:	1.044.244 TL
2017 Yılı Harcaması	:	737.642 TL

Açıklamalar: 164.522 m³ dolgu tamamlandı. Dolu savak imalatı tamamlandı. Su alma yapısı tamamlandı. Vana odası kazı çalışmaları tamamlandı. Gövde revize projesi onaylandı. Gövde kaya dolgusu 62.000 m³ tamamlanmış olup devam etmektedir.



**SANDIKLI YUNUSEMRE GÖLETİ
VE SULAMASI**

İşin Adı	: AFYONKARAHİSAR GÖLETLERİ İKMALİ
İşin İhale Tarihi	: 27.01.2015
İşin İhale Bedeli	: 5.415.292 TL
İşe Başlama Tarihi	: 26.03.2015
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	: 84
2017 Yılı Ödeneği	: 750 000 TL
2017 Yılı Harcaması	: 0

Açıklamalar: Yıprak göleti regülatörü tamamlandı. Bekdeş göleti içmesuyu deplasesi tamamlandı. Pazarağaç göleti ikmal, Kızık göleti regülatörü ve boyalı göletinde % 98 fiziki gerçekleşme sağlandı. Ekinhisar göletinin malzeme ocaklarından malzeme getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca Kızık Depolama sahasının eksik kalan kaya kaplamaları bu iş kapsamında yapılacaktır.

İşin Adı	:	ÇAY KARAMIK GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ
İşin İhale Tarihi	:	10.06.2014
İşin İhale Bedeli	:	8.888.737 TL
İşe Başlama Tarihi	:	26.09.2014
İş Bitim Tarihi	:	26.04.2017
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	98
2017 Yılı Ödeneği	:	656.863 TL
2017 Yılı Harcaması	:	0

Açıklamalar: Gövde dolgusu ve sulama hattı tamamlandı. Yüklenici firma tarafından gövdedeki su kaçağı sebebiyle enjeksiyon çalışmaları devam etmektedir.



ÇAY KARAMIK GÖLETİ SULAMASI

İşin Adı	:	AFYONKARAHİSAR GÖLETLERİ İKMALİ 2. KISIM
İşin İhale Tarihi	:	14.07.2015
İşin İhale Bedeli	:	16.283.186 TL
İşe Başlama Tarihi	:	16.09.2015
İş Bitim Tarihi	:	13.01.2018
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	77
2017 Yılı Ödeneği	:	2.400.000 TL
2017 Yılı Harcaması	:	2.338.518 TL

Açıklamalar: Çağlayan Göleti gövdesi, çevirme yapısı ve iletim hattı boru kaynak çalışmaları tamamlandı. Kızılca İçme Suyu tamamlandı. Çayüstü Göleti gövde dolgusu tamamlandı, blanket riprap imalatları tamamlanmak üzere. Değirmenayvalı Göletinde kil ocağı ulaşım yolu tamamlandı ve ocak oluru alındı. Şantiyeye elek tesisi kurularak filtre malzemesi hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Memba batardosu dolgu imalatları tamamlandı. Gövde altı sıyırma kazı imalatları devam etmektedir.



DİNAR ÇAĞLAYAN GÖLETİ



DİNAR ÇAYÜSTÜ GÖLETİ



MERKEZ DEĞİRMENAYVALI GÖLETİ

İşin Adı	:	HOCALAR ULUKÖY GÖLETİ VE SULAMASI
İşin İhale Tarihi	:	25.05.2016
İşin İhale Bedeli	:	11.739.954 TL
İşe Başlama Tarihi	:	05.08.2016
İş Bitim Tarihi	:	26.08.2018
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	13
2017 Yılı Ödeneği	:	1.630.623 TL
2017 Yılı Harcaması	:	1.630.623 TL

Açıklamalar: 05.08.2016 Tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Orman izinleri, ocak ruhsatları, ÇED raporu alınmış olup GSM izinleri çalışmaları devam etmektedir. İzinlerin akabinde malzeme üretimine başlanacaktır.



HOCALAR ULUKÖY GÖLETİ

İşin Adı	:	ŞUHUT BAŞÖREN, TEKKE KAVAKLI, GÖLETİ VE SULAMASI
İşin İhale Tarihi	:	03.02.2016
İşin İhale Bedeli	:	11.108.721 TL
İşe Başlama Tarihi	:	10.06.2016
İş Bitim Tarihi	:	11.05.2018
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	31
2017 Yılı Ödeneği	:	1.595.056 TL
2017 Yılı Harcaması	:	1.595.056 TL

Açıklamalar: Zemin yapısından ve gövde yükseltilmesinden dolayı proje revizyonları yapılıyor. Kaya ocağı değişikliği ruhsatı alındı. Sıyırma kazısında %80 tamamlanmıştır, Dip savak kazı imalatı tamamladı, cebri boru imalatlarına başlandı. **Sağ sahil sıyırma kazısı esnasında heyelan meydana gelmiştir.** Çalışmalar devam etmektedir.

ŞUHUT BAŞÖREN TEKKE KAVAKLI GÖLETİ



İşin Adı	: AKDEĞİRMEN GÖLETİ DÜZAĞAÇ KASABASI BAĞLANTI YOLU RÖLOKASYONU
İşin İhale Tarihi	: 18.12.2015
İşin İhale Bedeli	: 7.183.585 TL
İşe Başlama Tarihi	: 24.02.2016
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	: 94
2017 Yılı Ödeneği	: 1.763.106 TL
2017 Yılı Harcaması	: 1.748.138TL

Açıklamalar: Köprü betonarme ve prekast imatları tamamlanmıştır.

AKDEĞİRMEN GÖLETİ DÜZAĞAÇ KASABASI BAĞLANTI YOLU RÖLOKASYONU



İşin Adı	:	SANDIKLI BEKDEŞ GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ
İşin İhale Tarihi	:	04.02.2016
İşin İhale Bedeli	:	12.859.220 TL
İşe Başlama Tarihi	:	25.05.2016
İş Bitim Tarihi	:	25.04.2018
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	100
2017 Yılı Ödeneği	:	2.563.413 TL
2017 Yılı Harcaması	:	2.563.413 TL

Açıklamalar: Gölet tamamlanmış olup, Su tutulmaya başlanmıştır.



**SANDIKLI BEKDEŞ GÖLETİ VE
SULAMASI İKMALİ**

İşin Adı	:	HOCALAR YEŞİLHİSAR GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ
İşin İhale Tarihi	:	09.02.2016
İşin İhale Bedeli	:	4.643.761 TL
İşe Başlama Tarihi	:	05.04.2016
İş Bitim Tarihi	:	09.06.2017
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	79
2017 Yılı Ödeneği	:	1.449.828 TL
2017 Yılı Harcaması	:	441.962 TL

Açıklamalar: Gövde Kil dolgusu tamamlandı. Gövde riprap ve koruyucu örtü çalışmaları devam etmektedir. Vana odası, su alma yapısı imalatları tamamlandı. Enerji kırıcı yapısı imalatları devam etmektedir. Gölet ulaşım yolu iyileştirmesi çalışmaları devam etmektedir.



**HOCALAR YEŞİLHISAR GÖLETİ
VE SULAMASI**

İşin Adı	:	SANDIKLI AKIN GÖLETİ İKMALİ
İşin İhale Tarihi	:	03.02.2016
İşin İhale Bedeli	:	25.584.303 TL
İşe Başlama Tarihi	:	22.04.2016
İş Bitim Tarihi	:	11.05.2018
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	6
2017 Yılı Ödeneği	:	1.409.405 TL
2017 Yılı Harcaması	:	1.197.431 TL

Açıklamalar: 4 km'lik gölet ulaşım yolu kazısı tamamlandı trafiğe açıldı stabilize malzeme serimi devam etmektedir. Mevcut cebri borunun kumlanması ve anti-pas boyama işlemi tamamlanarak beton imalatları tamamlandı. 72 adet büz döşendi. Proje çalışmaları devam ediyor.



SANDIKLI AKIN GÖLETİ İKMALI

İşin Adı	:	DAZKIRI HİSARALAN GÖLETİ
İşin İhale Tarihi	:	03.02.2016
İşin İhale Bedeli	:	10.384.386 TL
İşe Başlama Tarihi	:	05.01.2017
İş Bitim Tarihi	:	17.10.2018
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	
2017 Yılı Ödeneği	:	1.069.070 TL
2017 Yılı Harcaması	:	0

Açıklamalar: Orman izinleri alınmış olup, çalışmalar başlamıştır.

İşin Adı	:	İHSANİYE KAYIHAN GÖLETİ
İşin İhale Tarihi	:	29.09.2016
İşin İhale Bedeli	:	5.089.934TL
İşe Başlama Tarihi	:	03.11.2016
İş Bitim Tarihi	:	17.10.2018
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	47
2017 Yılı Ödeneği	:	2.762.954 TL
2017 Yılı Harcaması	:	2.625.788 TL

Açıklamalar: Cebri boru montajı tamamlanmıştır. Sıyırma ve cutoff kazısı çalışmaları tamamlandı. Proje revizyonu tamamlandı. Çelik cebri boru ile kaynak suyu dipsavak kondüvisine derive edilmiştir. Gölet gövdesi Temel Tipi Piyezometre montajları yapılmıştır.



İHSANIYE KAYIHAN GÖLETİ

İşin Adı	:	SANDIKLI BALLIK GÖLETİ
İşin İhale Tarihi	:	27.09.2016
İşin İhale Bedeli	:	10.565.136 TL
İşe Başlama Tarihi	:	24.11.2016
İş Bitim Tarihi	:	14.12.2018
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	4
2017 Yılı Ödeneği	:	750.000 TL
2017 Yılı Harcaması	:	477.291 TL

Açıklamalar: 65.000 m³ Gövde altı sıyırma kazısı ve dolusavak kazısı tamamlandı, çalışmalar devam etmektedir.



SANDIKLI BALLIK GÖLETİ

İşin Adı	:	SANDIKLI EKİNHİSAR GÖLETİ
İşin İhale Tarihi	:	31.05.2016
İşin İhale Bedeli	:	9.493.320 TL
İşe Başlama Tarihi	:	05.08.2016
İş Bitim Tarihi	:	26.08.2018
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	36
2017 Yılı Ödeneği	:	2.803.843 TL
2017 Yılı Harcaması	:	2.782.420 TL

Açıklamalar: Kapama seddesi kazısı, Gövde Enjeksiyon imalatları ve dikiş enjeksiyon imalatları, Kaya ocağı ulaşım yolu, Dolu savak beton imalatları ile Konkasör kurulumu tamamlanmış, filtre malzeme ve kaya malzeme üretimi ile Gövde dolgusu öncesi hazırlıklar devam etmektedir. Kil ocağı ulaşım yolunun 1150 m si tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.



SANDIKLI EKİNHİSAR GÖLETİ

İşin Adı	:	<i>SİNANPAŞA ELVANPAŞA GÖLETİ</i>
İşin İhale Tarihi	:	20.10.2016
İşin İhale Bedeli	:	7.771.263 TL
İşe Başlama Tarihi	:	05.01.2017
İş Bitim Tarihi	:	17.10.2018
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	
2017 Yılı Ödeneği	:	650 000 TL
2017 Yılı Harcaması	:	

Açıklamalar: Sıyırma ve cutoff kazısı çalışmalarında yaklaşık 50.000 m³ kazı tamamlandı. Gölet rölokasyon yolunda çalışmalar tamamlandı. İmalatlar devam etmektedir.



SİNANPAŞA ELVANPAŞA GÖLETİ

İşin Adı	:	SANDIKLI EŞÖREN GÖLETİ
İşin İhale Tarihi	:	29.12.2016
İşin İhale Bedeli	:	17.046.660 TL
İşe Başlama Tarihi	:	10.04.2017
İş Bitim Tarihi	:	11.03.2019
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	1
2017 Yılı Ödeneği	:	2.000.000 TL
2017 Yılı Harcaması	:	202.970 TL

Açıklamalar: 10.04.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Orman izinleri ve irtifak hakkı çalışmaları tamamlandı. Sol sahil sıyırma kazısı, kondüvi kazıları tamamlandı. Sağ sahil sıyırma kazısı devam etmektedir. (yaklaşık 40.000m3).



SANDIKLI EŞÖREN GÖLETİ

İşin Adı	:	<i>BOLVADİN KEMERKAYA GÖLETİ İLAVE SAHA BORU ALIMI</i>
İşin İhale Tarihi	:	20.09.2016
İşin İhale Bedeli	:	3.000.000 TL
İşe Başlama Tarihi	:	24.08.2016
İş Bitim Tarihi	:	17.01.2017
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	100
2017 Yılı Ödeneği	:	1.800.000 TL
2017 Yılı Harcaması	:	1.736.846 TL

Açıklamalar: Tedarik çalışmaları tamamlanmıştır.

İşin Adı	:	DAZKIRI ÇİFTLİK GÖLETİ
İşin İhale Tarihi	:	20.01.2017
İşin Keşif Bedeli	:	14.375.965 TL
İşe Başlama Tarihi	:	08.06.2017
İş Bitim Tarihi	:	09.05.2019
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	
2017 Yılı Ödeneği	:	1.500.000 TL
2017 Yılı Harcaması	:	0

Açıklamalar: 08.06.2017 tarihinde yer Teslimi yapılmıştır. Orman izni işlemleri devam etmektedir.

İşin Adı	:	<i>HOCALAR GÜRE GÖLETİ</i>
İşin İhale Tarihi	:	15.03.2017
İşin Keşif Bedeli	:	21.409.889 TL
İşe Başlama Tarihi	:	07.07.2017
İş Bitim Tarihi	:	27.07.2019
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	
2017 Yılı Ödeneği	:	3.000.000 TL
2017 Yılı Harcaması	:	0

Açıklamalar: 29.06.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.

İşin Adı	:	SİNANPAŞA KILIÇARSLAN GÖLETİ
İşin İhale Tarihi	:	06.12.2016
İşin İhale Bedeli	:	23.515.950 TL
İşe Başlama Tarihi	:	
İş Bitim Tarihi	:	
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	
2017 Yılı Ödeneği	:	1.000.000 TL
2017 Yılı Harcaması	:	0

Açıklamalar: İhale süreci tamamlanmış olup sözleşme aşamasındadır.(18.07.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanacaktır.)

İşin Adı	:	ŞUHUT ARIZLI GÖLETİ
İşin İhale Tarihi	:	23.02.2017
İşin Keşif Bedeli	:	16.032.660 TL
İşe Başlama Tarihi	:	01.06.2017
İş Bitim Tarihi	:	02.05.2019
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	
2017 Yılı Ödeneği	:	1.500.000 TL
2017 Yılı Harcaması	:	0

Açıklamalar: 01.06.2017 tarihinde yer teslimi yapılmış olup işe başlanmıştır.

İşin Adı	:	ŞUHUT 25 AĞUSTOS ZAFER GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ
İşin İhale Tarihi	:	24.05.2017
İşin Keşif Bedeli	:	4.658.286 TL
İşe Başlama Tarihi	:	16.06.2017
İş Bitim Tarihi	:	19.04.2018
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	
2017 Yılı Ödeneği	:	750.000 TL
2017 Yılı Harcaması	:	0

Açıklamalar: Yer teslimi yapılmış olup işe başlanmıştır.

ŞUHUT 25 AĞUSTOS ZAFER GÖLETİ



İşin Adı	:	ŞUHUT AYDIN GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ
İşin İhale Tarihi	:	22.05.2017
İşin Keşif Bedeli	:	7.742.608 TL
İşe Başlama Tarihi	:	
İş Bitim Tarihi	:	
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	
2017 Yılı Ödeneği	:	1.000.000
2017 Yılı Harcaması	:	0

Açıklamalar: 07.07.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.

ŞUHUT AYDIN GÖLETİ



İşin Adı	:	SANDIKLI AKDAĞ GÖLETİ
İşin İhale Tarihi	:	30.06.2017
İşin Keşif Bedeli	:	15.000.000 TL
İşe Başlama Tarihi	:	
İş Bitim Tarihi	:	
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	
2017 Yılı Ödeneği	:	500 TL
2017 Yılı Harcaması	:	0

Açıklamalar: İhalesi yapılmış olup değerlendirme aşamasındadır.

	İŞİN ADI	KEŞFİ (TL)	Muhtemel İhale tarihi
1	İHSANIYE YEŞİLAYAZ GÖLETİ	25.000.000	Aralık 2017
2	EMİRDAĞ YEDİKAPI GÖLETİ YÜKSELTMESİ VE SULAMASI	7.000.000	Ekim 2017
3	18.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÖLET İNŞAATLARINDA BOZULAN KÖY YOLLARININ ONARIMI	4.914.000	Ödeneğin tamamı İl Özel İdaresi'ne aktarılmıştır.

GÖLET SULAMALARI (14 Adet)

İşin Adı	:	AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR GÖYNÜK SULAMASI
İşin İhale Tarihi	:	21.01.2016
İşin İhale Bedeli	:	279.069 TL
İşe Başlama Tarihi	:	10.03.2016
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	90
2017 Yılı Ödeneği	:	94.258 TL
2017 Yılı Harcaması	:	0

Açıklamalar: Boru döşenmesi imalatları tamamlanmıştır. Sanat yapılarındaki eksiklikler tamamlanmaktadır.

İşin Adı	:	SANDIKLI BEKDEŞ GÖLETİ SULAMASI
İşin İhale Tarihi	:	15.11.2016
İşin İhale Bedeli	:	2.720.182 TL
İşe Başlama Tarihi	:	22.12.2016
İş Bitim Tarihi	:	22.12.2019
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	55
2017 Yılı Ödeneği	:	1.564.583 TL
2017 Yılı Harcaması	:	1.564.583 TL

Açıklamalar:

İşin Adı	:	MERKEZ HALIMORU GÖLETİ SULAMASI
İşin İhale Tarihi	:	30.12.2013
İşin İhale Bedeli	:	1.688.330 TL
İşe Başlama Tarihi	:	18.02.2014
İş Bitim Tarihi	:	18.07.2014
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	
2017 Yılı Ödeneği	:	688.330 TL
2017 Yılı Harcaması	:	0

Açıklamalar: Halımoru Göletinin tasfiye edilmesiyle sulama işinin de tasfiye edilmesi düşünülmektedir.

İşin Adı	:	SANDIKLI AKİN GÖLETİ SULAMASI
İşin İhale Tarihi	:	01.03.2017
İşin İhale Bedeli	:	5.348.508 TL
İşe Başlama Tarihi	:	25.05.2017
İş Bitim Tarihi	:	20.01.2020
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	8
2017 Yılı Ödeneği	:	429.810 TL
2017 Yılı Harcaması	:	429.810 TL

Açıklamalar: 25.05.2017 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, işe başlanmıştır. Proje revizyonu çalışmaları yapılmaktadır.

İşin Adı	:	SULTANDAĞI DOĞANCIK GÖLETİ SULAMASI
İşin İhale Tarihi	:	21.12.2015
İşin İhale Bedeli	:	2.633.330 TL
İşe Başlama Tarihi	:	02.03.2016
İş Bitim Tarihi	:	24.02.2017
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	100
2017 Yılı Ödeneği	:	765.889 TL
2017 Yılı Harcaması	:	532.608 TL

Açıklamalar: 18,6 km boru hattı ve 77 Sanat yapısının tamamlanması ile iş tamamlanmıştır.

İşin Adı	:	18. BÖLGE GÖLET SULAMALARI İKMALİ 3. KISIM
İşin İhale Tarihi	:	13.10.2016
İşin İhale Bedeli	:	3.850.000 TL
İşe Başlama Tarihi	:	09.12.2016
İş Bitim Tarihi	:	04.03.2018
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	88
2017 Yılı Ödeneği	:	3.850.000 TL
2017 Yılı Harcaması	:	3.697.539 TL

Açıklamalar: Kestel Sulamasında toplam 12983 m HDPE Boru montajı tamamlandı. S2 hattında 1965 m çelik boru imalatı tamamlandı. Kestel Sulaması ikmali işindeki sanat yapıları tamamlandı, Çayhisar sulamasında imalatlara başlanmıştır. Mahsüllerin hasat edilmesi beklenmektedir.

İşin Adı	:	BAYAT GÖLETİ SULAMASI YENİLEMESİ
İşin İhale Tarihi	:	17.02.2017
İşin İhale Bedeli	:	6.841.581 TL
İşe Başlama Tarihi	:	07.04.2017
İş Bitim Tarihi	:	12.05.2018
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	78
2017 Yılı Ödeneği	:	5.600.000 TL
2017 Yılı Harcaması	:	5.433.586 TL

Açıklamalar: 22.000 m şebeke hattından, 13.600 m HDPE boru montaj imalatı ve vana odası temel betonarme imatları tamamlanmış olup mekanik aksam montajı devam etmektedir

İşin Adı	:	DİNAR YEŞİLÇAT GÖLETİ SULAMASI
İşin İhale Tarihi	:	29.11.2016
İşin İhale Bedeli	:	4.530.972 TL
İşe Başlama Tarihi	:	16.12.2016
İş Bitim Tarihi	:	30.04.2018
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	91
2017 Yılı Ödeneği	:	3.530.972 TL
2017 Yılı Harcaması	:	2.406.705 TL

Açıklamalar: 6000 m HDPE boru montajı ile şebeke tamamlandı. 34 adet sanat yapısının betonarme imalatları tamamlandı. Mekanik aksam montajı tamamlandı. Ana dere ve yan derede kuyruk suyu kazı çalışmaları tamamlandı, kil dolgu imalatlarına geçildi. Ana derede 500m yan derede 100 m kil dolgu imalatı tamamlanmıştır. Ana derede ve yan dere Tersip bendi imalatları tamamlandı. İmalatlar devam etmektedir.

Bu yıl ihale edilecek Gölet ve Sulamaları

	İŞİN ADI	KEŞFİ (TL)	Muhtemel İhale tarihi
1	Şuhut Akyuva Göleti Sulaması İkmali	8.500.000	Ağustos 2017
2	Bayat Asarcık Göleti Sulaması Yenilemesi	20.000.000	Eylül 2017
3	Afyonkarahisar-Bayat Asarcık Göleti Sulaması Yenilemesi Malzeme Temini	20.000.000	Eylül 2017
4	İhsaniye Kayıhan Göleti Sulaması	5.000.000	Aralık 2017
5	Hocalar Uluköy Göleti Sulaması	8.000.000	Aralık 2017
6	Sandıklı Ekinhisar Göleti Sulaması	6.000.000	Aralık 2017

YERÜSTÜ SULAMALARI (5 Adet)

İşin Adı	:	AFYONKARAHİSAR ÇAY DEVEDERESİ SULAMASI
İşin İhale Tarihi	:	29.09.2015
İşin İhale Bedeli	:	5.915.177 TL
İşe Başlama Tarihi	:	16.10.2015
İş Bitim Tarihi	:	08.01.2017
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	100
2017 Yılı Ödeneği	:	926.000 TL
2017 Yılı Harcaması	:	0

Açıklamalar : 15.450 m. HDPE - 100 boru döşendi, 730 m. çelik boru döşendi. 95 Adet sanat yapısı yapıldı. İş tamamlandı.

İşin Adı	:	AFYONKARAHİSAR-MERKEZ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ SULAMASI
İşin İhale Tarihi	:	12.12.2016
İşin İhale Bedeli	:	37.734.044 TL
İşe Başlama Tarihi	:	08.06.2017
İş Bitim Tarihi	:	07.06.2019
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	
2017 Yılı Ödeneği	:	3.500.000 TL
2017 Yılı Harcaması	:	0

Açıklamalar : 08.06.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Şantiye yeri tahsis konusunda Milli Emlak Müdürlüğü incelemeleri beklenmektedir.

İşin Adı	:	AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA YÖRÜKMEZARI REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI
İşin İhale Tarihi	:	26.05.2016
İşin İhale Bedeli	:	947.888 TL
İşe Başlama Tarihi	:	29.06.2016
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	36
2017 Yılı Ödeneği	:	607.919 TL
2017 Yılı Harcaması	:	0

Açıklamalar : İş kapsamında; 4000 metre HDP 100 boru döşemesi işi tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

İşin Adı	:	AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI DEREÇİNE REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI
İşin İhale Tarihi	:	15.12.2016
İşin İhale Bedeli	:	5.098.247 TL
İşe Başlama Tarihi	:	16.03.2017
İş Bitim Tarihi	:	20.04.2018
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	39
2017 Yılı Ödeneği	:	2.200.000 TL
2017 Yılı Harcaması	:	2.116.736 TL

Açıklamalar : 10.457,50 m HDPE - 100 Boru montajı tamamlandı. Tersip bendi imalatı devam etmektedir

İşin Adı	:	AFYONKARAHİSAR DİNAR SAZ ARAZİLERİ YEDEK HATTI
İşin İhale Tarihi	:	
İşin Keşif Bedeli	:	5.000.000 TL
İşe Başlama Tarihi	:	
İş Bitim Tarihi	:	
İşin Fiziki Gerçekleşmesi (%)	:	
2017 Yılı Ödeneği	:	500 TL
2017 Yılı Harcaması	:	0

Açıklamalar : Ağustos ayı içerisinde ihale edilmesi hedeflenmektedir.

YERALTI SULAMALARI (19 Adet)

	PROJENİN ADI	KEŞİF VEYA İHALE BEDELİ	2017 YILI ÖDENEĞİ	Fiziki Gerç. (%)
1	Emirdağ Aşağıpiribeyli YAS Sulama Şebekesi 3.Kısım	900.000	48.000	Ön sözleşme imzalanacak
2	Başmakçı Yaka YAS Sulama Şebekesi 1 ve 2.Kısım	2.000.000	124.000	İhale süreci devam ediyor
3	Dinar Aktoprak YAS Sulama Şebekesi 1.Kısım	700.000	45.000	İhale süreci devam ediyor
4	Dazkırı Bozan YAS Sulama Şebekesi 1.Kısım	680.000	43.000	Ön sözleşme imzalanacak
5	Dinar Çakıcı YAS Sulama Şebekesi 1 ve 2.Kısım	900.000	65.000	Ön sözleşme imzalanacak
6	Sultandağı Doğancık YAS Sulama Şebekesi 1.Kısım	140.000	1.000	İhale süreci devam ediyor
7	Emirdağ Türkmenakören 1 ve 2.Kısım YAS Sulama Şebekesi	2.400.000	151.000	İhale süreci devam ediyor
8	Sinanpaşa Akören YAS Sulama Şebekesi	1.750.000	175.000	İhale süreci devam ediyor
9	Bolvadin Merkez 6.Kısım YAS Sulama Şebekesi	950.000	500	İhale süreci devam ediyor
10	Dazkırı Merkez 1. ve 2. Kısım YAS Sulama Şebekesi	1.850.000	500	İhale süreci devam ediyor

	PROJENİN ADI	KEŞİF VEYA İHALE BEDELİ	2017 YILI ÖDENEĞİ	Fiziki Gerç. (%)
11	Dinar Burunkaya 1.Kısım YAS Sulama Şebekesi	500.000	500	İhale süreci devam ediyor
12	Emirdağ Gümü 2.Kısım YAS Sulama Şebekesi	600.000	500	İhale süreci devam ediyor
13	Merkez Susuz 1.Kısım YAS Sulama Şebekesi	500.000	500	İhale süreci devam ediyor
14	Sinanpaşa Boyalı 1.Kısım YAS Sulama Şebekesi	260.000	500	İhale süreci devam ediyor
15	Sinanpaşa Bulca 2.Kısım YAS Sulama Şebekesi	800.000	500	İhale süreci devam ediyor
16	Sinanpaşa Garipçe 1.Kısım YAS Sulama Şebekesi	960.000	500	İhale süreci devam ediyor
17	Sinanpaşa Kılıçarslan 1. ve 2. Kısım YAS Sulama Şebekesi	1.500.000	500	İhale süreci devam ediyor
18	Sinanpaşa Merkez 4.Kısım YAS Sulama Şebekesi	900.000	500	İhale süreci devam ediyor
19	Şuhut Çobankaya 2.Kısım YAS Sulama Şebekesi	460.000	500	İhale süreci devam ediyor

TAŞKIN KORUMA (31 Adet)

	PROJENİN ADI	KEŞİF VEYA İHALE BEDELİ	2017 YILI ÖDENEĞİ	Fiziki Gerç. (%)
1	Afyonkarahisar Emirdağ Adayazı Kasabası	5.100.000	1.000	İhale edilecek.
2	Afyonkarahisar Şuhut Koçyatağı Köyü	1.476.627	844.223	60
3	Afyonkarahisar Şuhut Balçikhisar Kasabası	4.045.938	750.000	62
4	Afyonkarahisar Köy yolları Dere yatağı geçişleri Köprü Yapımı	12.683.630	1.000.000	67
5	Afyonkarahisar Taşkın Koruma 3. Grup	4.833.208	1.241.000	79
6	Afyonkarahisar Taşkın Koruma 8. Grup	3.598.014	1.088.724	100
7	Afyonkarahisar Merkez Ataköy-Kışlacık Köyleri	4.067.813	650.000	30
8	Afyonkarahisar Hocalar İlçe Merkezi 2.Kısım	3.038.736	500.000	10
9	Afyonkarahisar İhsaniye Yaylabağı 2.Kısım	2.644.998	850.000	27
10	Afyonkarahisar İhsaniye Yukarıtandır Köyü	3.004.338	500.000	İş devam ediyor.

	PROJENİN ADI	KEŞİF VEYA İHALE BEDELİ	2017 YILI ÖDENEĞİ	Fiziki Gerç. (%)
11	Afyonkarahisar-Sandıklı Kızık Kasabası	1.507.901	1.375.000	100
12	Afyonkarahisar-Sinanpaşa Ahmetpaşa	4.700.000	4.700.000	100
13	Afyonkarahisar-Sinanpaşa Yıldırım Kemal Köyü	923.197	60.551	100
14	Afyonkarahisar-Sinanpaşa Serban Kasabası 2.Kısım	1.486.817	451.000	29
15	Afyonkarahisar-Sultandağı İlçe Merkezi 2.Kısım	1.368.947	910.000	64
16	Afyonkarahisar-Emirdağ Güneysaray köyü	4.500.000	1.000	ihale edilecek
17	Afyonkarahisar-Sultandağı Dereçine Kasabası 2. Kısım	2.880.039	1.800.000	59
18	Afyonkarahisar-Sultandağı Çamözü Köyü	4.500.000	1.000	ihale edilecek.
19	Afyonkarahisar-Akarçay ve Yandereleri 2.Kısım	4.441.648	985.867	20
20	Afyonkarahisar-İhsaniye Üçlerkayası 2.Kısım	1.000.000	1.000	ihale edilecek.

	PROJENİN ADI	KEŞİF VEYA İHALE BEDELİ	2017 YILI ÖDENEĞİ	Fiziki Gerç. (%)
21	Afyonkarahisar-Şuhut Mahmutköy	5.134.042	1.525.757	34
22	Afyonkarahisar-Çobanlar İlçe Merkezi	4.500.000	1.000	İhale edilecek.
23	Afyonkarahisar-Bayat İlçe Merkezi	4.500.000	1.000	19.07.2017
24	Afyonkarahisar-İscehisar Seydiler Kasabası	4.500.000	1.000	18.07.2017
25	Afyonkarahisar-Sandıklı Hüdai Kaplıcaları	3.588.787	240.000	100
26	Afyonkarahisar-Sandıklı Baştepe Köyü	1.831.450	889.132	47
27	Afyonkarahisar-Sandıklı İlçe Merkezi 2.Kısım	8.385.125	1.150.000	100
28	Afyonkarahisar-Sinanpaşa Taşoluk Köyü 2.Kısım	3.490.849	450.000	1
29	Afyonkarahisar-Sinanpaşa Tınaztepe Köyü	3.491.145	650.000	18
30	Afyonkarahisar-Sandıklı Ekinhisar Kasabası	4.000.000	1.000	19.07.2017
31	Afyonkarahisar-Emirdağ Çay Kışla Köyü	5.000.000	1.000	İhale edilecek.

BAZI TAŞKIN KORUMA PROJELERİNDEN RESİMLER



SANDIKLI İLÇE MERKEZİ



**ÇAY KILIÇKAYA TAŞKIN
KORUMA TESİSİ**



SANDIKLI HÜDAİ KAPLICALARI



**TINAZTEPE BELDESİ ANA
ULAŞIM KÖPRÜSÜ**

TAŞKIN ve RÜSUBAT KONTROL (8 Adet)

	PROJENİN ADI	KEŞİF VEYA İHALE BEDELİ	2017 YILI ÖDENEĞİ	Fiziki Gerç. (%)
1	Afyonkarahisar-Başmakçı Çığrı Köyü Kocaçay Deresi İkmali	500.000	1.000	İhale edilecek.
2	Afyonkarahisar-Çay Kılıçkaya Köyü	2.187.020	355.111	100
3	Afyonkarahisar-Hocalar Güre Köyü	4.178.058	3.200.000	74
4	Afyonkarahisar-Merkez Demirçevre Sel Kapanı	5.094.060	1.000	İş devam ediyor.
5	Afyonkarahisar Çay Deresinek Deresi 2.Kısım Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	2.000.000	600	İhale edilecek.
6	Afyonkarahisar Çay Eber Deresi 3.Kısım Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	2.500.000	600	İhale edilecek.
7	Afyonkarahisar Sultandağı Doğancık Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı	2.000.000	500	İhale edilecek.
8	Afyonkarahisar Emirdağ Dereköy Köyü	5.671.839	450.762	100

AKARSU VE DERE YATAKLARI ISLAHI (MAKİNELİ ÇALIŞMALAR)

SANDIKLI AKHARIM MAKİNALI ÇALIŞMASI



ŞUHUT BAŞÖREN KÖYÜ MAKİNALI ÇALIŞMASI



ÇAY DERESENEK DERESİ MAKİNALI ÇALIŞMASI

