



TCDD 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Uğur AÇIKGÖZ
Bölge Müdürü V.

TCDD 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-AFYONKARAHİSAR	
AFYONKARAHİSAR İLİ YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU	
1-TOPLANTI DÖNEMİ	: 2024 / III
2-YATIRIMCI KURULUŞUN ADI	: TCDD 7.Bölge Müdürlüğü -AFYONKARAHİSAR
3-TOPLAM PROJE SAYISI	: 22
4-PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI	: Demiryolu-Ulaştırma
5-TOPLAM PROJE TUTARI	: 4.982.285.736 TL
6-ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: 408.727.481 TL
7-YILI ÖDENEĞİ	: 886.496.332 TL
8-DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	: 58.151.493 TL
9-PARASAL GERÇEKLEŞME (%'si)	: 9%
10-FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%'si)	: 37%
11-BİTEN PROJE SAYISI	: 4
12-DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 13
13-İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	: 5


SIRA NO	PROJE	PROJE SAYISI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL)	DÖNEM SONU HARCAMA (TL)
1	Yol Yenilemeleri ve Hemzemin Geçit iyileştirmeleri	12	53.854.060	22.621.461
2	Sinyalizasyon elektrifikasyon Alt Yapı Üst Yapı	3	801.600.000	34.239.396
3	Kamera ve Sayding	2	17.451.880	0
4	Gar, İstasyon ve Diğer Hizmet Binaları ve Tesisleri Bakım ve Onarımı	5	13.590.392	1.290.637
	TOPLAM	22	886.496.332	58.151.493

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKDI GERÇ. (%)	FİZİKİ GERÇL. (%)	AÇIKLAMALAR
1	Afyon-Karakuyu, Alsancak Eğirdir Ve Bozanönü-Isparta Hatlarında Muhtelif Kilometrelerde Yarma Şev Düzenlenmesi İşi (%75'i Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2023-2024	6.745.450	0	3.750.000	757.579	11%	20%	01.11.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.
2	Afyon Karakuyu Hattı Km:32+475-32+688 Arasında Bulunan 6 Nolu Tünelin Ve Alayunt-Balıkesir Hattı Km:211+605-211+845 Arasında Bulunan 25 Nolu Tünelin Rehabilitasyonu Ve Ölçümü İşi (%60'ı Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2022-2024	15.480.623	0	0	0	0%	0%	Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'nden izin beklenmektedir. İzin alınmasının ardından ihalesi yapılacaktır. İhale aşamasındadır.
3	7. Bölge Müdürlüğü Bölgesinde Muhtelif Kesimlerdeki Yarma Ve Tünelin İslahına Yönelik Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi (%26'sı Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2022-2024	780.000,00	0	780.000	0	0%	20%	21.12.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.
4	Basmane-Afyon, Afyon-Karakuyu Ve Afyon-Konya Hatlarında Toplam 21 Adet Yarmada Şev Eğimi Düzenlenmesi İşi (%100'ü Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2023-2024	30.732.868	0	0	0	0%	0%	İlgili Orman Bölge Müdürlüklerine izin başvurusu yapılmıştır. İzinlerin alınmasının ardından ihalesi yapılacaktır. İhale aşamasındadır.
5	Afyon Karakuyu Hattı Üstyapı İyileştirmeleri (%100'ü Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2023-2024	5.666.570	0	5.666.570	5.666.569	100%	100%	30.11.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalar tamamlanmıştır.

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKDİ GERÇ. (%)	FİZİKİ GERÇL. (%)	AÇIKLAMALAR
6	Eskişehir-Konya Hattı Üstyapı İyileştirilmesi (%50'si Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2023-2024	65.591.704	0	27.500.000	2.752.023	4%	15%	06.02.2024 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.
7	Basmane-Afyon Hattı Üstyapı İyileştirilmesi (%100'ü Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2023-2024	6.728.625	0	6.728.625	6.728.625	100%	100%	27.05.2024 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalar tamamlanmıştır.
8	7. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Ray Taşlama Makinesi İle Hat Koruyucu Ve Düzeltici Taşlama Yapılması (%40'ı Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2023-2024	10.866.719	0	0	0	0%	0%	Yatırım Genel Müdürlüğümüz tarafından takip edilmekte olup ihalesine Genel Müdürlüğümüz tarafından çıkılacaktır. İhale aşamasındadır.
9	7. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasındaki Hatların Ölçüm Sistemlerinin Yenilenmesi (%30'u Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2023-2024	46.250.891	0	712.200	0	0%	0%	Yatırım Genel Müdürlüğümüz tarafından takip edilmekte olup ihalesine Genel Müdürlüğümüz tarafından çıkılacaktır. İhale aşamasındadır.
10	7. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında 200 Adet Hemzemin Geçitte Asfalt Kaplama Yapılması (%25'i Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2022-2024	10.013.202	0	2.000.000	0	0%	0%	2024 yılı içinde ihalesi yapıldı, ancak geçerli teklif olmaması nedeniyle iptal edildi. İhalesi yeniden yapılacaktır. İhale aşamasındadır.
11	7. Bölge Müdürlüğü Mekanik Atelye Müdürlüğü Ve Demiryolu Bakım Müdürlükleri Demirbaşına Kayıtlı 80 Adet Vagonun Revizyon İşİ (%100'ü Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2022-2024	18.251.210	11.251.210	5.639.065	5.639.065	93%	100%	13.10.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalar tamamlanmıştır.
12	Mekanik Atelye Müdürlüğü Demirbaşına Kayıtlı Buraj Makinaları İçin 6 Adet Ray Nivosu Ve Mirası Alımı (%100'ü Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2023-2024	1.077.600	0	1.077.600	1.077.600	100%	100%	29.11.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 11.03.2024 tarihinde malzemeler teslim alınmış olup çalışmalar tamamlanmıştır.

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKDİ GERÇ. (%)	FİZİKİ GERÇL. (%)	AÇIKLAMALAR
13	Isparta-Burdur-Karakuyu(Hariç)-Goncalı-Denizli Hat Kesimine Ait Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Tesisi İşİ (%42'si Afyonkarahisar İlindedir.)	Dazkırı Evciler Dinar	2018-2024	362.737.907	80.232.858	75.600.000	25.865.353	29%	86%	Çalışmalar devam etmektedir.
14	Afyon-Karakuyu Yol Boyu sinyalizasyon Sistemleri Yapımı	Afyonkarahisar Sinanpaşa Sandıklı Kızılören Dinar	2023-2025	672.501.791	36.926.299	80.000.000	0	5%	1%	Çalışmalar devam etmektedir.
15	Alayunt-Afyon-Konya Hat Kesiminde Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon Tesisleri, Gar Tevsiyatı, Yol Uzatmaları, Saydingler, Muhtelif Yerlerde Hemzemin Geçitler Yerine Alt Üst Geçitler Yapılması ve Muhtelif Alt Yapı-Üzt Yapım İşİ (%38'si Afyonkarahisar İlindedir.)	Sultandağı Çay-Çobanlar İhsaniye Afyonkarahisar	2021-2025	3.696.586.037	280.317.114	646.000.000	8.374.043	8%	15%	Çalışmalar devam etmektedir.
16	Dinar Gar Sahasına Kameralı Güvenlik Sistemi Kurulması İşİ	Burdur	2024	5.802.550	0	5.802.550	0	0%	0%	Çalışmalar devam etmektedir.
17	Alsancak-Eğirdir Hattı 2 adet Sayding Yapılması İşİ	Gökçebağ-Burdur	2024	11.649.330	0	11.649.330	0	0%	0%	Çalışmalar devam etmektedir.

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKDİ GERÇ. (%)	FİZİKİ GERÇL. (%)	AÇIKLAMALAR
18	Afyonkarahisar Gar Sahası Hizmetevlerinin İyileştirilmesi ve Doğlagaz Dönüşüm İşi	Afyonkarahisar	2024-2024	2.500.000	0	2.500.000	1.290.637	52%	100%	Yer teslimi yapılmıştır.
19	Dinar Gar Şefliği Yükleme Rampasının Yenilenmesi	Afyonkarahisar	2024-2024	8.017.196	0	7.215.476	0	0%	20%	Yer teslimi yapılmıştır.
20	Ekinova İstasyonu Yükleme Rampasının Yenilenmesi	Afyonkarahisar	2024-2024	2.694.907	0	2.425.416	0	0%	40%	Yer teslimi yapılmıştır.
21	Çay İstasyon Sahası Yükleme Rampası Tadilatı	Afyonkarahisar	2024-2024	483.167	0	434.850	0	0%	20%	Yer teslimi yapılmıştır.
22	Karakuyu İstasyon Sahası Yükleme Rampası Tadilatı	Afyonkarahisar	2024-2024	1.127.389	0	1.014.650	0	0%	80%	Yer teslimi yapılmıştır.
TOPLAM				4.982.285.736	408.727.481	886.496.332	58.151.493	9,37%	37,14%	

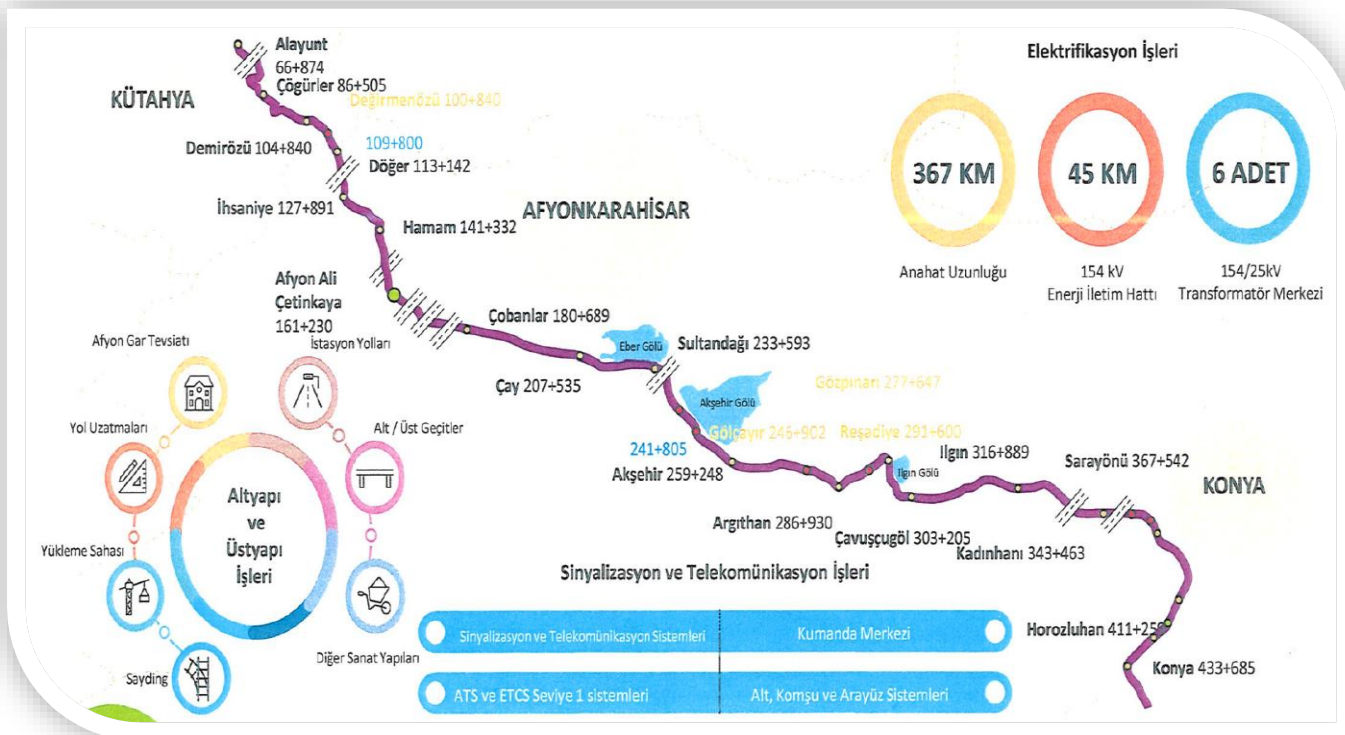

Afyonkarahisar-Konya Hat Kesiminde (Toplam 347 km, 172 km'si Konya il sınırlarında) Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon-Telekomünikasyon Projeleri yapılması işi

Yer Teslim Tarihi:

06/08/2021

Durumu

Çalışmalar devam etmektedir.

**ALAYUNT-AFYON- KONYA HAT KESİMİNDE
ELEKTRİFİKASYON-VE SİNYALİZASYON
TESİSLERİ GAR TEVSİATİ, YOL UZATMALARI,
SAYDİNGLER, MUHTELİF YERLERDE
HEMZEMİN GEÇİTLER YAPILMASI VE
MUHTELİF ALT YAPI- ÜST YAPI YAPIM İŞİ**

Fiziki İlerleme

% 15

Sözleşme Bedeli

1.763.710.369,00 TL

Yer Teslim
Tarihi:

06.08.2021

Durumu

Çalışmalar devam etmektedir.





KAKLIK-KARAKUYU-ISPARTA-BURDUR

Fiziki İlerleme	% 86
Sözleşme Bedeli	69.600.000,00 TL
Yer Teslim Tarihi:	28.05.2018
Durumu	Çalışmalar devam etmektedir.

AFYON-SANDIKLI-KARAKUYU

Sözleşme Bedeli	142.898.227,00 TL
Yer Teslim Tarihi:	24.08.2023
Durumu	İhalesi Yapılarak Sözleşme İmzalanmıştır.

Afyonşehir(Hariç)-Karakuyu(Hariç) Yol Boyu Sinyalizasyon Sistemleri Yapım İşi.

Fiziki İlerleme	%1
Sözleşme Bedeli	142.898.227,00 TL
Yer Teslim Tarihi:	24.08.2023
Durumu	Çalışmalar devam etmektedir.



Dinar Gar Sahasına Kameralı Güvenlik Sistemi Kurulması İşi

5.802.550,00 TL bedel ile sözleşmesi imzalanmıştır.

- 01/08/2024 tarihinde ihalesi yapılmıştır.
- 03/09/2024 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.


Alsancak-Eğirdir Hattı 2 adet Sayding Yapılması İşi

Afyonkarahisar Çapalı için 11.649.329,50 TL bedel ile sözleşmesi imzalanmıştır.

- 14/08/2024 tarihinde ihalesi yapılmıştır.
- 02/09/2024 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

"Afyon-Karakuyu, Alsancak Eğirdir Ve Bozanönü-Isparta Hatlarında Muhtelif Kilometrelerde Yarma Şev Düzenlenmesi İşi"

Fiziki İlerleme	% 20
Mali İlerleme	% 11
Sözleşme Bedeli	6.745.450 TL
Sözleşme Tarihi	23.10.2023
Yer Teslim Tarihi:	01.11.2023
Yüklenici	Yüklenici: Ali Ergin-Hmz Yapı Malzemeleri İnş. Harf. Oto. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı
Durumu	Çalışmalar devam etmektedir.

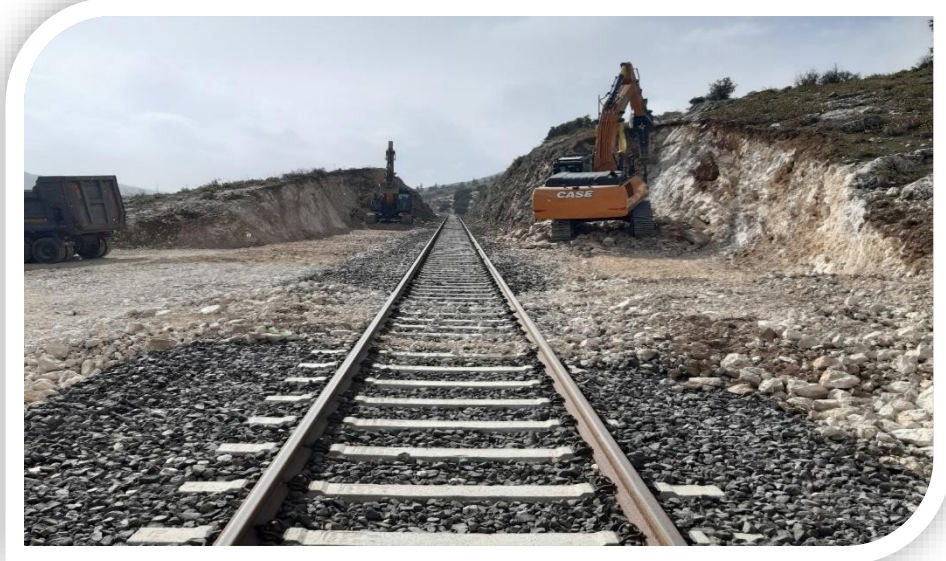

"7. Bölge Müdürlüğü Mekanik Atelye Müdürlüğü Ve Demiryolu Bakım Müdürlükleri Demirbaşına Kayıtlı 80 Adet Vagonun Revizyon İşii".

Fiziki İlerleme	% 100
Mali İlerleme	% 93
Sözleşme Bedeli	9.199.600 TL
Sözleşme Tarihi	05.10.2023
Yer Teslim Tarihi:	13.10.2023
Yüklenici	Acarlar Dokuma San. Ve Tic. A.Ş.
Durumu	Çalışmalar tamamlanmıştır.



Afyonkarahisar Gar Sahası Hizmetevlerinin İyileştirilmesi ve Doğalgaz Dönüşüm İşi

Fiziki İlerleme	% 100
Sözleşme Bedeli	1.467.154,20 TL
Yer Teslim Tarihi:	24.05.2024
Durumu	Geçici Kabulü yapılmıştır.





***Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler Ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik Madde 5 – (1)** de belirtildiği üzere Demiryolu hemzemin geçitlerinde, hemzemin geçit kaplamasının bitiminden sonraki, demiryolu hemzemin geçidini kesen karayoluna ait yaklaşım yolları ile karayolu kullanıcılarına yönelik işaretlerin ve karayoluna ait akıllı ulaşım sistemlerinin yapım, bakım, onarım, işletmeleri ve gerekli **güvenlik tedbirlerinin alınmasından KARAYOLUNUN BAĞLI OLDUĞU kurum veya kuruluş sorumludur.**

Hemzemin Geçitler

Adet

Bekçili Bariyerli Geçit

8

Otomatik Bariyerli Geçit

25

Çapraz İşaretli (Serbest) Geçit

196

Uzaktan İdareli Bariyerli Geçit

2

Toplam Hemzemin Geçit Sayısı

231



Yük Taşımacılığı	Gelen Yük (Ton)	Giden Yük (Ton)	Toplam (Ton)
Afyon Ali Çetinkaya	115.297	403.028	518.325
Balmahmut	651	1.132	1.783
Dinar	2.639	2.726	5.365
Gecek	6.992	11.760	18.752
İhsaniye	70	6.134	6.204
Sandıklı	100	0	100
Sülün	6.340	31.526	37.865
TOPLAM	132.089	456.305	588.394



- ✓ Afyon Gar'da :
 - *2 Adet Mavi Tren (Konya Mavi)
 - *2 Adet Ekspres Tren (Pamukkale Ekspres Treni)
 - *2 Adet Afyon çıkışlı – varışlı Bölgesel Ekspres (Afyon-Eskişehir-Afyon) Olmak üzere
- 6 Trenle hizmet verilmektedir.**



2024 Yılı ilk 9 ayında toplam 46.435 yolcu taşınmıştır.



ARZ EDERİM.

Uğur AÇIKGÖZ
Bölge Müdürü V.
