





TCDD 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ




Uğur AÇIKGÖZ
Bölge Müdürü V.

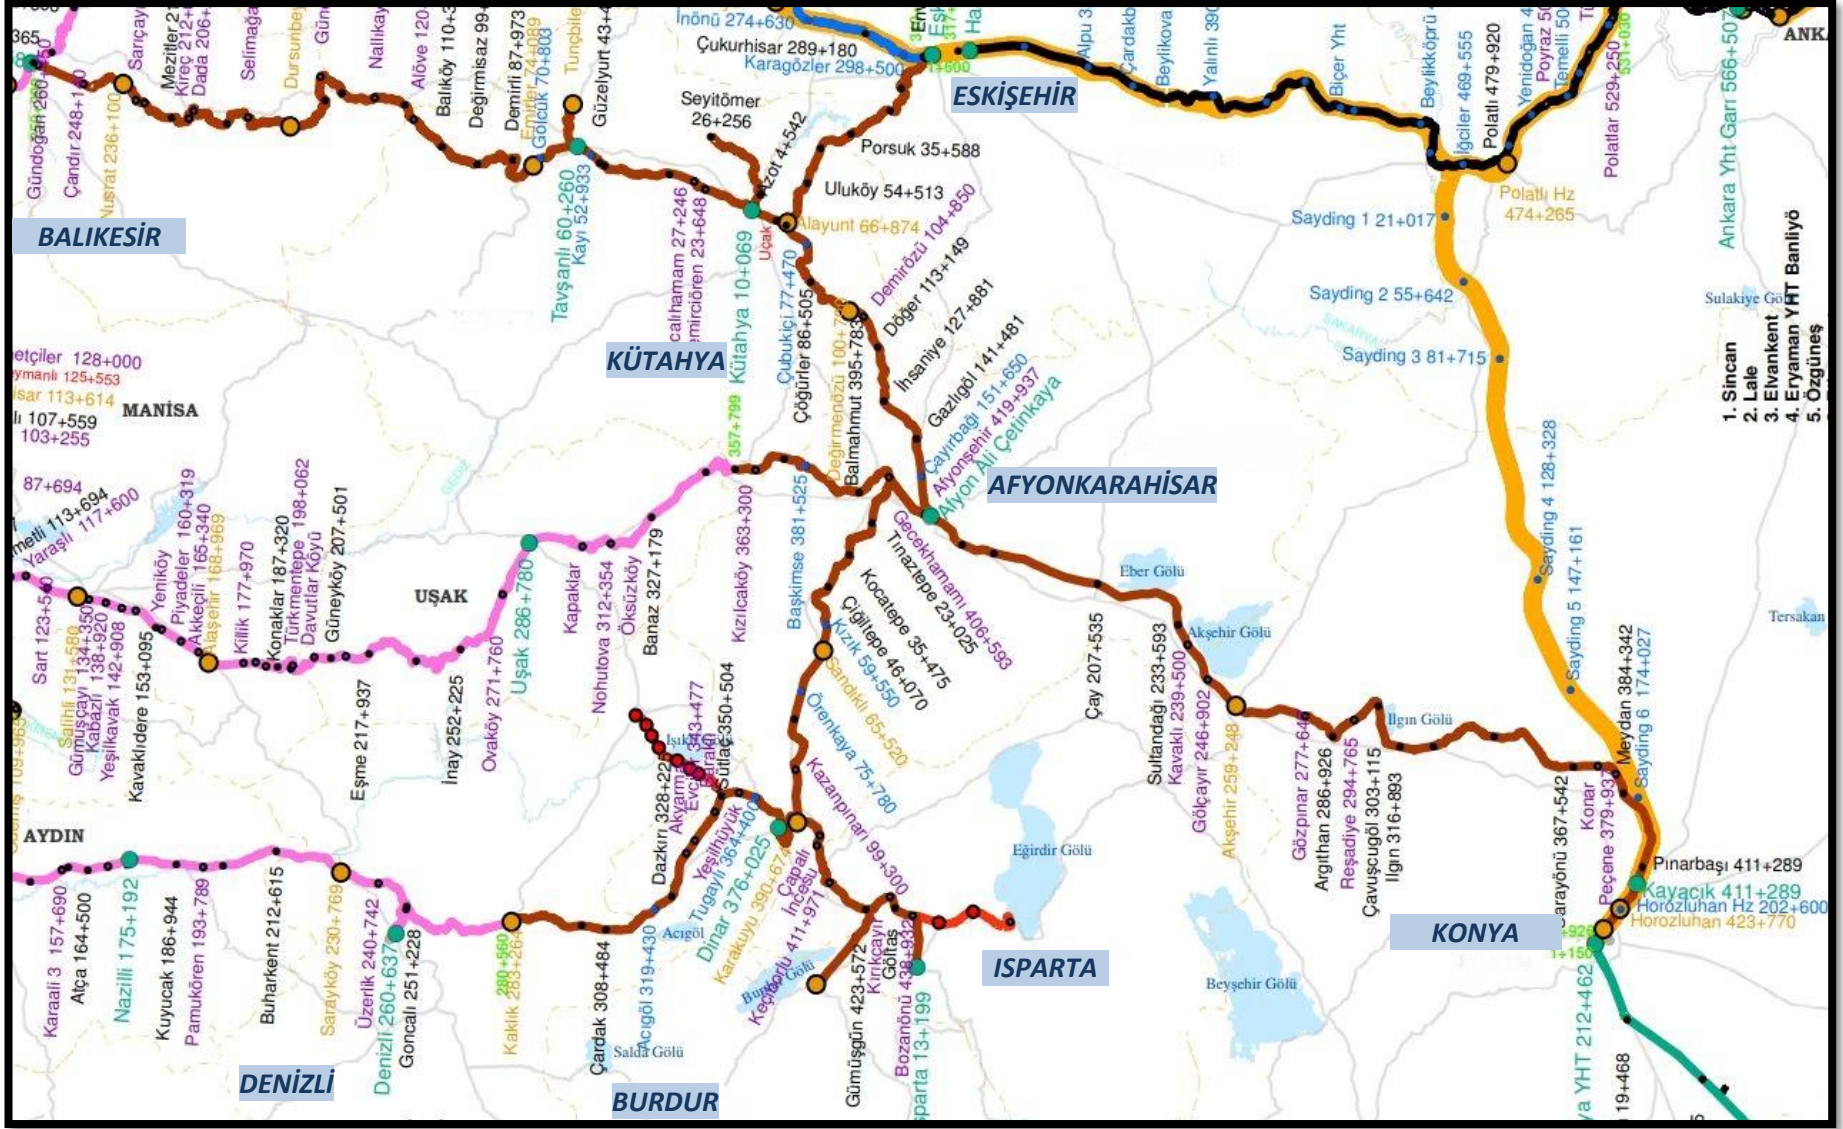

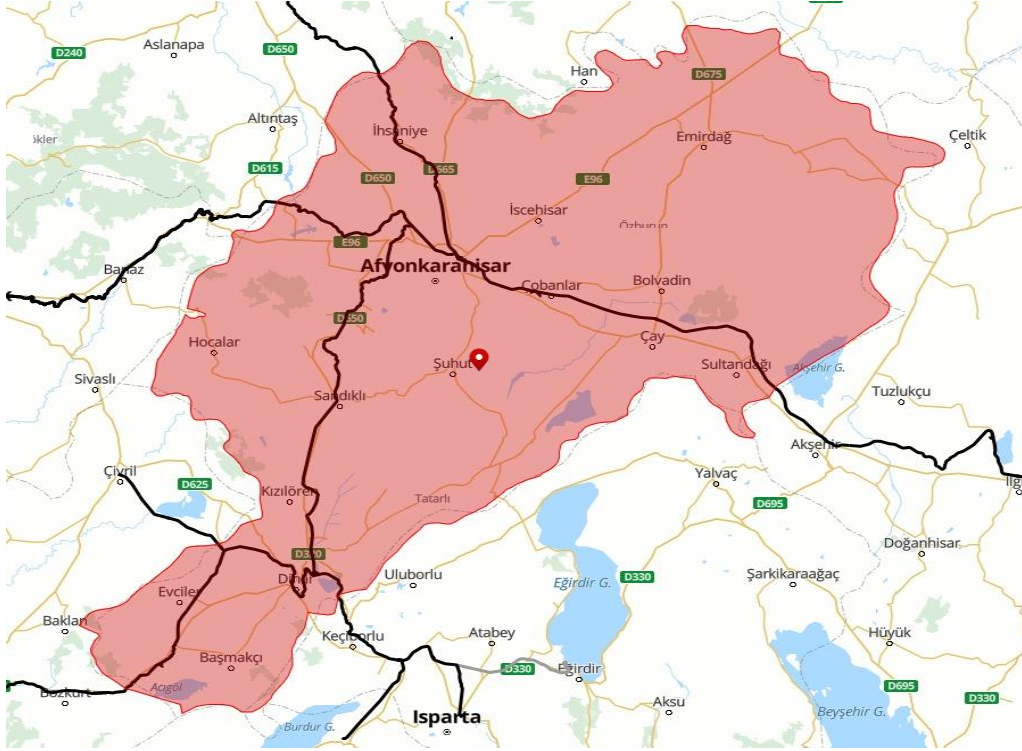

Personel Durumu

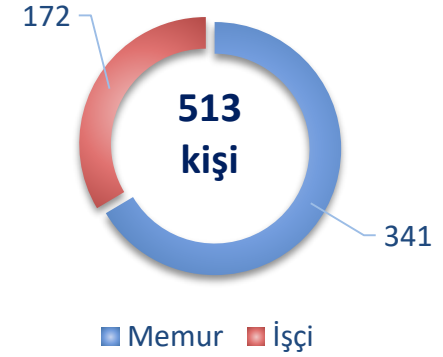

TCDD 7.Bölge Müdürlüğü mintikasında bulunan 1337 km Demiryolu hattının 460 km'si Afyonkarahisar il sınırlarında bulunmaktadır.

Taşra İşyerleri	Adet
Gar Müdürlüğü	2
Gar Şeflikleri	1
İstasyon Şefliği	17
TOPLAM	20

TCDD 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR İLİ YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU

1-TOPLANTI DÖNEMİ	:	2024 / IV
2-YATIRIMCI KURULUŞUN ADI	:	TCDD 7.Bölge Müdürlüğü -AFYONKARAHİSAR
3-TOPLAM PROJE SAYISI	:	23
4-PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI	:	Demiryolu-Ulaştırma
5-TOPLAM PROJE TUTARI	:	4.982.974.996 TL
6-ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	:	408.727.481 TL
7-YILI ÖDENEĞİ	:	271.691.628 TL
8-DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	:	175.369.096 TL
9-PARASAL GERÇEKLEŞME (%'Si)	:	12%
10-FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%'Si)	:	57%
11-BİTEN PROJE SAYISI	:	10
12-DEVAM EDEN PROJE SAYISI	:	8
13-İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	:	5

SIRA NO	PROJE	PROJE SAYISI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL)	DÖNEM SONU HARCAMA (TL)
1	Yol Yenilemeleri ve Hemzemin Geçit İyileştirmeleri	12	53.854.060	31.139.264
2	Sinyalizasyon elektrifikasyon Alt Yapı Üst Yapı	3	189.892.948	121.553.658
3	Kamera ve Saydng	2	18.895.120	17.104.772
4	Gar, İstasyon ve Diğer Hizmet Binaları ve Tesisleri Bakım ve Onarımı	6	9.049.500	5.571.402
	TOPLAM	23	271.691.628	175.369.096

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA ASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKDI GERÇ. (%)	FİZİKİ GERÇL. (%)	AÇIKLAMALAR
1	Afyon-Karakuyu, Alsancak Eğiridir Ve Bozanönü-Isparta Hatlarında Muhtelif Kilometrelerde Yarma Şev Düzenlenmesi İşi (%75'i Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2023-2024	6.745.450	0	3.750.000	1.255.855	19%	25%	01.11.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 05.10.2024 tarihinde sözleşme fesh edilmiştir.
2	Afyon Karakuyu Hattı Km:32+475-32+688 Arasında Bulunan 6 Nolu Tünelin Ve Alayunt-Balıkesir Hattı Km:211+605-211+845 Arasında Bulunan 25 Nolu Tünelin Rehabilitasyonu Ve Ölçümü İşi (%60'ı Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2022-2024	15.480.623	0	0	0	0%	0%	Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'nden izin beklenmektedir. İzin alınmasının ardından ihalesi yapılacaktır. İhale aşamasındadır.
3	7. Bölge Müdürlüğü Bölgesinde Muhtelif Kesimlerdeki Yarma Ve Tünelin İslahına Yönelik Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi (%26'sı Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2022-2024	780.000	0	780.000	0	0%	20%	21.12.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.
4	Basmane-Afyon, Afyon-Karakuyu Ve Afyon-Konya Hatlarında Toplam 21 Adet Yarmada Şev Eğimi Düzenlenmesi İşi (%100'ü Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2023-2024	30.732.868	0	0	0	0%	0%	İlgili Orman Bölge Müdürlüklerine izin başvurusu yapılmıştır. İzinlerin alınmasının ardından ihalesi yapılacaktır. İhale aşamasındadır.
5	Afyon Karakuyu Hattı Üstyapı İyileştirmeleri (%100'ü Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2023-2024	5.666.570	0	5.666.570	3.674.011	65%	100%	30.11.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalar tamamlanmıştır.
6	Eskişehir-Konya Hattı Üstyapı İyileştirilmesi (%50'si Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2023-2024	65.591.704	0	27.500.000	12.689.462	19%	20%	06.02.2024 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.
7	Basmane-Afyon Hattı Üstyapı İyileştirilmesi (%100'ü Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2023-2024	6.728.625	0	6.728.625	6.728.625	100%	100%	27.05.2024 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalar tamamlanmıştır.

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKDİ GERÇ. (%)	FİZİKİ GERÇL. (%)	AÇIKLAMALAR
8	7. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Ray Taşlama Makinesi İle Hat Koruyucu Ve Düzeltici Taşlama Yapılması (%40'ı Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2023-2024	10.866.719	0	0	0	0%	0%	Yatırım Genel Müdürlüğümüz tarafından takip edilmekte olup ihalesine Genel Müdürlüğümüz tarafından çıkılacaktır. İhale aşamasındadır.
9	7. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasındaki Hatların Ölçüm Sistemlerinin Yenilenmesi (%30'u Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2023-2024	46.250.891	0	712.200	0	0%	0%	Yatırım Genel Müdürlüğümüz tarafından takip edilmekte olup ihalesine Genel Müdürlüğümüz tarafından çıkılacaktır. İhale aşamasındadır.
10	7. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında 200 Adet Hemzemin Geçitte Asfalt Kaplama Yapılması (%25'i Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2022-2024	4.463.795	0	2.000.000	1.825.024	41%	45%	01.11.2024 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.
11	7. Bölge Müdürlüğü Mekanik Atelye Müdürlüğü Ve Demiryolu Bakım Müdürlükleri Demirbaşına Kayıtlı 80 Adet Vagonun Revizyon İşi (%100'ü Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2022-2024	16.890.275	11.251.210	5.639.065	3.888.687	90%	100%	13.10.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalar tamamlanmıştır.
12	Mekanik Atelye Müdürlüğü Demirbaşına Kayıtlı Buraj Makinaları İçin 6 Adet Ray Nivosu Ve Mirası Alımı (%100'ü Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2023-2024	1.077.600	0	1.077.600,00	1.077.600	100%	100%	29.11.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 11.03.2024 tarihinde malzemeler teslim alınmış olup çalışmalar tamamlanmıştır.
13	Isparta-Burdur-Karakuyu(Hariç)-Goncalı-Denizli Hat Kesimine Ait Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Tesisi İşi (%42'si Afyonkarahisar ilindedir.)	Dazkırı Evciler Dinar	2018-2024	362.737.907	80.232.858	44.692.948	39.446.969	33%	87%	Çalışmalar devam etmektedir.
14	Afyon-Karakuyu Yol Boyu sinyalizasyon Sistemleri Yapımı	Afyonkarahisar Sinanpaşa Sandıklı Kızılören Dinar	2023-2025	672.501.791	36.926.299	2.700.000	0	5%	1%	Çalışmalar devam etmektedir.

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKİ GERÇ. (%)	FİZİKİ GERÇ. (%)	AÇIKLAMALAR
15	Alayunt-Afyon-Konya Hat Kesiminde Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon Tesisleri, Gar Tevsiyatı, Yol Uzatmaları, Saydinger, Muhtelif Yerlerde Hemzemin Geçitler Yerine Alt Üst Geçitler Yapılması ve Muhtelif Alt Yapı-Üst Yapım İşi (%38'si Afyonkarahisar İlindedir.)	Sultandağı Çay-Çobanlar İhsaniye Afyonkarahisar	2021-2025	3.696.586.037	280.317.114	142.500.000	82.106.689	10%	16%	Çalışmalar devam etmektedir.
16	Dinar Gar Sahasına Kameralı Güvenlik Sistemi Kurulması İşi	Dinar	2024	6.568.845	0	6.568.845	5.706.329	87%	100%	İş Tamamlandı.
17	Alsancak-Eğirdir Hattı 2 adet Saydinger Yapılması İşi	Gökçebağ-Burdur	2024	12.326.275	0	12.326.275	11.398.442	92%	90%	Çalışmalar devam etmektedir.
18	Afyonkarahisar Gar Sahası Hizmetevlerinin İyileştirilmesi ve Doğlagaz Dönüşüm İşi	Afyonkarahisar	2024-2024	2.500.000	0	2.500.000	1.446.401	58%	100%	12.07.2024 tarihinde iş tamamlandı. 07.08.2024 tarihinde Geçici Kabulü yapılmış olup Kesin Hesabı yapılarak iş tamamlanmıştır.
19	Dinar Gar Şefliği Yükleme Rampasının Yenilenmesi	Afyonkarahisar	2024-2024	2.314.160	0	2.500.000	2.266.999	98%	100%	08.10.2024 tarihinde iş tamamlandı. 23.10.2024 tarihinde Geçici Kabulü yapılmış olup Kesin Hesabı yapılarak iş tamamlanmıştır.
20	Ekinova İstasyonu Yükleme Rampasının Yenilenmesi	Afyonkarahisar	2024-2024	902.872	0	1.200.000	902.872	100%	100%	08.10.2024 tarihinde iş tamamlandı. 23.10.2024 tarihinde Geçici Kabulü yapıldı. Kesin Hesabı yapılarak iş tamamlanmıştır.
21	Çay İstasyon Sahası Yükleme Rampası Tadilatı	Afyonkarahisar	2024-2024	308.030	0	434.850	0	0%	100%	İş tamamlanmış olup 24.12.2024 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Kesin hesap çalışmaları devam etmektedir.
22	Karakuyu İstasyon Sahası Yükleme Rampası Tadilatı	Afyonkarahisar	2024-2024	955.650	0	1.014.650	955.130	100%	100%	08.10.2024 tarihinde iş tamamlandı. 23.10.2024 tarihinde Geçici Kabulü yapıldı. Kesin Hesabı yapılarak iş tamamlanmıştır.
23	Afyonkarahisarda Garda Prefabrik Hizmet Binası Yapımı	Afyonkarahisar	2024-2025	13.998.308	0	1.400.000	0	0%	0%	ihale aşamasındadır.
TOPLAM :				4.982.974.996	408.727.481	271.691.628	175.369.096	11,72%	56,70%	

1-AFYON-KARAKUYU, ALSANCAK EĞİRDİR VE BOZANÖNÜ-İSPARTA HATLARINDA MUHTELİF KİLOMETRELERDE YARMA ŞEV DÜZENLENMESİ İŞİ



Yüklenici	Ali Ergin-Hmz Yapı Malzemeleri İnş. Harf. Oto. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı
Sözleşme Bedeli ve Tarihi	6.745.450 TL 23.10.2023
Yer Teslim Tarihi	01.11.2023
Fiziki İlerleme	% 25
Mali İlerleme	% 19

Durumu

05.10.2024 tarihinde sözleşme feshedilmiştir.



10- 7. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında 200 Adet Hemzemin Geçitte Asfalt Kaplama Yapılması İşi

Yüklenici

Ak Yol Asfalt İnşaat San. ve Tic.
Ltd. Şti.

Sözleşme Bedeli ve
Tarihi

4.463.795,00 TL – 25.10.2024

Yer Teslim Tarihi

01.11.2024

İş Bitim Tarihi

16.10.2025

Fiziki İlerleme

% 45

Mali İlerleme

% 41

Durumu

Çalışmalar devam etmektedir.

11- 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MEKANİK ATELYE MÜDÜRLÜĞÜ VE DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜKLERİ DEMİRBAŞINA KAYITLI 80 ADET VAGONUN REVİZYON İŞİ



Yüklenici	Acarlar Dokuma San. Ve Tic. A.Ş.
Sözleşme Bedeli ve Sözleşme Tarihi	16.890.275 TL- 05.10.2023
Yer Teslim Tarihi	13.10.2023
İş Bitim Tarihi	05.08.2024
Fiziki İlerleme	% 100
Mali İlerleme	% 90

Durumu

Çalışmalar tamamlanmıştır.



***Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler Ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik Madde 5 – (1)** de belirtildiği üzere Demiryolu hemzemin geçitlerinde, hemzemin geçit kaplamasının bitiminden sonraki, demiryolu hemzemin geçidini kesen karayoluna ait yaklaşım yolları ile karayolu kullanıcılarına yönelik işaretlerin ve karayoluna ait akıllı ulaşım sistemlerinin yapım, bakım, onarım, işletilmeleri ve gerekli **güvenlik tedbirlerinin alınmasından KARAYOLUNUN BAĞLI OLDUĞU kurum veya kuruluş sorumludur.**

Hemzemin Geçitler

Adet

Bekçili Bariyerli Geçit

8

Otomatik Bariyerli Geçit

25

Çapraz İşaretli (Serbest) Geçit

196

Uzaktan İdareli Bariyerli Geçit

2

Toplam Hemzemin Geçit Sayısı

231

13- KAKLIK-KARAKUYU-İSPARTA-BURDUR Yol Boyu Sinyalizasyon Sistemleri Yapım İşi



Yüklenici: KOLİN İNŞ. TURZ. TİC. VE SAN. AŞ

Proje Bedeli 362.737.906,86 TL

Yer Teslim Tarihi 28.05.2018

Sözleşme Bitiş Tarihi 23.09.2025

Fiziki İlerleme % 87

Mali İlerleme % 33

Durumu

Çalışmalar devam etmektedir.

14- AFYONŞEHİR(Hariç)-KARAKUYU(Hariç) Yol Boyu Sinyalizasyon Sistemleri Yapım İşi



Yüklenici: Elsel Elektromekanik İnşaat Proje Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Sözleşme Bedeli 142.898.227,00 TL

Yer Teslim Tarihi: 24.08.2023


Sözleşme Bitiş Tarihi 14.06.2025

Fiziki İlerleme %1

Durumu

Proje onayları ve malzeme teminleri yapılmaktadır.

15- ALAYUNT-AFYON- KONYA HAT KESİMİNDE ELEKTRİFİKASYON-VE SİNYALİZASYON TESİSLERİ GAR TEVSİATİ, YOL UZATMALARI, SAYDİNGLER, MUHTELİF YERLERDE HEMZEMİN GEÇİTLER YAPILMASI VE MUHTELİF ALT YAPI- ÜST YAPI YAPIM İŞİ

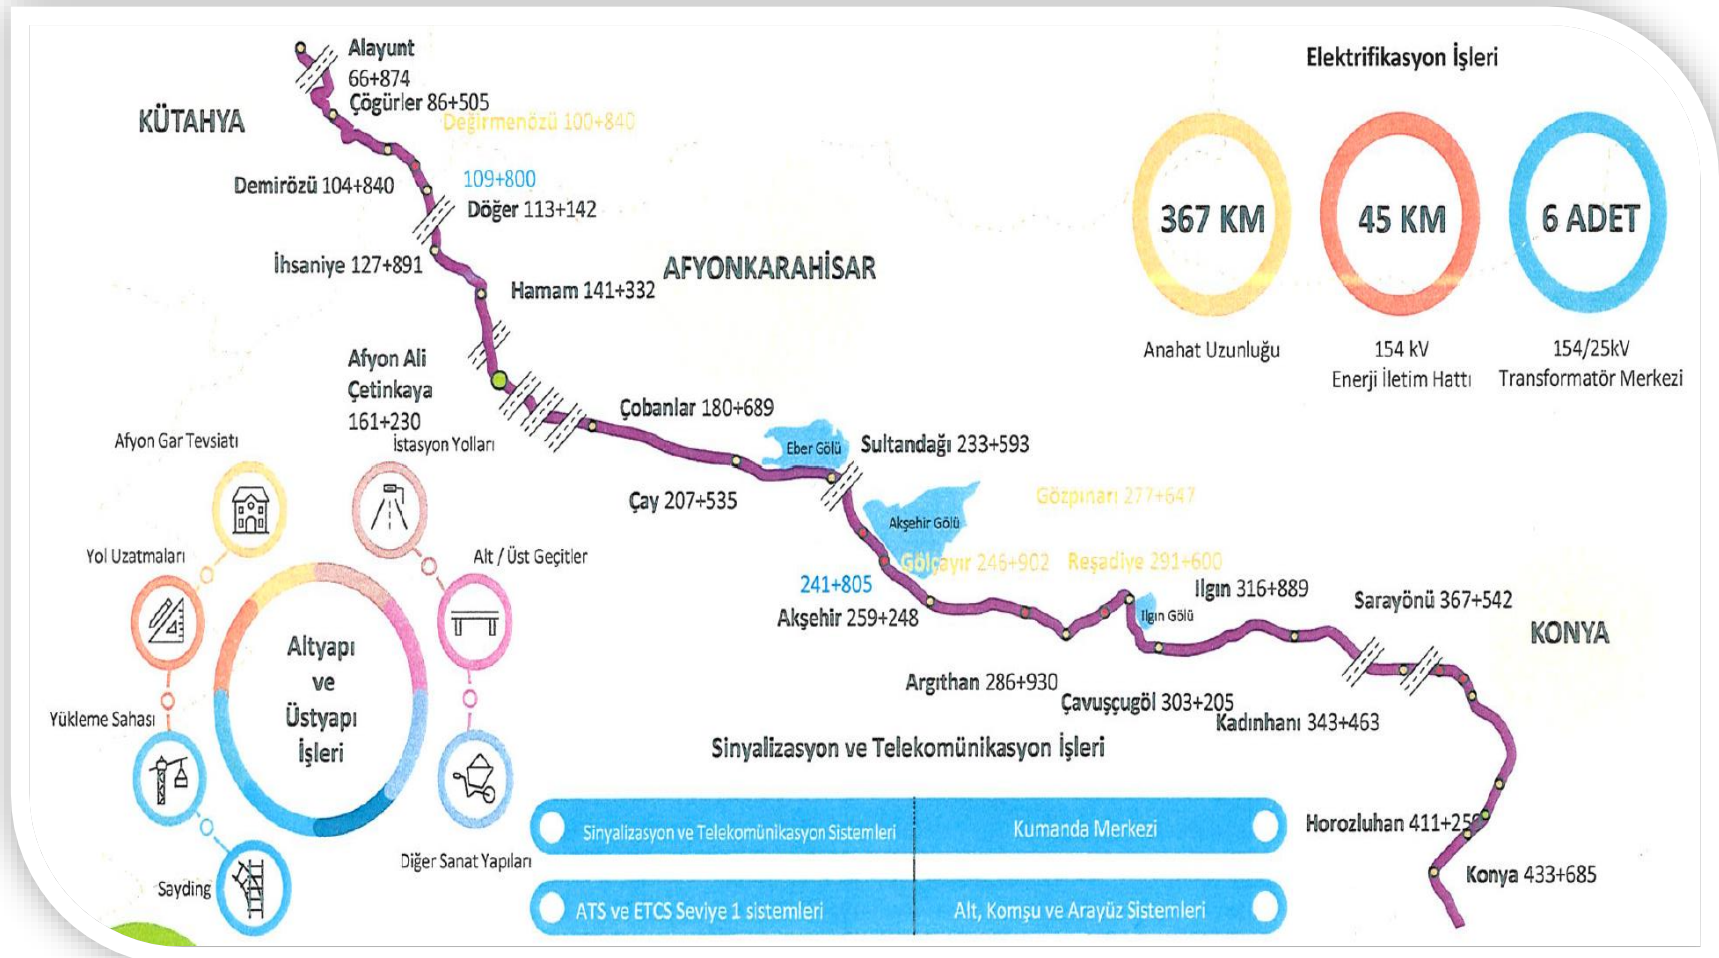

15- Kütahya-Afyonkarahisar-Konya Hat Kesimindeki proje toplam 347 km olup 172 km'si (%50) Afyon il sınırlarındadır.



Yüklenici: YAPI MERKEZİ İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Proje Bedeli 3.696.586.037,34 TL

Yer Teslim Tarihi: 06.08.2021

Fiziki İlerleme % 16

Mali İlerleme % 10

Durumu

Çalışmalar devam etmektedir.

16- Dinar Gar Sahasına Kameralı Güvenlik Sistemi Kurulması İşi

5.802.550,00 TL bedel ile sözleşmesi imzalanmıştır.

- Yüklenici; Akare Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.
- 01/08/2024 tarihinde ihalesi yapılmıştır.
- 03/09/2024 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
- İş Tamamlanmıştır.
- 26/11/2024 tarihinde geçici kabulü yapıldı.

17- Alsancak-Eğirdir Hattı 2 adet Sayding Yapılması İşi

Afyonkarahisar Çapalı için 11.649.329,50 TL bedel ile sözleşmesi imzalanmıştır.

- Yüklenici; KARANOĞULLARI İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
- 14/08/2024 tarihinde ihalesi yapılmıştır.
- 02/09/2024 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
- Çalışmalar devam etmektedir.
- Fiziki İlerleme % 90

18- Afyonkarahisar Gar Sahası Hizmetevlerinin İyileştirilmesi ve Doğalgaz Dönüşüm İşi



Yüklenici: Zirve Mühendislik

Sözleşme Bedeli ve Tarihi	1.467.154,20 TL- 17/05/2024
Sözleşme Bitim Tarihi	21/08/2024
Yer Teslim Tarihi	24.05.2024
Fiziki İlerleme	% 100
Mali İlerleme	%52

Durumu

07.08.2024 tarihinde geçici Kabulü yapılmıştır.

19- Dinar Gar Şefliği Yükleme Rampasının Yenilenmesi



Yüklenici: SAY Yapı İnş.Taah.Hafr.Nak.Hazır Beton ve Ürün. Mer. Mad. İşl. Turz. Tic. San. Ltd. Şti.

Sözleşme Bedeli ve Tarihi	2.314.159,90 TL – 18.07.2024
Sözleşme Bitim Tarihi	06.08.2024
Yer Teslim Tarihi	08.10.2024
Fiziki İlerleme	% 100
Mali İlerleme	%97,96

Durumu

23.10.2024 tarihinde geçici Kabulü yapılmıştır. Kesin hesabı yapılarak iş tamamlanmıştır.

20- Ekinova İstasyonu Yükleme Rampasının Yenilenmesi



Yüklenici: SAY Yapı İnş.Taah.Hafr.Nak.Hazır Beton ve Ürün. Mer. Mad. İşl. Turz. Tic. San. Ltd. Şti.

Sözleşme Bedeli ve Tarihi	902.872,06 TL – 18.07.2024
Sözleşme Bitim Tarihi	06.08.2024
Yer Teslim Tarihi	08.10.2024
Fiziki İlerleme	% 100
Mali İlerleme	%100

Durumu

23.10.2024 tarihinde geçici Kabulü yapılmıştır. Kesin hesabı yapılarak iş tamamlanmıştır.

21- Çay İstasyon Sahası Yükleme Rampası Tadilatı



**Yüklenici: ACA Grup Mimarlık
İnş.San.Tic.Ltd.Şti.**

Sözleşme Bedeli ve Tarihi	308.030,35 TL – 10.07.2024
Sözleşme Bitim Tarihi	16.12.2024
Yer Teslim Tarihi	19.08.2024
Fiziki İlerleme	% 100
Mali İlerleme	%0

Durumu

24.12.2024 tarihinde geçici Kabulü yapılmıştır. Kesin hesap çalışmaları devam etmektedir.

22- Karakuyu İstasyon Sahası Yükleme Rampası Tadilatı



Yüklenici: SAY Yapı İnş.Taah.Hafr.Nak.Hazır Beton ve Ürün. Mer. Mad. İşl. Turz. Tic. San. Ltd. Şti.

Sözleşme Bedeli ve Tarihi	955.650,00 TL – 18.07.2024
Sözleşme Bitim Tarihi	08.10.2024
Yer Teslim Tarihi	06.08.2024
Fiziki İlerleme	% 100
Mali İlerleme	%99,95

Durumu

23.10.2024 tarihinde geçici Kabulü yapılmıştır. Kesin hesabı yapılarak iş tamamlanmıştır.



Yük Taşımacılığı	Gelen Yük (Ton)	Giden Yük (Ton)	Toplam (Ton)
Afyon Ali Çetinkaya	118.542	410.791	529.333
Balmahmut	651	1.132	1.783
Dinar	4.727	3.590	8.306
Gecek	10.738	18.291	29.029
İhsaniye	142	8.924	9.066
Sandıklı	100	48	148
Sülün	44.759	185.267	230.023
TOPLAM	179.655	628.033	807.688



✓ Afyon Gar'da :

*2 Adet Mavi Tren (Konya Mavi)

*2 Adet Ekspres Tren (Pamukkale Ekspres Treni)

*2 Adet Afyon çıkışlı – varışlı Bölgesel Ekspres (Afyon-Eskişehir-Afyon) Olmak üzere

6 Trenle hizmet verilmektedir.



**2024 Yılında toplam
61.636 yolcu taşınmıştır.**



ARZ EDERİM.

Uğur AÇIKGÖZ
Bölge Müdürü V.
