



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü


5. Bölge Müdürlüğü
Afyonkarahisar İli

17.01.2025

5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Afyonkarahisar İli

- Bölge Müdürlüğümüz;
- **Afyonkarahisar**, Kütahya, Denizli, Eskişehir ve Uşak illerini kapsamaktadır.





2024 YILI YATIRIMCI KURULUŐ DÖNEM RAPORU



PROJELERİN SEKTÖREL DAĞILIMI	ADEDİ
TURİZM	5
DKH-Sosyal	3
Eğitim-Kültür	3
TOPLAM	11
2024 YILI PROGRAM ÖDENEĐİ	38.022.200 TL
2024 YILI HARCAMA	37.984.620 TL
NAKDİ GERÇEKLEŐME	% 100
FİZİKİ GERÇEKLEŐME	% 100



TURİZM

Muhtelif Etüt
Proje

Muhtelif Proje

MERKEZ



Fiziki Gerçekleşme
Oranı
%99

ÖDENEK
670.000 ₺

HARCAMA
667.600 ₺

Nakdi
Gerçekleşme Oranı
%100

26 Ağustos Tabiat Parkı Gelişme Planı Revizyonu Yapımı İşi tamamlanmıştır. 26 Ağustos Tabiat Parkı Karayolları geçiş izni için vaziyet planı ödemesi yapılmıştır. Akdağ Milli Parkına ait Uzun Devreli Gelişme Planının Analitik Etüt ve Sentez ve Plan raporunda bulunan, 20 adet harita yapım işi tamamlanmıştır.

TURİZM

Tabiat Parkları

Bakım Onarım

MERKEZ



26 Ağustos Tabiat Parkı yöresel ürün satış üniteleri tamir bakım işi yapımı tamamlanmıştır. Ayrıca At manaj alanı ve Binalarda kamera sistemi tamir ve bakımı tamamlanmıştır.

Fiziki Gerçekleşme
Oranı
% 100

ÖDENEK
630.000 ₺

HARCAMA
621.420 ₺

Nakdi
Gerçekleşme Oranı
% 100

YATIRIM PROJE İZLEME RAPORU



TURİZM

**TABIAT
PARKLARI**

Alan Düzenleme

DİNAR



**Fiziki Gerçekleşme
Oranı**
%100

ÖDENEK
2.250.000 ₺

HARCAMA
2.242.848 ₺

**Nakdi
Gerçekleşme Oranı**
% 100

Dinar Pınarlı Tabiat Parkına 1 Adet giriş Takı ve 1 Adet Çatılı ormancı masası, 4 Adet Kamelya ve 8 Adet Barbekü Yapımı işi ve Su İsale Hattı Yapılması işi tamamlanmıştır. Ayrıca Emprenyeli Ahşap Yapı ve Donatıları ile Yönlendirme, Uyarı ve Bilgilendirme Tabelaları Yapılmıştır.




Sosyal-Çevre

Sulak Alan Envanter
Yönetim Planı
Hazırlama ve
İzleme
(Danışmanlık)

Karakuyu Sulak
Alanı

DİNAR

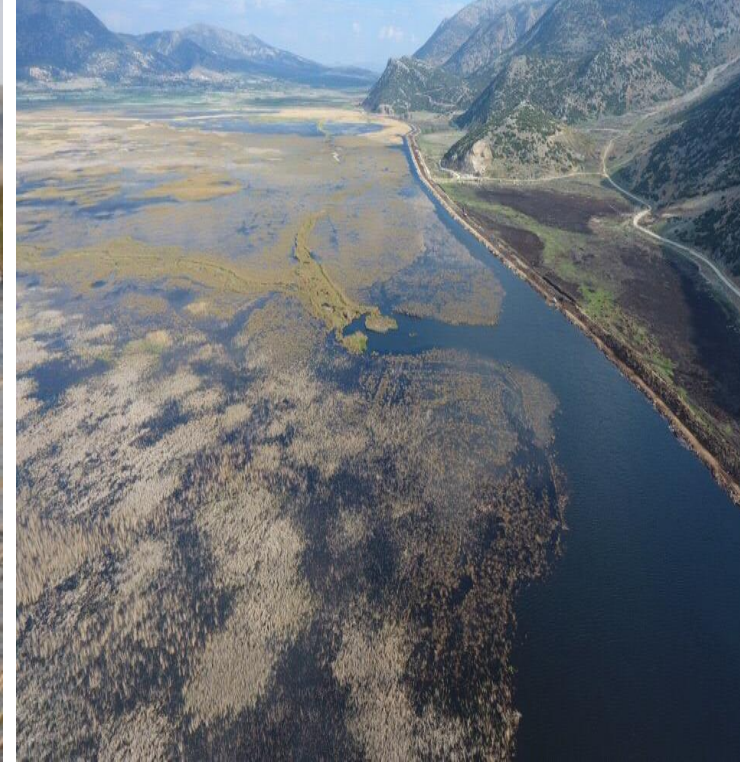

Karakuyu Sulak Alan Revize yönetim Planı Hazırlanması ve Karakuyu Sulak Alanının Hidrojeolojik Yapısının Matematiksel Modellenmesi Projesi Hizmet Alımı işi tamamlanmış olup ödemesi yapılmıştır.

Fiziki Gerçekleşme
Oranı
%100

ÖDENEK
438.000 ₺

HARCAMA
437.640 ₺

Nakdi
Gerçekleşme Oranı
% 100

Sosyal-Çevre

Etüt Proje

Seyitler Barajı

MERKEZ



Seyitler Barajı İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin önlenmesi için istilacı türün toplanması ve bu kapsamda tanıtım materyali hazırlanması yapılmıştır.

Fiziki Gerçekleşme Oranı
% 100

ÖDENEK
350.000 ₺

HARCAMA
349.920 ₺

Nakdi Gerçekleşme Oranı
% 100

Turizm

Bakım Onarım

**Sandıklı – Akdağ Milli
Parkı**



Akdağ Milli parkında mevcut su kaynağının düzenlenmesi, mescidin ve wc bakım onarımı işi yapılmıştır. Baraj Seddesi üzeri Ahşap korkulukların Bakım ve Onarımı ve düzenlenmesi yapılmıştır. Akdağ Milli Parkında bulunan araç park yerlerinin zemin düzeltme işi tamamlanmıştır.

**Fiziki Gerçekleşme
Oranı
%100**

**ÖDENEK
630.000 ₺**

**HARCAMA
628.000 ₺**

**Nakdi
Gerçekleşme Oranı
%100**

Turizm

Alan Düzenleme

**Sandıklı- Akdağ Milli
Parkı**



**Fiziki Gerçekleşme
Oranı
%100**

**ÖDENEK
1.080.000 ₺**

**HARCAMA
1.062.992 ₺**

**Nakdi
Gerçekleşme Oranı
%100**

Akdağ Milli Parkı Su İsale Hattının Yapılması işi tamamlanmıştır. Ayrıca Akdağ Milli Parkına 3 Adet Kontrollü ateş yakma yeri yapımı işi tamamlanmıştır. Akdağ Milli Parkında Emprenyeli Ahşap düzenlenmesi ve ahşap levhaların yapılması işi tamamlanmıştır.

Eğitim-Kültür

Alan Düzenleme

AFYONKARAHİSAR



Zafer Müzesi 2. Etap Güçlendirme Restorasyon ve Tefrişat Yapım işi tamamlanmıştır.ve hizmete açılmıştır. Kocatepe wc zemin ve fosseptik yapılması işi tamamlanmıştır. İstiklal Tanıtım Merkezi iç mekan düzenleme işi bitmiştir. İstiklal Tanıtım Merkezi konferans salonu boya ve tadilat işi tamamlanmıştır.

Fiziki Gerçekleşme Oranı
%100

ÖDENEK
29.100.000 ₺

HARCAMA
29.100.000 ₺

Nakdi Gerçekleşme Oranı
%100

Eğitim-Kültür

Etüt-Proje

AFYONKARAHİSAR



Kocatepe'de 1+1 WC Proje Revizesi (Engelli WC ilaveli), Zafer Müzesi perde alımı, Kocatepe Anıtı'na engelli rampası yapım projesi tamamlanmıştır.

Fiziki Gerçekleşme Oranı
%100

ÖDENEK
675.000 ₺

HARCAMA
675.000 ₺

Nakdi Gerçekleşme Oranı
%100

Eğitim-Kültür

Bakım Onarım

AFYONKARAHİSAR



Çiğiltepe bayrak direği tamiri işi, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği anıt ve mermer taşları bakım onarımı, Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği anıt ve mermer taşlarının bakım onarımı tamamlanmıştır. İstiklal Tanıtım Merkezi garaj ve demir korkulukların bakım onarımı tamamlanmıştır.

Fiziki Gerçekleşme
Oranı
%100

ÖDENEK
1.640.000 ₺

HARCAMA
1.640.000 ₺

Nakdi
Gerçekleşme Oranı
%100

**DKH-Sosyal-
Belediye**

**Sokak
Hayvanlarına
Şehir Dışında
Sağlıklı Yaşam
Alanları
Oluşturulması
Projesi**



**Fiziki
Gerçekleşme
Oranı
% 100**

**ÖDENEK
559.200 ₺**

**HARCAMA
559.200 ₺**

**Nakdi
Gerçekleşme
Oranı
% 100**

**Afyonkarahisar
Muhtelif**

Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Bedeli için;
Afyonkarahisar Belediyesine; 553.800,00 TL
Dinar Belediyesine; 600,00 TL. aktarılmıştır.
Afyonkarahisar Çevre Birliğine;4.800 TL Aktarılmıştır.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU FAALİYETLERİ



2024 yılı sonu itibariyle **1.737** adet sokak hayvanı aşılalmıştır.



2024 yılı sonu itibariyle **1.738** adet sokak hayvanı kısırlaştırılmıştır.



2024 yılı sonu itibariyle **1.737** adet sokak hayvanı işaretleme ve kayıt işlemi gerçekleştirilmiştir



2024 yılı sonu itibariyle **45** adet sokak hayvanı sahiplendirilmiştir.





2024 yılında;
7 adet Avcı Eğitim Kursu'nda 158 kişiye
sertifika verilmiştir.



2024 yılında;
Av Koruma ve Kontrol çalışmalarında 761 kişi
kontrol edilmiş,
58 kişiye yasal işlem yapılmıştır.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü

Arz Ederim.

Kemal CAN
Bölge Müdürü
