





7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR İLİ 2025 YILI I. DÖNEM KOORDİNASYON TOPLANTISI

Furkan ZENGİN
Bölge Müdür Yrd. V.




TCDD BÖLGE HARİTASI

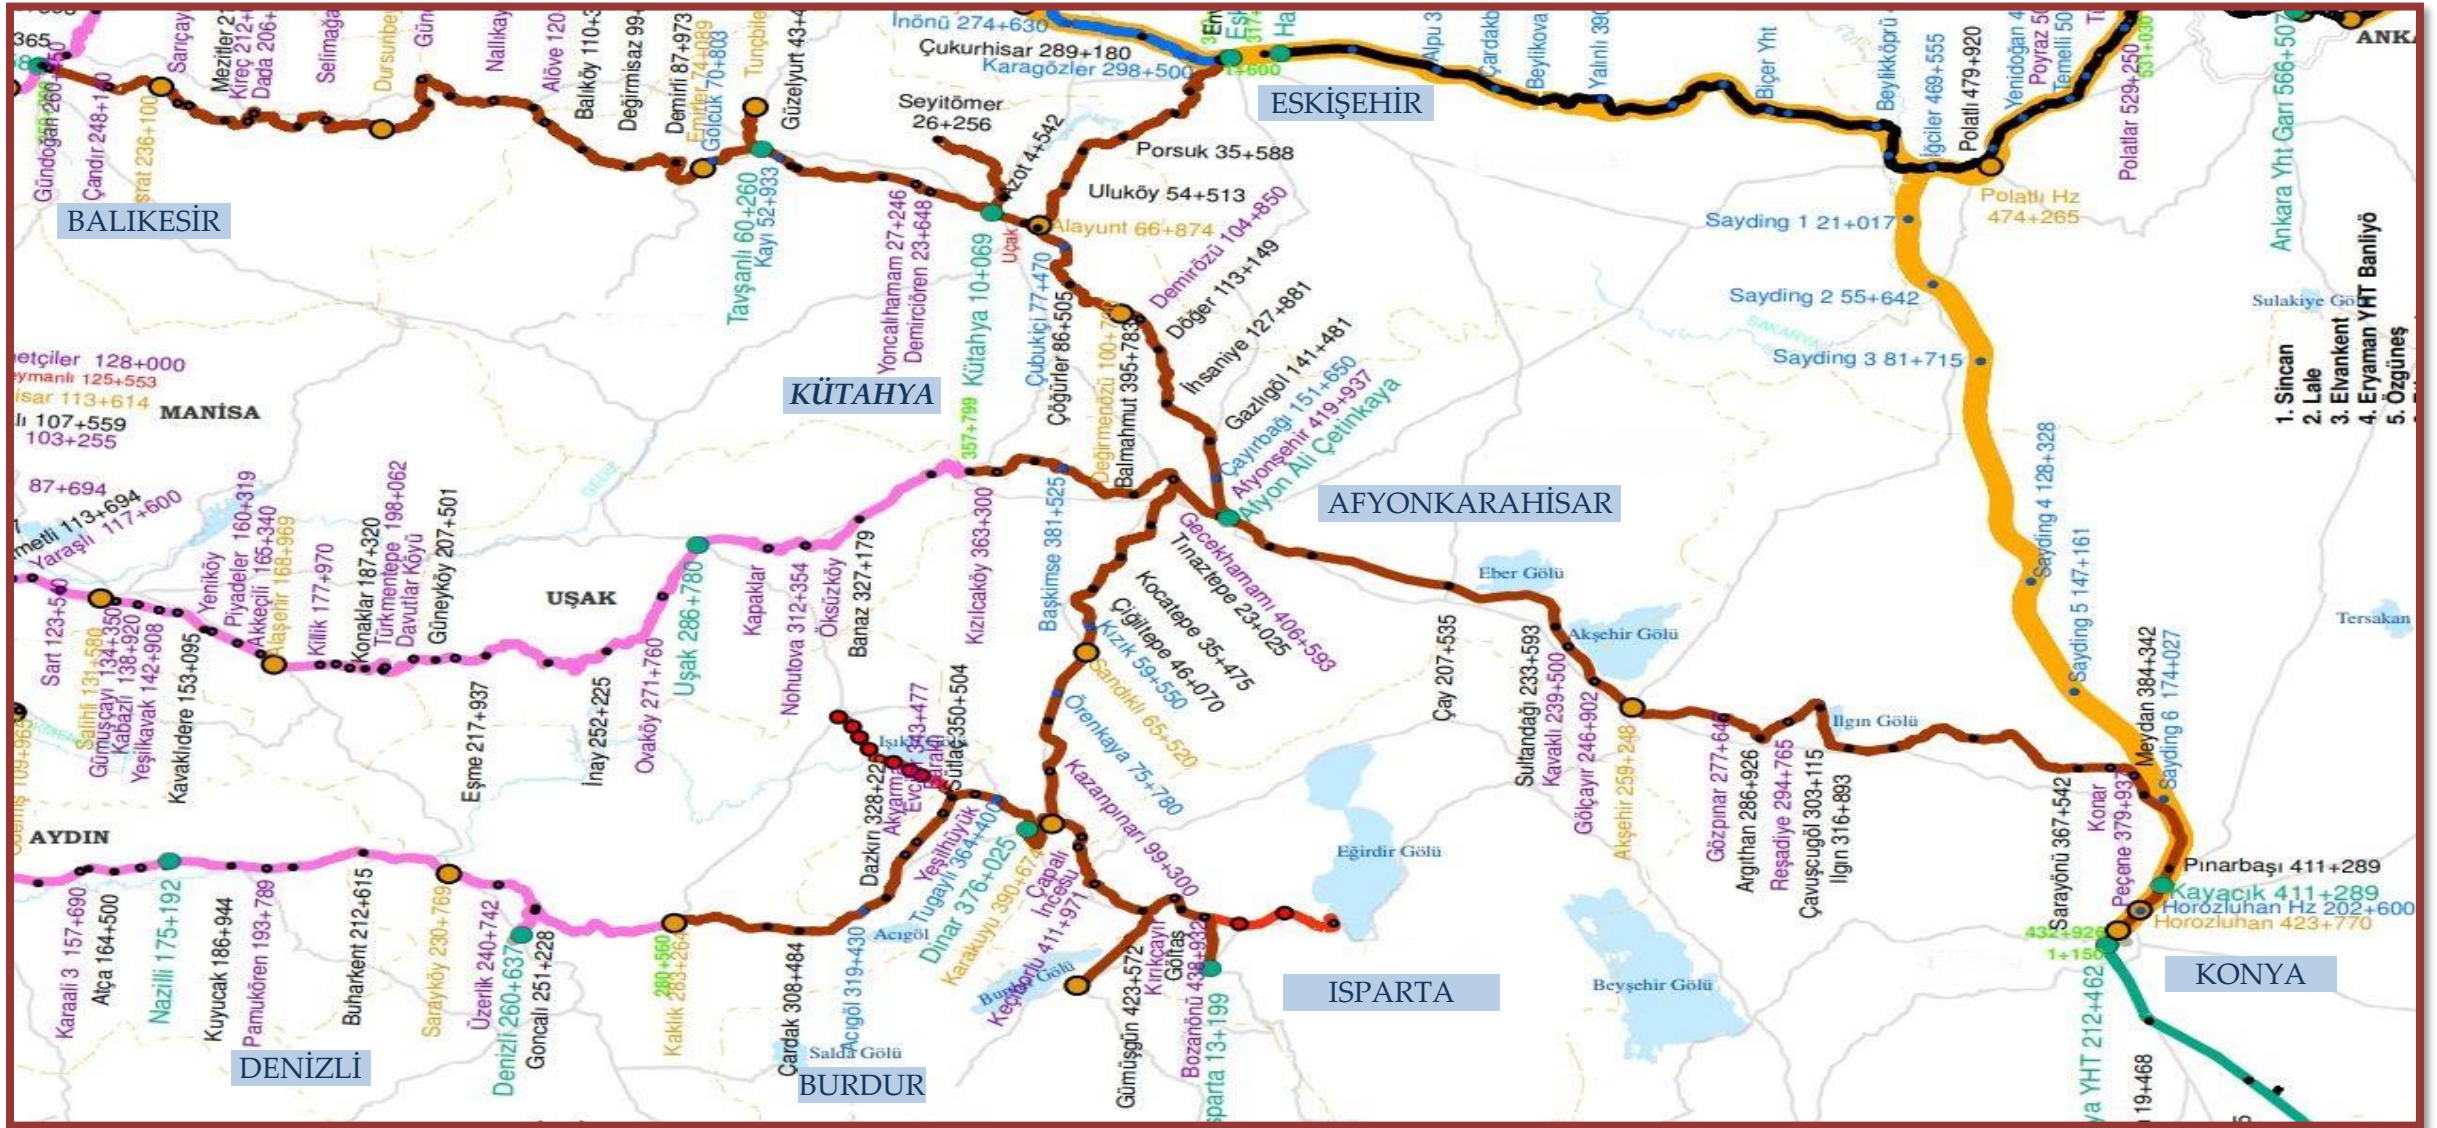

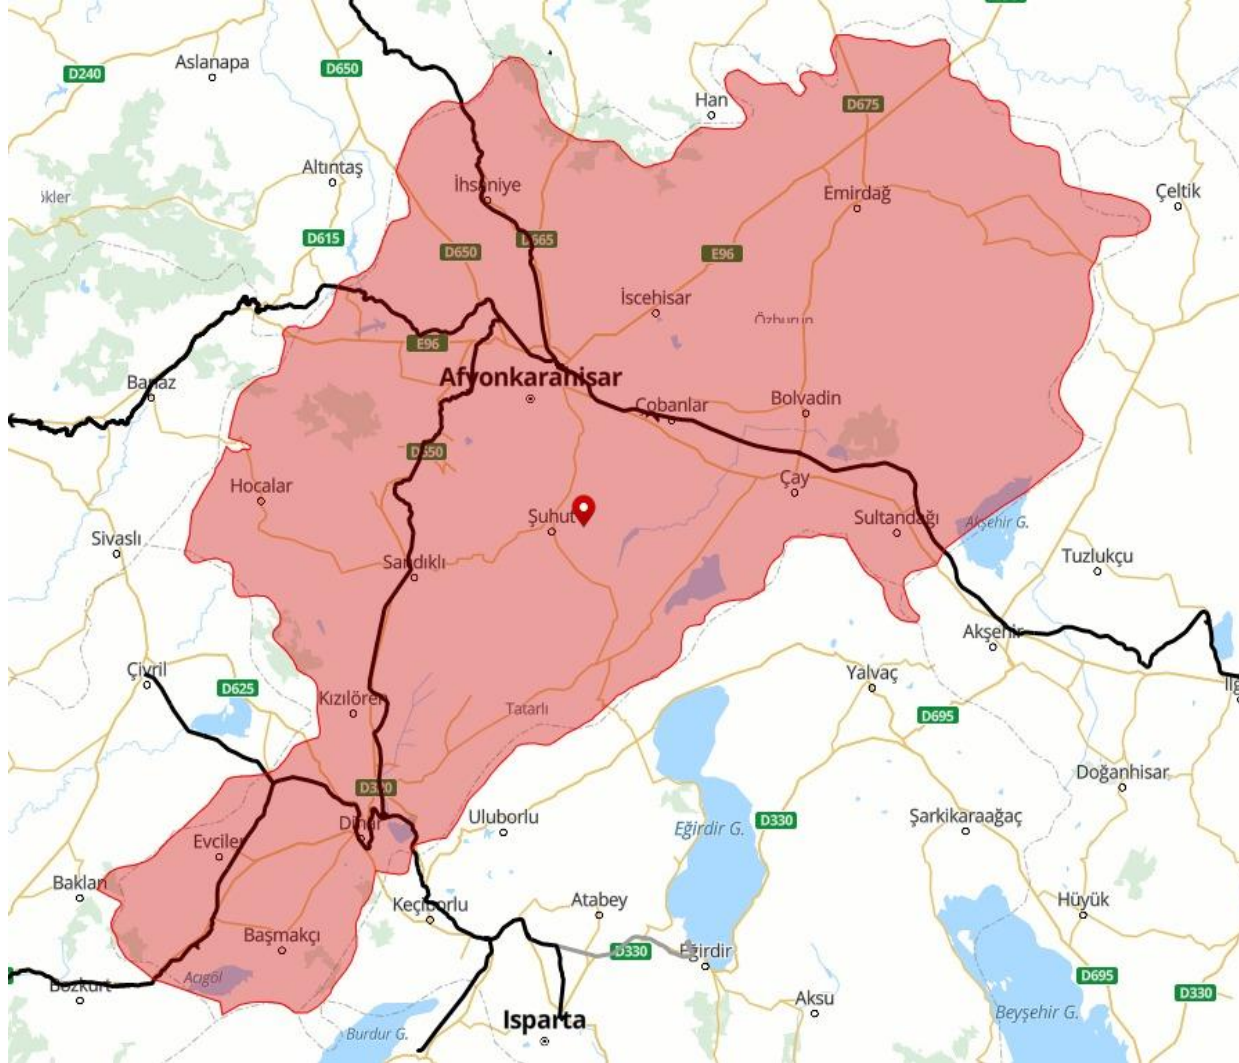

Personel Durumu

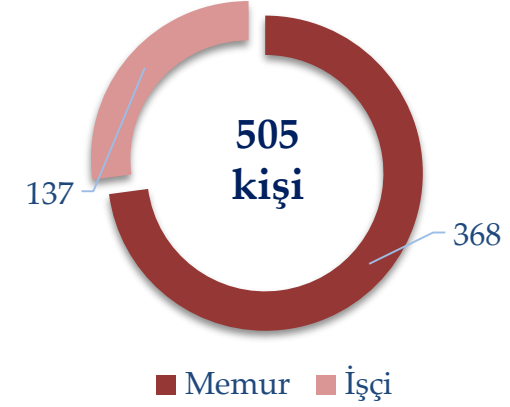

TCDD 7.Bölge Müdürlüğü bölgesinde bulunan 1431 km Demiryolu hattının 465 km'si Afyonkarahisar İl sınırlarında bulunmaktadır.

Taşra İşyerleri	Adet
Gar Müdürlüğü	2 (6)
Gar Şeflikleri	1
İstasyon Şefliği	17
TOPLAM	20



AFYONKARAHİSAR İLİ YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU



TCDD 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR

1-TOPLANTI DÖNEMİ	:	2025 / I
2-YATIRIMCI KURULUŞUN ADI	:	TCDD 7.Bölge Müdürlüğü -AFYONKARAHİSAR
3-TOPLAM PROJE SAYISI	:	28
4-PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI	:	Demiryolu-Ulaştırma
5-TOPLAM PROJE TUTARI	:	6.426.071.554 TL
6-ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	:	572.483.412 TL
7-YILI ÖDENEĞİ	:	1.428.499.489 TL
8-DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	:	4.099.694 TL
9-PARASAL GERÇEKLEŞME (%'Sİ)	:	0,002%
11-BİTEN PROJE SAYISI	:	1
12-DEVAM EDEN PROJE SAYISI	:	9
13-İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	:	18



AFYONKARAHİSAR İLİ YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU



SIRA NO	PROJE	PROJE SAYISI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL)	DÖNEM SONU HARCAMA (TL)
1	Yol Yenilemeleri ve Hemzemin Geçit İyileştirmeleri	13	234.154.405	0
2	Sinyalizasyon elektrifikasyon Alt Yapı Üst Yapı	3	1.156.730.112	3.999.319
3	Kamera ve Sayding	2	925.000	100.375
4	Gar, İstasyon ve Diğer Hizmet Binaları ve Tesisleri Bakım ve Onarımı	2	20.037.960	0
5	Mevcut Bina Ve Sabit Tesislerin Deprem Güçlendirmeleri	8	16.652.012	0
	TOPLAM	28	1.428.499.489	4.099.694



AFYONKARAHİSAR İLİ YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU



SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKDİ GERÇ. (%)	FİZİKİ GERÇL. (%)	AÇIKLAMALAR
1	Afyon-Karakuyu, Alsancak Eğiridir Ve Bozanönü-Isparta Hatlarında Muhtelif Kilometrelerde Yarma Şev Düzenlenmesi İşİ (%75'i Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2023-2025	18.188.536 (13.641.402)	2.188.536 (1.641.402)	16.000.000 (12.000.000)	0	12%	12%	05.10.2024 tarihinde yüklenici işi tamamlayamadığı için sözleşme fesh edilmiş olup ikmal ihalesi 22.01.2025 tarihinde yapılmıştır. İkmal ihalesinin sözleşmesi 12.02.2025 tarihinde imzalanmış, 21.02.2025 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.
2	Afyon-Karakuyu Hattı Km: 32+475 - 32+688 Arasında Bulunan 6 Nolu Tünelin Rehabilitasyonu ve Ölçümü İşİ (%100'ü Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2022-2025	22.031.305	0	22.031.305	0	0%	0%	Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'nden izin beklenmektedir. İzin alınmasının ardından ihalesi yapılacaktır. İhale aşamasındadır.
3	7. Bölge Müdürlüğü Bölgesinde Muhtelif Kesimlerdeki Yarma Ve Tünellerin Islahına Yönelik Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşİ (%26'sı Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2022-2025	3.100.000 (806.000)	0	3.100.000 (806.000)	0	0%	25%	21.12.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.
4	Basmane - Afyon ve Afyon-Karakuyu Hatlarında 10 Adet Yarmada Şev Eğimi Düzenlenmesi İşİ (%100'ü Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2023-2025	13.290.916	0	13.290.916	0	0%	0%	İlgili Orman Bölge Müdürlüklerine izin başvurusu yapılmıştır. İzinlerin alınmasının ardından ihalesi yapılacaktır. İhale aşamasındadır.
5	Eskişehir-Konya Hattı Üstyapı İyileştirilmesi (%50'si Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2023-2025	231.519.006 (115.759.503)	66.519.005	165.000.000 (82.500.000)	0	29%	29%	Çalışmalar devam etmektedir.



AFYONKARAHİSAR İLİ YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU



SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKDİ GERÇ. (%)	FİZİKİ GERÇL. (%)	AÇIKLAMALAR
6	7. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Ray Taşlama Makinesi İle Hat Koruyucu Ve Düzeltici Taşlama Yapılması (%40'ı Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2023-2025	56.752.960 (22.701.184)	0	56.752.960 (22.701.184)	0	0%	0%	Yatırım Genel Müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir. 15.01.2025 tarihinde sözleşme imzalanmış olup çalışmalar devam etmektedir.
7	Eskişehir - Konya HattındaYarma Şev Eğimi Düzenlenmesi İşi (%40'ı Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2025-2025	20.699.708 (8.279.883)	0	11.000.000 (4.400.000)	0	0%	0%	2025 yılında ödenek tahsis edilmiş olup ihale hazırlığı yapılmaktadır.
8	7. Bölge Müdürlüğü Hatlarında Üstyapı İyileştirilmesi (%100'ü Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2025-2025	113.010.781	0	50.000.000	0	0%	0%	2025 yılında ödenek tahsis edilmiş olup ihale hazırlığı yapılmaktadır.
9	7. Bölge Müdürlüğü İstasyonlarında Manevra Yürüyüş Yolu Yapılması (%25'i Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2025-2025	4.000.000 (1.000.000)	0	4.000.000 (1.000.000)	0	0%	0%	2025 yılında ödenek tahsis edilmiş olup ihale hazırlığı yapılmaktadır.
10	Afyon Karakuyu Hattında 9 Adet Yarmada Şev Eğimi Düzenlenmesi İşi (%100'ü Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2025-2025	13.184.230	0	8.000.000	0	0%	0%	2025 yılında ödenek tahsis edilmiş olup ihale hazırlığı yapılmaktadır.
11	7. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Muhtelif Hemzemin Geçitlerde Asfalt Kaplama Yapılması (%25'i Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2022-2025	7.680.408 (5.760.306)	9.541.223 (2.385.306)	13.500.000 (3.375.000)	0	41%	41%	01.11.2024 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.
12	7. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Bulunan 150 Adet Hemzemin Geçitte Kaplama Yapılması (%20'si Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2025-2025	29.000.000 (5.800.000)	0	29.000.000 (5.800.000)	0	0%	0%	2025 yılında ödenek tahsis edilmiş olup ihale hazırlığı yapılmaktadır.



AFYONKARAHİSAR İLİ YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU



SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKDİ GERÇ. (%)	FİZİKİ GERÇL. (%)	AÇIKLAMALAR
13	7. Bölge Müdürlüğü Mintıkasındaki Hatların Ölçüm Sistemlerinin Yenilenmesi (%30'u Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2023-2025	154.169.638 (46.250.891)	0	15.500.000 (4.650.000)	0	0%	0%	Yatırım Genel Müdürlüğümüz tarafından takip edilmekte olup ihalesine Genel Müdürlüğümüz tarafından çıkılacaktır. İhale aşamasındadır.
14	7. Bölge Müdürlüğü Mintıkasındaki Demiryolu Hatlarının Yersel Ve/Veya Hava Kaynaklı Mobil Haritalama İle Envanter Tespiti Ve Ölçümü (%100'ü Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2022-2025	35.152.269	0	3.600.000	0	0%	0%	Yatırım Genel Müdürlüğümüz tarafından takip edilmekte olup ihalesine Genel Müdürlüğümüz tarafından çıkılacaktır. İhale aşamasındadır.
15	Isparta-Burdur-Karakuyu(Hariç)-Goncalı-Denizli Hat Kesimine Ait Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Tesisi İşİ (%42'si Afyonkarahisar İlindedir.)	Dazkırı Evciler Dinar	2018-2025	913.874.016,6 (383.827.087)	286.619.392,8 (120.380.145)	133.653.252,3 (56.134.366)	9.522.188 (3.999.319)	32%	91%	Çalışmalar devam etmektedir.
16	Afyon-Karakuyu Yol Boyu sinyalizasyon Sistemleri Yapımı	Afyonkarahisar Sinanpaşa Sandıklı Kızılören Dinar	2023-2025	746.977.070	36.926.299	378.595.746	0	5%	1%	Çalışmalar devam etmektedir.
17	Alayunt-Afyon-Konya Hat Kesiminde Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon Tesisleri, Gar Tevsiyatı, Yol Uzatmaları, Saydingerler, Muhtelif Yerlerde Hemzemin Geçitler Yerine Alt Üst Geçitler Yapılması ve Muhtelif Alt Yapı-Üst Yapım İşİ (%38'si Afyonkarahisar İlindedir.)	Sultandağı Çay-Çobanlar İhsaniye Afyonkarahisar	2021-2025	12.714.310.397,3 (4.831.437.951)	964.453.460,5 (366.492.315)	1.900.000.000 (722.000.000)	0	8%	17%	Çalışmalar devam etmektedir.
18	Alsancak-Eğirdir Hattı 2 adet Saydinger Yapılması İşİ	Gökçebağ-Burdur	2024-2025	12.326.275	11.398.442	925.000	100.375	93%	100%	İş Tamamlandı. Geçici Kabulü Yapılmıştır.



AFYONKARAHİSAR İLİ YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU



SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKDİ GERÇ. (%)	FİZİKİ GERÇL. (%)	AÇIKLAMALAR
19	Afyonkarahisarda Garda Prefabrik Hizmet Binası Yapımı	Afyonkarahisar	2024-2025	11.144.529	0	13.000.000	0	0%	70%	Yer Teslim Tarihi 24.01.2025 dir. Çalışmalar devam etmektedir.
20	Dinar Gar Lojmanlarının İyileştirilmesi	Afyonkarahisar	2025	7.037.960	0	7.037.960	0	0%	0%	İhale aşamasındadır.
21	Afyonkarahisar Gar Sahasında Bulunan 37 Plan Nolu Binanın Rölöve,Restitüsyon,Restorasyon, Mühendislik ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması	Afyonkarahisar	2025	758.805	0	758.805	0	0%	0%	İhale aşamasındadır.
22	Afyonkarahisar Gar Sahasında Bulunan 17 Plan Nolu Binanın Rölöve,Restitüsyon,Restorasyon, Mühendislik ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması	Afyonkarahisar	2025	688.987	0	688.987	0	0%	0%	İhale aşamasındadır.
23	Afyonkarahisar Gar Sahasında Bulunan 19 Plan Nolu Binanın Rölöve,Restitüsyon,Restorasyon, Mühendislik ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması	Afyonkarahisar	2025	1.203.711	0	1.203.711	0	0%	0%	İhale aşamasındadır.
24	Afyonşehir İstasyon Sahasında Bulunan 3 Plan Nolu Binanın Rölöve,Restitüsyon,Restorasyon, Mühendislik ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması	Afyonkarahisar	2025	616.872	0	616.872	0	0%	0%	İhale aşamasındadır.



AFYONKARAHİSAR İLİ YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU



SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKDİ GERÇ. (%)	FİZİKİ GERÇL. (%)	AÇIKLAMALAR
25	Afyonkarahisar Gar Sahasında Bulunan 37 Plan Nolu Binanın Güçlendirilmesi	Afyonkarahisar	2025	3.064.268	0	3.064.268	0	0%	0%	İhale aşamasındadır.
26	Afyonkarahisar Gar Sahasında Bulunan 19 Plan Nolu Binanın Güçlendirilmesi	Afyonkarahisar	2025	5.209.256	0	5.209.256	0	0%	0%	İhale aşamasındadır.
27	Afyonkarahisar Gar Sahasında Bulunan 17 Plan Nolu Binanın Güçlendirilmesi	Afyonkarahisar	2025	2.726.794	0	2.726.794	0	0%	0%	İhale aşamasındadır.
28	Afyonşehir İstasyon Sahasında Bulunan 3 Plan Nolu Binanın Güçlendirilmesi	Afyonkarahisar	2025	2.383.320	0	2.383.320	0	0%	0%	İhale aşamasındadır.
TOPLAM :				6.426.071.554	572.483.412	1.428.499.489	4.099.694	9	4	

Alayunt-Afyon- Konya Hat Kesiminde Elektrifikasyon-Ve Sinyalizasyon Tesisleri Gar Tevsiatı, Yol Uzatmaları, Saydingler, Muhtelif Yerlerde Hemzemin Geçitler Yapılması Ve Muhtelif Alt Yapı- Üst Yapı Yapım İşİ




Yüklenici	Yapı Merkezi
Sözleşme Bedeli	1.763.710.369,00 TL (670.209.940 TL ile düşen kısmı %38)
Sözleşme Tarihi	13.07.2021
Yer Teslim Tarihi:	06.08.2021
İşin Süresi	275+173 Gün (26.10.2026)
Fiziki İlerleme	% 17
Mali İlerleme	% 16

Durumu

Çalışmalar devam etmektedir.

Alayunt-Afyonkarahisar-Konya Hattı

"Alayunt-Afyon- Konya Hat Kesiminde Elektrifikasyon-Ve Sinyalizasyon Tesisleri Gar Tevsiyatı, Yol Uzatmaları, Saydingler, Muhtelif Yerlerde Hemzemin Geçitler Yapılması Ve Muhtelif Alt Yapı- Üst Yapı Yapım İşi

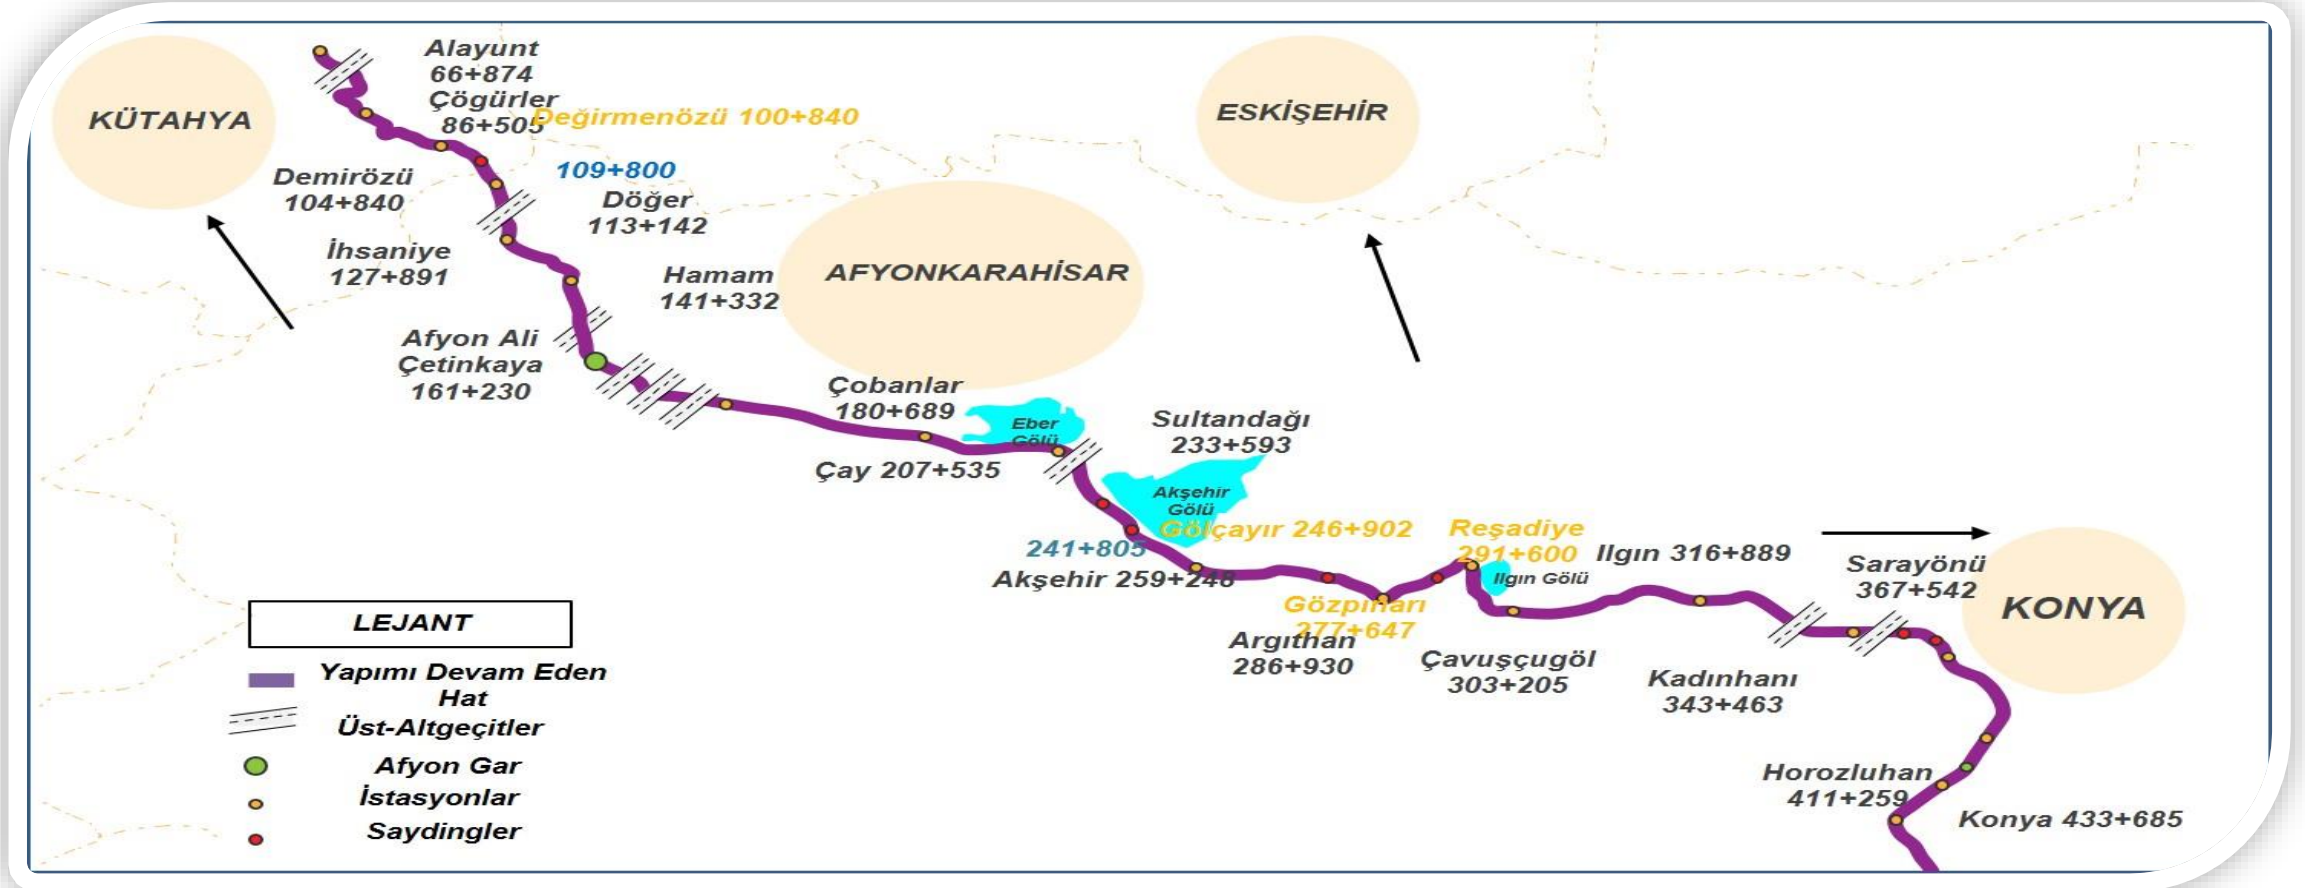



Afyon Gar menfez deplase işi, demir donatı çalışması devam etmektedir.



Afyon Gar menfez deplase işi, demir donatı çalışması devam etmektedir.



Afyon Gar menfez deplase işi, demir donatı çalışması devam etmektedir.



Afyon Gar tevsiyatı Faz-1, kazı-dolgu ve drenaj çalışması devam etmektedir.



Afyon Gar tevsiyatı Faz-1, kazı-dolgu ve drenaj çalışması devam etmektedir.



Aksu Deresi hat deplase çalışmaları devam etmektedir

DENİZLİ-KARAKUYU-İSPARTA-BURDUR Yol Boyu Sinyalizasyon Sistemleri Yapım İşİ (Milli Sinyal Kısım II)



Yüklenici	KOLİN İNŞAAT
Sözleşme Bedeli	72.364.110 TL (Tamamı) 30.392.926 TL (İle düşen kısmı %42)
Sözleşme Tarihi	14.05.2018
İşin Süresi	330+356+336+362+331+376 Gün (23.09.2025)
Yer Teslim Tarihi:	28.05.2018
Fiziki İlerleme	%91
Mali İlerleme	%84

Durumu

İhalesi Yapılarak Sözleşme İmzalanmıştır.
Sinyalizasyon Test Çalışmaları Devam Etmektedir.

Afyonşehir-Karakuyu Yol Boyu Sinyalizasyon Sistemleri TamamlamaYapım İşi (Milli Sinyal Kısım I)



Durumu

Projelendirme ile malzeme onay ve temin süreci devam etmektedir.

Yüklenici	Elsitel Elektromekanik
Sözleşme Bedeli	142.898.227,00 TL
Sözleşme Tarihi	10.08.2023
Yer Teslim Tarihi:	24.08.2023
İşin Süresi	660 Gün (14.06.2025)
Fiziki İlerleme	%1
Mali İlerleme	%10



Kamera Kurulması ve Sayding Yapım İşi



Alsancak-Eğirdir Hattı 2 adet Sayding Yapılması İşi	
Yüklenici	KARANOĞULLARI İNŞAAT
Sözleşme Bedeli	11.649.329,50 TL
Sözleşme Tarihi	14.08.2024
Fiziki İlerleme	%100
Mali İlerleme	%93,25
Yer Teslim Tarihi:	02.09.2024
Durumu	İş Tamamlanmıştır. Geçici Kabulü Yapılmıştır.



BAKIM ÇALIŞMALARI



"Afyon-Karakuyu, Alsancak Eğirdir Ve Bozanönü-Isparta Hatlarında Muhtelif Kilometrelerde Yarma Şev Düzenlenmesi İşi"



İkmal İhalesi 22.01.2025 tarihinde yapılmıştır.

Yüklenici MSD Madencilik Ltd. Şti.

Yüklenici	Ali Ergin-Hmz Yapı Malzemeleri İnş. Harf. Oto. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı
Sözleşme Bedeli ve Tarihi	6.745.450 TL 23.10.2023
Yer Teslim Tarihi:	01.11.2023
Fiziki İlerleme	% 12
Mali İlerleme	% 12
Durumu	Sözleşme 16.10.2024 tarihinde fesih edilmiştir.
Sözleşme Bedeli ve Tarihi:	7.405.576 TL 12.02.2025
Yer Teslim Tarihi:	21.02.2025
Fiziki İlerleme	% 12
Mali İlerleme	% 12
Durumu	Çalışmalar devam etmektedir.

7. Bölge Müdürlüğü Mintikasında Muhtelif Hemzemin Geçitlerde Asfalt Kaplama Yapılması



Yüklenici	Ak Yol Asfalt İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Sözleşme Bedeli ve Sözleşme Tarihi	4.463.795,00 TL – 25.10.2024
Yer Teslim Tarihi:	01.11.2024
Fiziki İlerleme	% 41
Mali İlerleme	% 41
Durumu	Çalışmalar devam etmektedir.

Gar, İstasyon, Hizmet Binaları Ve Tesislerinin Yapımı İle Modernizasyonu

Afyonkarahisarda Garda Prefabrik Hizmet Binası Yapımı



Yüklenici	Ferit Keleş&İbrahim Gökdemir İş Ortaklığı
Sözleşme Bedeli ve Tarihi	11.144.529,37 TL- 20/01/2025
Sözleşme Bitim Tarihi	21/08/2024
Yer Teslim Tarihi:	24/01/2025
İşin Süresi	120 gün
Fiziki İlerleme	% 70
Mali ilerleme	%0
Durumu	Çalışmalar devam etmektedir.



***Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler Ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik Madde 5 – (1)** de belirtildiği üzere Demiryolu hemzemin geçitlerinde, hemzemin geçit kaplamasının bitiminden sonraki, demiryolu hemzemin geçidini kesen karayoluna ait yaklaşım yolları ile karayolu kullanıcılarına yönelik işaretlerin ve karayoluna ait akıllı ulaşım sistemlerinin yapım, bakım, onarım, işletilmeleri ve gerekli **güvenlik tedbirlerinin alınmasından KARAYOLUNUN BAĞLI OLDUĞU** kurum veya kuruluş sorumludur.

Hemzemin Geçitler	Adet
Bekçili Bariyerli Geçit	9
Otomatik Bariyerli Geçit	26
Çapraz İşaretli (Serbest) Geçit	195
Uzaktan İdareli Bariyerli Geçit	1
Toplam Hemzemin Geçit Sayısı	231



POLATLI-AFYONKARAHİSAR-BANAZ KESİMİ YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİ (232 KM) DEVAM EDİYOR

ALAYUNT-AFYONKARAHİSAR-KONYA HAT KESİMİ(ESTA) PROJESİ (~794.100,00 m²) DEVAM EDİYOR

ALAYUNT-BALIKESİR, KÜTAHYA-SEYİTÖMER, TAVSANLI-TUNÇBİLEK VE ESKİŞEHİR KONYA HATLARINDA YARMA ŞEV EĞİMİ DÜZENLEME PROJESİ İÇİN BALIKESİR İLİ, DURSUNBEY İLÇESİ, AKÇAĞÜNEY KÖYÜ İÇİN (13 PARSEL) KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANMIŞTIR..



YOLCU TRENLERİ



- ✓ Afyon Gar'da :
- *2 Adet Mavi Tren (Konya Mavi)
 - *2 Adet Ekspres Tren (Pamukkale Ekspres Treni)
 - *2 Adet Afyon çıkışlı – varışlı Bölgesel Ekspres (Afyon-Eskişehir-Afyon) Olmak üzere
- 6 Trenle hizmet verilmektedir.



ARZ EDERİM.

Furkan ZENGİN
Bölge Müdür Yrd. V.
