



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

18.Bölge Müdürlüğü
Afyonkarahisar İli Yatırımları
Osman ERKAN
Bölge Müdürü

22 Ekim 2024



TOPLAM PROJE SAYISI

125

DEVAM EDEN PROJE SAYISI

30

İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI

75

TAMAMLANAN PROJE SAYISI

20

TOPLAM PROJE TUTARI (TL)

12 140 096 000

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)

1 237 262 000

2024 YILI ÖDENEĞİ (TL)

699 336 000

DÖNEM SONU HARCAMA (TL)

542 273 000

PARASAL GERÇEKLEŞME (%)

78



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĐI



2024 Yılı Yatırım Programında Yer Alan İşler



AFYONKARAHİSAR İLİ BÜYÜK SU İŞLERİ PROJELERİ	6	AFYONKARAHİSAR İÇMESUYU PROJESİ 2. MERHALE
11 ADET SULAMA	13	Afyonkarahisar Sandıklı İlçesi İçmesuyu Tesisleri (3,71 hm ³ /yıl)
	14	Afyonkarahisar Sinanpaşa Güney Beldesi İsale Hattı (0,31 hm ³ /yıl)
	15	Afyonkarahisar Şuhut İlçesi İçmesuyu Tesisleri (1,6 hm ³ /yıl)
	16	Afyonkarahisar-Akarçay Havzası Bolvadin Dışli- Özburun Atıksu Arıtma Tesisi (1.900 m ³ /gün)
	17	Afyonkarahisar-Akarçay Havzası Merkez Büyükkalecik Atıksu Arıtma Tesisi (850 m ³ /gün)
7 ADET İÇMESUYU	18	Afyonkarahisar-Akarçay Havzası Merkez Gebeceler Atıksu Arıtma Tesisi (850 m ³ /gün)
	19	Afyonkarahisar-Emirdağ İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi (1,095 hm ³ /yıl)
	20	Afyonkarahisar-Kızılören İçmesuyu Tesisleri (8 km, 1,10 hm ³ /yıl)
4 ADET ATIKSU	21	Afyonkarahisar-Sandıklı İçmesuyu Arıtma Tesisi (18 000 m ³ /gün)
	22	Afyonkarahisar-İhsaniye Döğeri İlçesi İçmesuyu Tesisleri İkmali (0,67 hm ³ /yıl)
1 ADET TAMAMLAMA PROJELERİ	23	Afyonkarahisar-Sinanpaşa Taşoluk Beldesi İçmesuyu Tesisleri İkmali (0,54 hm ³ /yıl)
	7	ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ (28 325 ha)
3 ADET ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ	24	Afyonkarahisar 2.Kısım AT ve TİGH (16.869 ha)
	25	Afyonkarahisar 3.Kısım AT ve TİGH (9.500 ha)
	26	Afyonkarahisar-Bayat Asarcık Topplulaştırma Yolu ve Sanat Yapıları (1.956 ha)



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI

Afyonkarahisar İli Genel Vaziyet Planı



- 1) ÇAY SELEVİR SULAMASI YENİLEME PROJESİ
- 2) ÇOBANLAR SEYİTLER SULAMASI YENİLEME PROJESİ
- 3) BAYAT ASARCİK SULAMASI YENİLEMESİ
- 4) SANDIKLI-YAVAŞLAR PROJESİ
- 5) AFYONKARAHİSAR İÇMESUYU 2.MERHALE PROJESİ
- 6) AFYONKARAHİSAR-ÇAY VE BOLVADİN İÇMESUYU PROJESİ
- 7) KARAKUYU (DOMBAY) POMPAJ SULAMASI YENİLEME 1.KISIM
- 8) ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĐI



Çay Selevir Sulaması Yenileme Projesi




T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI

ÇAY SELEVİR SULAMASI YENİLEME PROJESİ



100
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YÜZÜNCÜ YILI

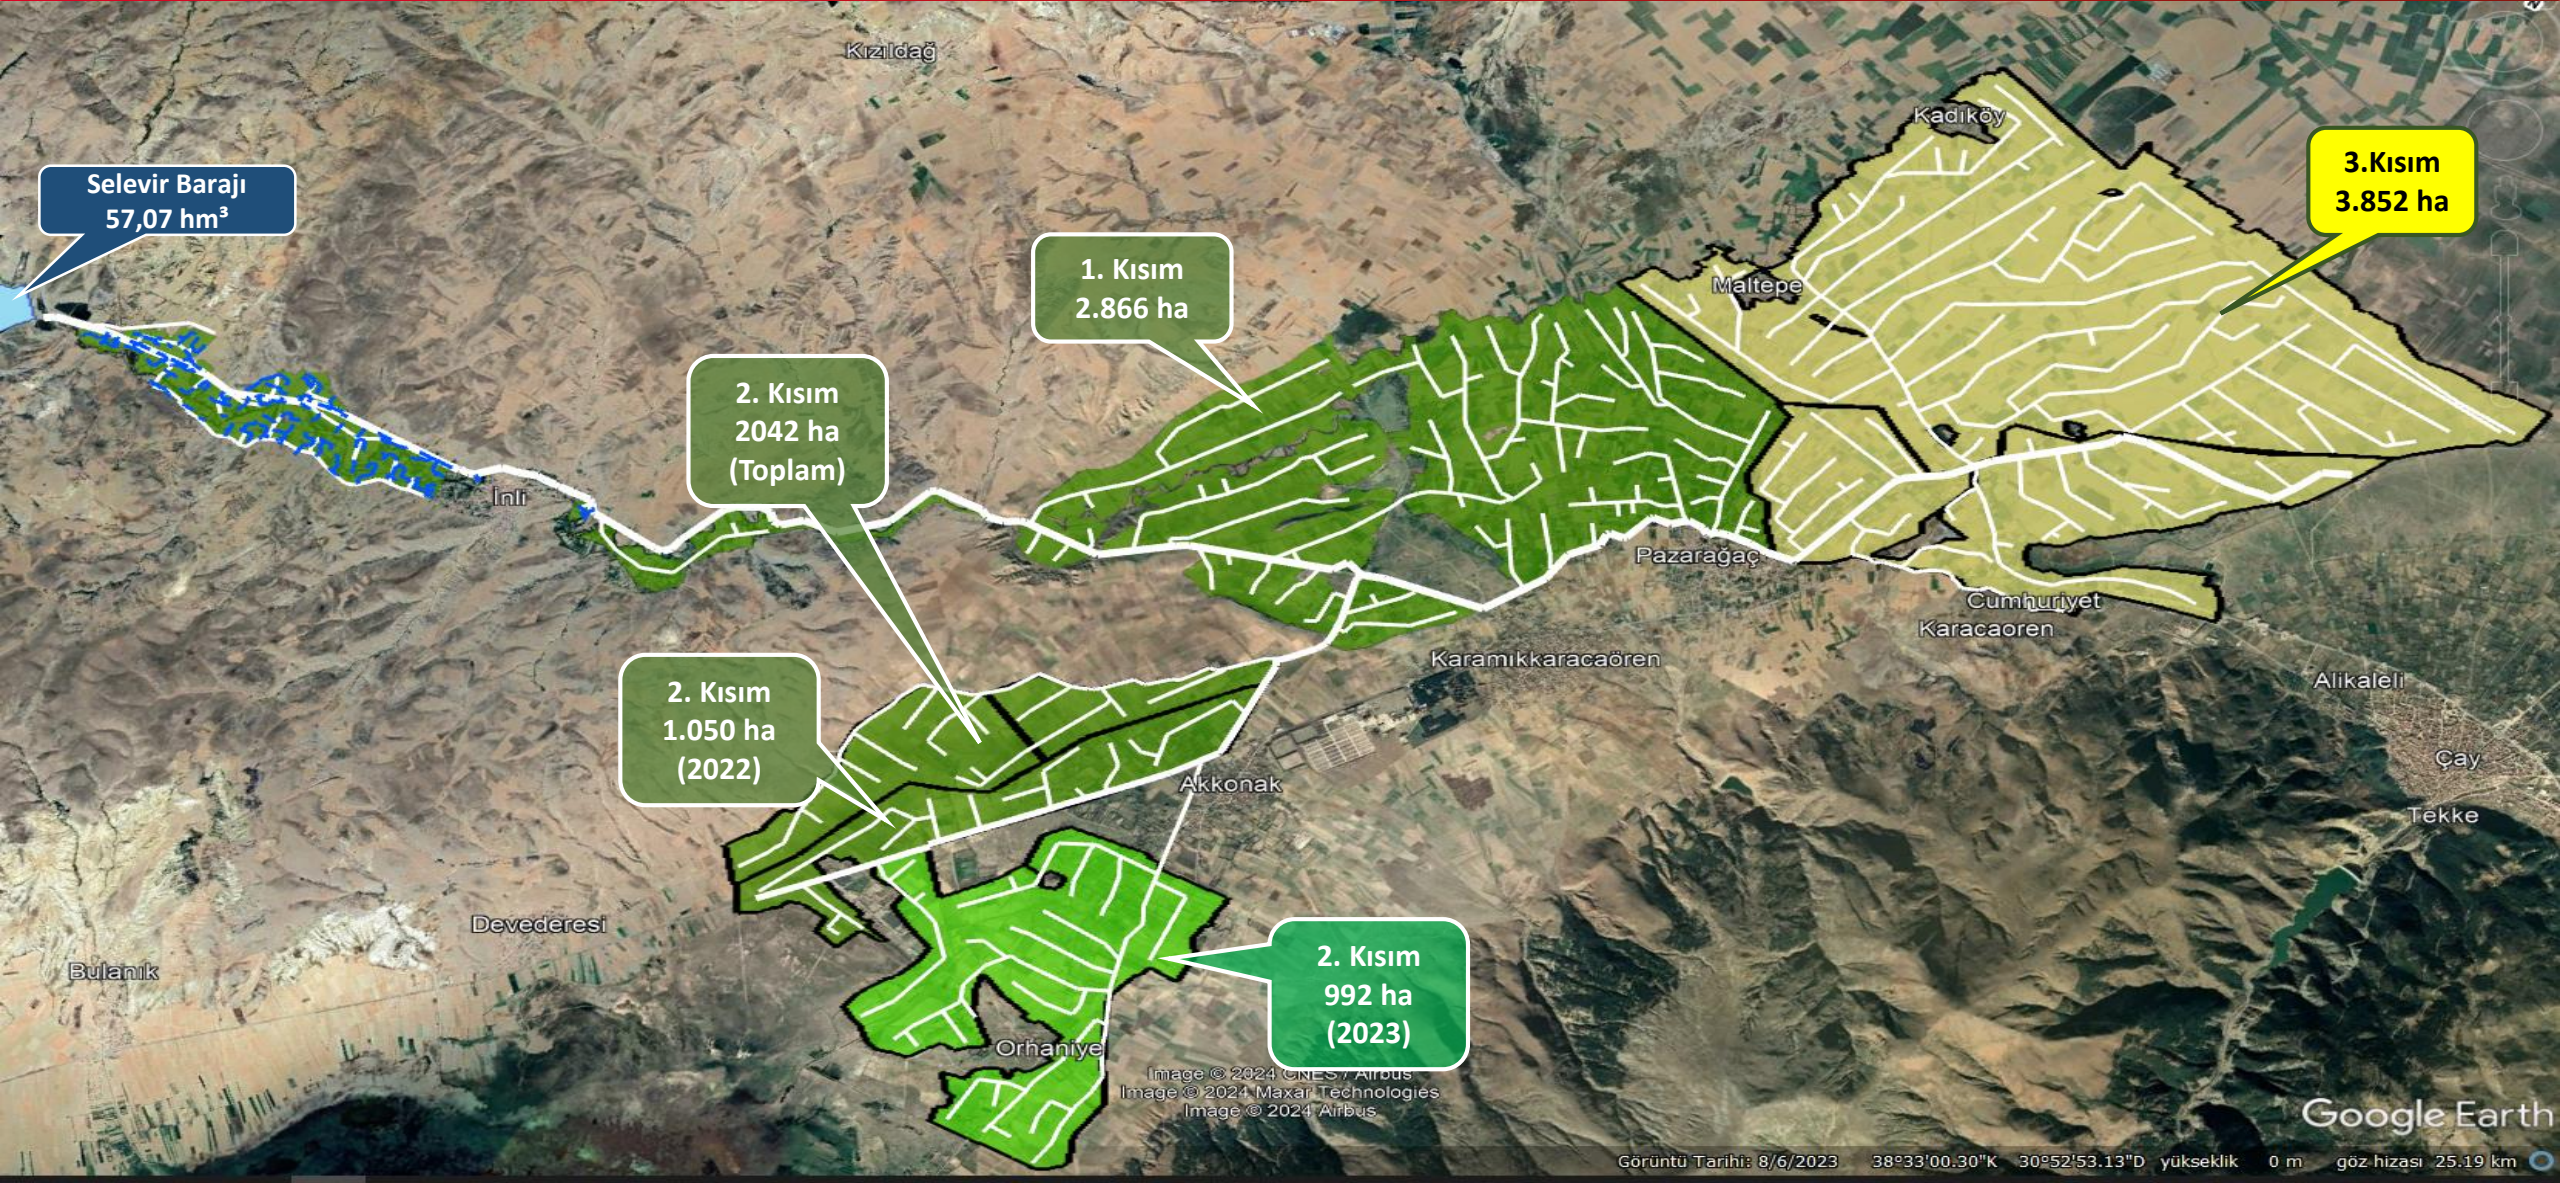



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI

AFYONKARAHİSAR ÇAY SELEVİR SULAMASI YENİLEME



100
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YÜZÜNCÜ YILI

Su Kaynağı Adı: Selevir Barajı		Su Kaynağı Durumu: İşletme	Su kaynağı F.G: %100	Sulama Alanı	2 866 ha
Ana kanal: Borulu	Ana Boru: 30.198 m	Yerleşim Birimi Faydası: 1 ilçe, 3 kasaba, 6 köy		İhale Tarihi	7.02.2017
Cazibe: 2.866 ha	Pompaj: -	Hm: -		Sözleşme Tarihi	14.04.2017
				Sözleşme Bedeli (TL)	37.220.000
				İşe Başlama Tarihi	24.04.2017
				Son İş Bitim Tarihi	18.07.2022
				Yüklenici	ETHAŞ+ENSAR
				2024 Yılı Fiyatlarıyla Maliyet (TL)	724.218.000
				2024 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyeti (TL)	7.872.000
				2024 Yılı Ödeneği (TL)	7.000.000
				2024 Yılı Revize Ödeneği (TL)	5.000.000
				2024 Yılı Harcaması (TL)	-
				Parasal Gerçekleşme (%)	99
				Fiziki Gerçekleşme (%)	100
				İlave Ödenek İhtiyacı	
				Açıklama: İş tamamlanmıştır.	
				2024 yılı öncesi tamamlanan	2024 yılı tamamlanan
2.866 ha	-	-	-		



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI

AFYONKARAHİSAR ÇAY SELEVİR SULAMASI YENİLEME 2. KISIM



100
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YÜZÜNCÜ YILI

Su Kaynağı Adı: Selevir Barajı	Su Kaynağı Durumu: İşletme	Su kaynağı F.G: %100	Sulama Alanı	2 042 ha
Ana kanal: Borulu	Ana Boru: 30.198 m	Yerleşim Birimi Faydası: 1 ilçe, 3 kasaba, 6 köy	İhale Tarihi	24.12.2020
Cazibe: 2.866 ha	Pompaj: -	Hm: -	Sözleşme Tarihi	19.03.2021
			Sözleşme Bedeli (TL)	35.959.000
			İşe Başlama Tarihi	29.03.2021
			Son İş Bitim Tarihi	18.08.2024
			Yüklenici	GÜRSESLİ+ARES
			2024 Yılı Fiyatlarıyla Maliyet (TL)	296.142.000
			2024 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyeti (TL)	13.222.000
			2024 Yılı Ödeneği (TL)	25.000.000
			2024 Yılı Revize Ödeneği (TL)	12.999.000
			2024 Yılı Harcaması (TL)	12.999.000
			Parasal Gerçekleşme (%)	96
			Fiziki Gerçekleşme (%)	100
			İlave Ödenek İhtiyacı	-
			Açıklama: İş tamamlanmıştır.	
			2024 yılı öncesi tamamlanan	2024 yılı tamamlanan
2.042 ha	-	-	-	



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI

AFYONKARAHİSAR ÇAY SELEVİR SULAMASI YENİLEME 3. KISIM



100
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YÜZÜNCÜ YILI

Su Kaynağı Adı: Selevir Barajı	Su Kaynağı Durumu: İşletme	Su kaynağı F.G: %100	Sulama Alanı	3 852 ha
Ana kanal: Borulu	Ana Boru: 30.198 m	Yerleşim Birimi Faydası: 1 ilçe, 3 kasaba, 6 köy	İhale Tarihi	-
Cazibe: 3.852 ha	Pompaj: -	Hm: -	Sözleşme Tarihi	-
			Sözleşme Bedeli (TL)	-
			İşe Başlama Tarihi	-
			Son İş Bitim Tarihi	-
			Yüklenici	-
			2024 Yılı Fiyatlarıyla Maliyet (TL)	1.750.000.000
			2024 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyeti (TL)	1.750.000.000
			2024 Yılı Ödeneği (TL)	-
			2024 Yılı Revize Ödeneği (TL)	-
			2024 Yılı Harcaması (TL)	-
			Parasal Gerçekleşme (%)	-
Fiziki Gerçekleşme (%)	-			
İlave Ödenek İhtiyacı	-			
Açıklama: Aralık ayında ihale edilmesi hedeflenmektedir.				
2024 yılı öncesi tamamlanan	2024 yılı tamamlanan	2024 yılı hedefi (Resmi KPI)	2025 ve sonrası hedefi	
-	-	-	3 852 ha	



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĐI



Bayat Asarcık Sulaması Yenileme Projesi




T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI

BAYAT ASARCIK SULAMASI YENİLEMESİ (1 447 ha)



TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YÜZÜNCÜ YILI

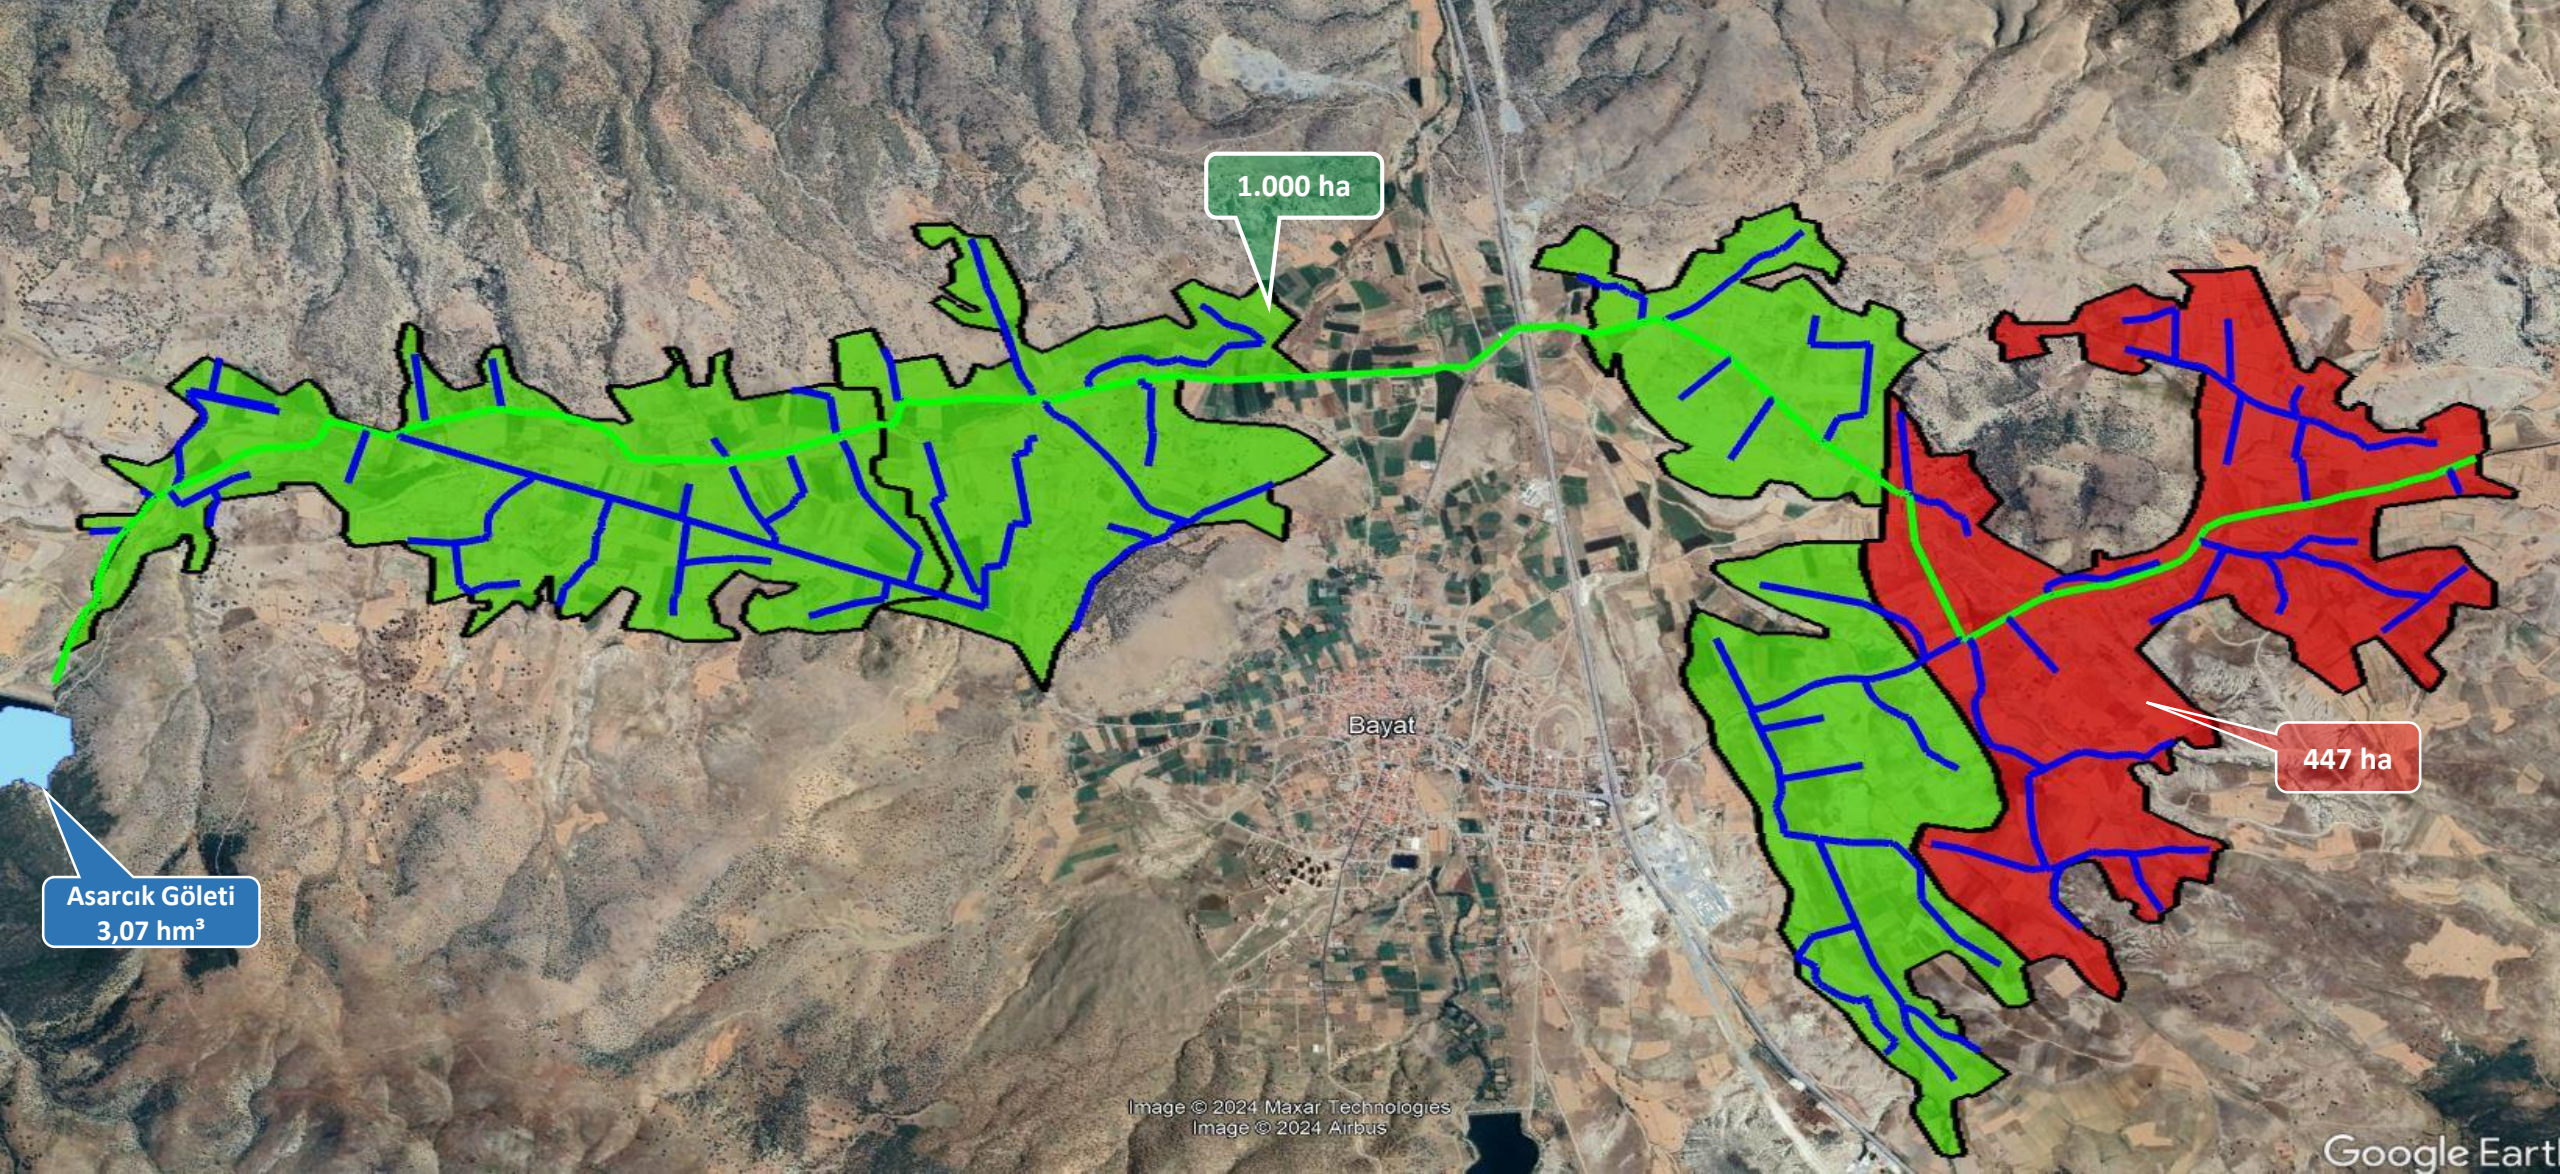



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI

AFYONKARAHİSAR-BAYAT ASARCİK GÖLETİ SULAMASI YENİLEMESİ



Su Kaynağı Adı: Asarcık Göleti		Su Kaynağı Durumu: İşletme	Su kaynağı F.G: %100	Sulama Alanı	1 447 ha
Ana kanal: Borulu	Ana Boru: 15.198 m	Yerleşim Birimi Faydası: 1 ilçe, 1 kasaba		İhale Tarihi	7.12.2017
Cazibe: 1.447 ha	Pompaj: -	Hm: -		Sözleşme Tarihi	28.03.2018
				Sözleşme Bedeli (TL)	10.045.000
				İşe Başlama Tarihi	09.04.2018
				Son İş Bitim Tarihi	18.05.2024
				Yüklenici	ARES İnşaat
				2024 Yılı Fiyatlarıyla Maliyet (TL)	178.238.000
				2024 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyeti (TL)	17.840.000
				2024 Yılı Ödeneği (TL)	15.000.000
				2024 Yılı Revize Ödeneği (TL)	43.150.000
				2024 Yılı Harcaması (TL)	28.132.000
				Parasal Gerçekleşme (%)	93
Fiziki Gerçekleşme (%)	93				
İlave Ödenek İhtiyacı	-				
<p>Açıklama: Yapım işi kapsamında Topplulaştırma proje yapımı çalışmalarında Toprak Etütleri ve Arazi Derecelendirme tamamlandı, blok planı onaylandı. Toplam 9.400 m çelik borunun 9.205 m'si, 50.084 m HDPE borunun 49.580 m'si döşenmiştir. Sanat yapılarının imalatlarına devam edilmekte olup 460 adeti tamamlanmıştır. 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.</p>					
2024 yılı öncesi tamamlanan	2024 yılı tamamlanan	2024 yılı hedefi (Resmi KPI)	2025 ve sonrası hedefi		
1 000 ha	-	447 ha	-		



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĐI



Karakuyu (Dombay) Pompaj Sulaması Yenileme 1. Kısım



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI

KARAKUYU (DOMBAY) POMPAJ SULAMASI YENİLEME 1. KISIM



100
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YÜZÜNCÜ YILI



ELDERE POMPA
İSTASYONU
12,34 Hm³/yıl
2.344 ha

YÜKLEME HAVUZU
M.S.S.=1067.50 m
4.050 m³

Karakuyu
Depolaması

1.200 ha


Image © 2023 CNES / Airbus
Image © 2023 Maxar Technologies
Image © 2023 Airbus



T.C. TARIM VE AFYONKARAHİSAR-DİNAR KARAKUYU (DOMBAY)
ORMAN BAKANLIĞI POMPAJ SULAMASI YENİLEME 1. KISIM



Su Kaynağı Adı: Karakuyu Depolama.		Su Kaynağı Durumu: İşletmede	Su kaynağı F.G: %100
Ana kanal: Borulu	Ana Boru: 15.580m	Yerleşim Birimi Faydası: 8 köy	
Cazibe: -	Pompaj: 3 064 ha	Hm: 59,7 m	

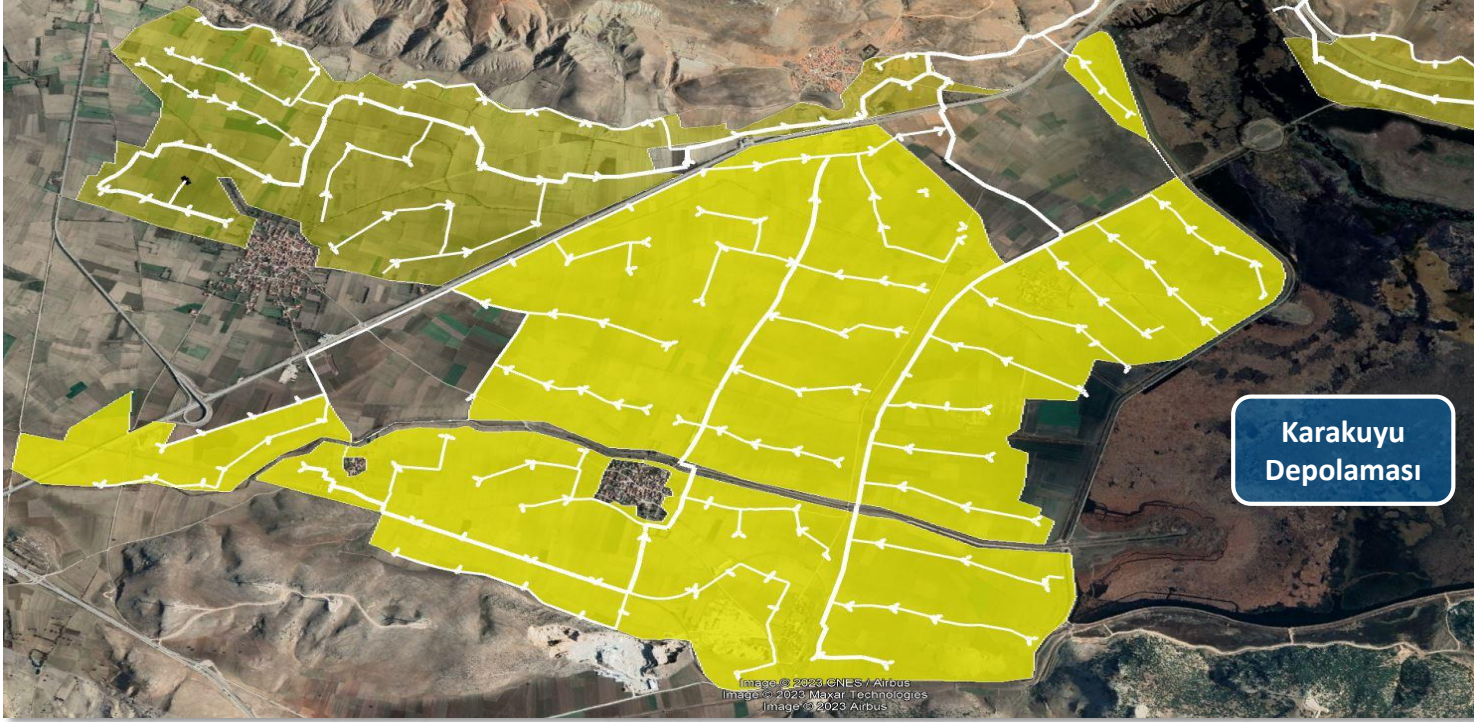

Sulama Alanı	1 200 ha
İhale Tarihi	Aralık 2024
Sözleşme Tarihi	-
Sözleşme Bedeli (TL)	-
İşe Başlama Tarihi	-
Son İş Bitim Tarihi	-
Yüklenici	-
2024 Yılı Fiyatlarıyla Maliyet (TL)	395.000.000
2024 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyeti (TL)	-
2024 Yılı Ödeneği (TL)	-
2024 Yılı Revize Ödeneği (TL)	-
2024 Yılı Harcaması (TL)	-
Parasal Gerçekleşme (%)	-
Fiziki Gerçekleşme (%)	-
İlave Ödenek İhtiyacı	-

Açıklama: 2022 yılında yatırım programına alınan söz konusu işimizde sulama alanının (3.064 ha) bir kısmının (1.200 ha) Dünya Bankası Kredili olarak yapılması planlanmakta olup 2025 Mayıs ayında Genel Müdürlüğümüzce ihale edilmesi hedeflenmektedir.

2024 yılı öncesi tamamlanan	2024 yılı tamamlanan	2024 yılı hedefi (Resmi KPI)	2025 ve sonrası hedefi
-	-	-	1 200 ha



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĐI



TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YÜZÜNCÜ YILI

Afyonkarahisar Arazi Topplulaştırma ve Tigh Projesi



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI

AFYONKARAHİSAR İLİ A.T VE T.İ.G.H PROJELERİ



SIRA NO	PROJE ADI	YERLEŞİM BİRİMİ SAYISI	FAYDASI (HA)	KEŞİF / İHALE BEDELİ	FİZİKİ GERÇ. (%)	NAKDİ GERÇ. (%)	İŞ BİTİM TARİHİ	2024 YILI ÖDENEĞİ
	TOPLAM	27	28 325	84 103 815	-	-	-	25 000 000
1	Afyonkarahisar 2.Kısım AT ve TİGH Projesi	17	16 869	11 039 686	65	53	27.06.2025	10 000 000
2	Afyonkarahisar 3.Kısım AT ve TİGH	10	9 500	62 856 640	6	6	23.10.2026	5 000 000
3	Afyonkarahisar-Bayat Asarcık Topplulaştırma Yolu ve Sanat Yapıları	-	1 956	10 207 489	-	-	29.06.2024	10 000 000



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI

Küçük Su İşleri Projeleri (99 Adet)



TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YÜZÜNCÜ YILI

İŞ ADEDİ	İŞİN ADI	PROJE TUTARI (TL)	2024 YILI ÖDENEĞİ (TL)	YILI HARCAMA (TL)	FAYDA (HA)	NAKDİ GERÇ. (%)	İŞİN DURUMU
99	TOPLAM	7 795 278 000	569 937 000	464 016 000		81	-
48	Taşkın Koruma	1 688 464 000	141 765 000	129 840 000	42 Köy, 5 İlçe Merkezi ve İl Merkezi	92	3 Adet İş Tamamlanmıştır.
1	Geçirgen Tersip Bentleri	54 000 000	1	-	İl Merkezi	-	-
3	Yerüstü Sulamaları	295 532 000	19 282 000	19 038 000	1 204	99	1 Adet İş Tamamlanmıştır.
19	Yeraltısuyu Sulama Şebekeleri	1 007 055 000	136 654 000	102 961 000	3 732	75	1 Adet iş bitti 5 Adet İş devam ediyor.
13	Gölet Sulamaları	723 330 000	103 637 000	79 417 000	2 961	77	5 Adet İş Tamamlanmıştır.
15	Gölet ve Sulamaları	4 026 897 000	168 599 000	132 760 000	3 416	79	1 Adet İş Tamamlanmıştır.



100
TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YÜZÜNCÜ YILI



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

ARZ EDERİM
