



AFYONKARAHİSAR

SPOR YATIRIMLARI

TAMAMLANMAK ÜZERE OLAN YATIRIMLARIMIZ



YÜZME HAVUZU

- BAŞMAKÇI
- ÇOBANLAR
- SİNANPAŞA
- ŞUHUT



TAMAMLANMAK ÜZERE OLAN YATIRIMLARIMIZ




➤ FRİG VADİSİ

- *Atlı Spor Binicilik ve Okçuluk Tesis*
- *Spor Toto Teşkilat Başkanlığından gelen yeni ödenek ile İl Özel İdaresi marifetiyle ihale edilecektir.*



YURT BAKIM ONARIMLARI

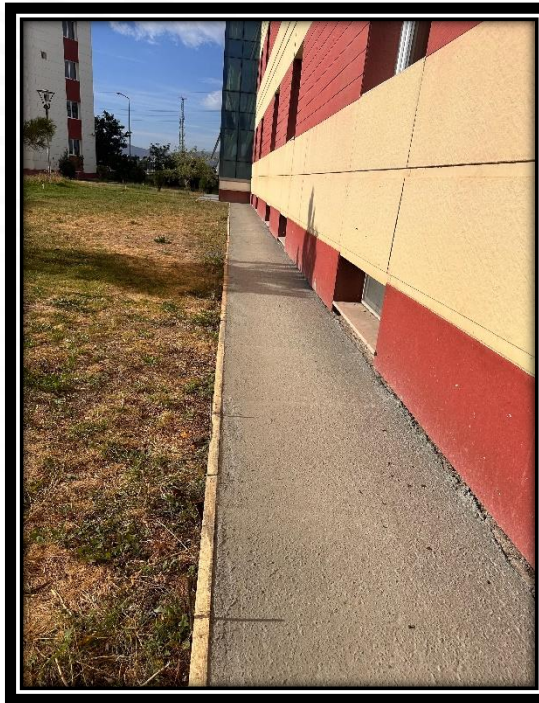

İl Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızda bakım onarım çalışmaları devam etmektedir.



AKÜ GENÇ OFİS



- Afyon Kocatepe Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Atatürk Kongre Merkezinde tahsis edilen alana Genç Ofis Yapımı Devam etmektedir.

YATIRIMLARIMIZ

2021 – 2023 Yılı Spor Yatırımları çerçevesinde Kocatepe Spor Kompleksi içerisinde Spor Lisesi yapımı tamamlanmıştır.



YATIRIMLARIMIZ



SIRA NO	PRJ.S AY.	SEKTÖRÜ	PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ	PROJENİN YERİ	BAŞ.VE BİT.TRH.	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA	2024 ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMASI	NAKDİ GERÇEKLEŞME %	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	AÇIKLAMALAR
1		Eğitim	Spor Lisesi	Merkez	30.12.2020 - 31.12.2023	14.506.717,20 TL	11.360.688,21 TL	3.146.028,99 TL	3.146.028,99 TL	100%	100	Tamamlandı
2		Spor	Çobanlar Kapalı Çelik Konstrüksiyonlu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	Çobanlar	01.11.2022- 29.06.2023	10.469.550,00 TL	1.103.128,69 TL	9.366.421,31 TL	7.800.000,00 TL	95%	90	Devam Ediyor
3		Spor	Sinanpaşa Kapalı Çelik Konstrüksiyonlu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	Sinanpaşa	01.11.2022- 29.06.2023	10.469.550,00 TL	1.178.314,59 TL	9.291.235,41 TL	8.200.000,00 TL	101%	90	Devam Ediyor
4		Spor	Şuhut Kapalı Çelik Konstrüksiyonlu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	Şuhut	01.11.2022- 29.06.2023	10.469.550,00 TL	547.411,60 TL	9.922.138,40 TL	8.650.000,00 TL	93%	90	Devam Ediyor
5		Spor	Başmakçı Kapalı Çelik Konstrüksiyonlu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	Başmakçı	01.11.2022- 29.06.2023	10.469.550,00 TL	437.318,66 TL	10.032.231,34 TL	7.500.000,00 TL	79%	90	Devam Ediyor
6		Spor	Afyonkarahisar İhsaniye Frig Vadisi Rekreasyon Alanı İçerisine Atlı Binicilik Tesisi Yapımı	İhsaniye	11.06.2021- 01.06.2023	17.023.290,85 TL	4.117.020,00 TL	12.906.270,85 TL		50%	50	İl Özel İdaresi tarafından ihale aşamasındadır.
7		Spor	Afyonkarahisar Merkez Kocatepe Spor Kompleksi B Blok Çok Amaçlı Salon İçin Duş-Wc Yapım İşİ	Merkez	01.02.2023- 31.12.2023	590.000,00 TL	0,00	590.000,00 TL	590.000,00 TL	100%	100	Geçici Kabulü Yapıldı.
8		Yurt	Afyon Yurt Müdürlüğü Bakım Onarımı	Merkez	30.04.2024- 31.12.2024	536.017,00 TL	0,00	536.017,00 TL		0%	1	Devam Ediyor
9		Yurt	Bolvadin Erkek Öğrenci Yurdu Bakım Onarımı	Bolvadin	30.04.2024- 31.12.2024	47.563,04 TL	0,00					Proje Aşamasındadır.
10		Yurt	Çay Yurt Müdürlüğü Bakım Onarımı	Çay	30.04.2024- 31.12.2024	576.888,44 TL	0,00					İhale Aşamasındadır.
11		Yurt	Çiğiltepe Yurt Müdürlüğü Bakım Onarımı	Merkez	30.04.2024- 31.12.2024	9.859.112,40 TL	0,00	9.859.112,40 TL	6.452.197,30 TL	65%	99	Devam Ediyor
12		Yurt	Dinar Yurt Müdürlüğü Bakım Onarımı	Dinar	30.04.2024- 31.12.2024	2.589.000,00 TL	0,00	2.589.000,00 TL		0%	0	Devam Ediyor
13		Yurt	Emirdağ Yurt Müdürlüğü Bakım Onarımı	Emirdağ	30.04.2024- 31.12.2024	755.448,76 TL	0,00					İhale Aşamasındadır.
14		Yurt	Prof Dr Remzi Kaya Yurt Müdürlüğü Bakım Onarımı	Merkez	30.04.2024- 31.12.2024	332.871,00 TL	0,00	332.871,00 TL		0%	1	Devam Ediyor
15		Yurt	Şuhut Yurt Müdürlüğü Bakım Onarımı	Şuhut	30.04.2024- 31.12.2024	603.858,00 TL	0,00	603.858,00 TL		0%	95	Devam Ediyor
16		Yurt	Safiye Sultan Yurt Müdürlüğü Bakım Onarımı	Merkez	30.04.2024- 31.12.2024	5.598.887,60 TL	0,00	5.598.887,60 TL	3.664.135,88 TL	65%	99	Devam Ediyor
17		Gençlik Merkezi	AKÜ Genç Ofis Bakım Onarım İşİ	Merkez	06.06.2024- 31.12.2024	1.288.000,00 TL	0,00	1.288.000,00 TL		0%	60	Devam Ediyor
TOPLAM						80.391.137,09	18.743.881,75	76.062.072,30	42.856.333,18			
