



T.C. ULAŖTIRMA VE  
ALTYAPI BAKANLIđI



KARAYOLLARI  
GENEL MÜDÜRLÜđÜ

# AFYONKARAHİSAR İLİ KARAYOLU YATIRIMLARI

Afyonkarahisar

**13.**  
Bölge Müdürlüğü

*Çidemediğin yer senin değildir.*


*Halil Rifat Paşa*

22 EKİM 2024





# AFYONKARAHİSAR İLİ YOL AĞI BİLGİLERİ

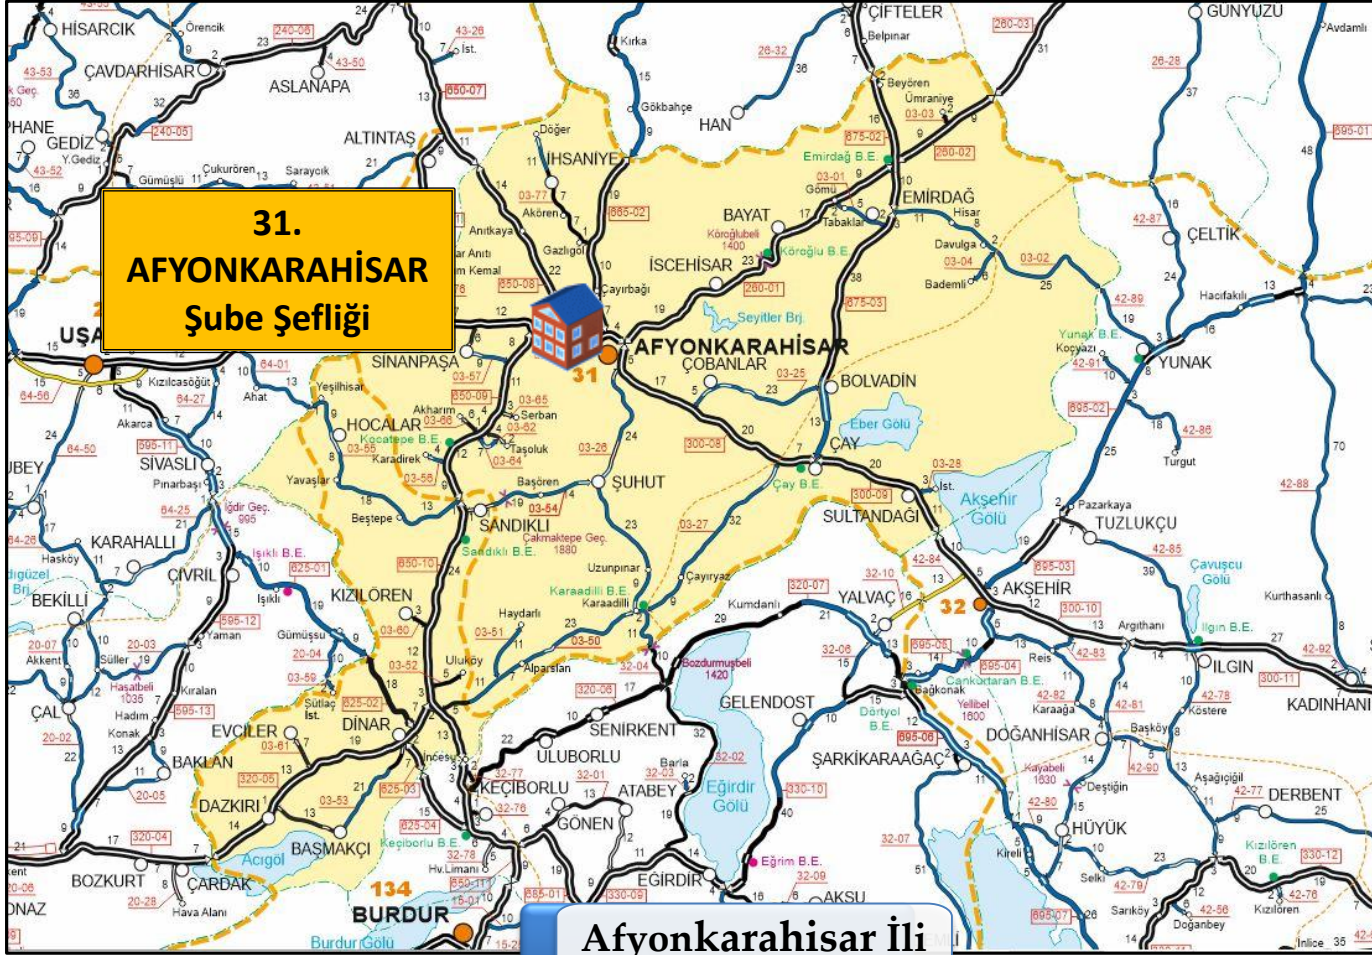

3.Bölge 777 km

13.Bölge 238 km

2.Bölge 2 km

## YOL AĞI


Devlet Yolu  
(%57)

135

İl Yolu  
(%43)

103

## SATIŞ CİNSİ

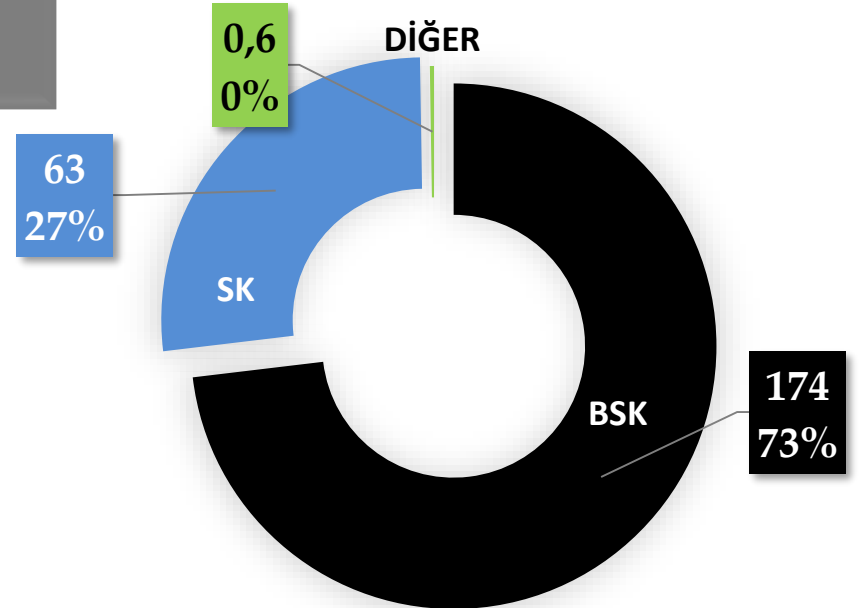



# AFYONKARAHİSAR İLİ YATIRIMLARI

Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluk alanı içerisinde giren Afyonkarahisar ili hudutları dâhilinde **135 km** Devlet Yolu, **103 km** İl Yolu olmak üzere Toplam **238 km** yol ađı bulunmaktadır. Yollarımızın **174 km' si** BSK'lı, **63 km'si** sathi kaplamalı, **1 km'si** parke kaplamalıdır.

Afyonkarahisar ilinde daha önceki yıllardan başlayıp 2002 yılı sonuna kadar (ađ dışı dahil) **11 km BY**, 2003-2024 yılları arasında **118 km BY** olmak üzere toplamda **129 km** bölünmüş yol ađına ulaşılmıştır. İlimizdeki **238 km** uzunluğundaki yol ađı % **54** oranında Bölünmüş Yollardan oluşmaktadır.

## 2024 Yılında Afyonkarahisar İlimizde ;

4,4 Km	Tek Yol(Yol İyileştirme)
10 Km	Asfalt Çalışması(Astarlı Sathi Kaplama Onarım)
500 m <sup>2</sup>	Trafik Düşey İşaretleme,
245.000 m <sup>2</sup>	Trafik Yatay İşaretleme,
13 Km	Otokorkuluk çalışması yapılması hedeflenmektedir.

## 30.09.2024 tarihi itibariyle;

4,4 Km	Tek Yol(Yol İyileştirme)(Sandıklı-Hocalar Yolu)
9,6 Km	Asfalt Çalışması(Astarlı Sathi Kaplama Onarım) (Sandıklı-Hocalar Yolu, Dinar-Başmakçı)
340 m <sup>2</sup>	Trafik Düşey İşaretleme,
185.000 m <sup>2</sup>	Trafik Yatay İşaretleme,
2 Km	Otokorkuluk çalışması tamamlanmıştır.




# YATIRIM İZLEME RAPORU



<b>Toplam Proje Sayısı :</b>	<b>4 Adet</b>
<b>Toplam Proje Tutarı :</b>	<b>503 Milyon TL</b>
<b>Önceki Yılları Harcaması :</b>	<b>104 Milyon TL</b>
<b>Yılı Ödeneđi :</b>	<b>178 Milyon TL</b>
<b>Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama</b>	<b>122 Milyon TL</b>
<b>Kümülatif Parasal Gerçekleşme</b>	<b>% 45</b>



# DEVAM EDEN İŞLER

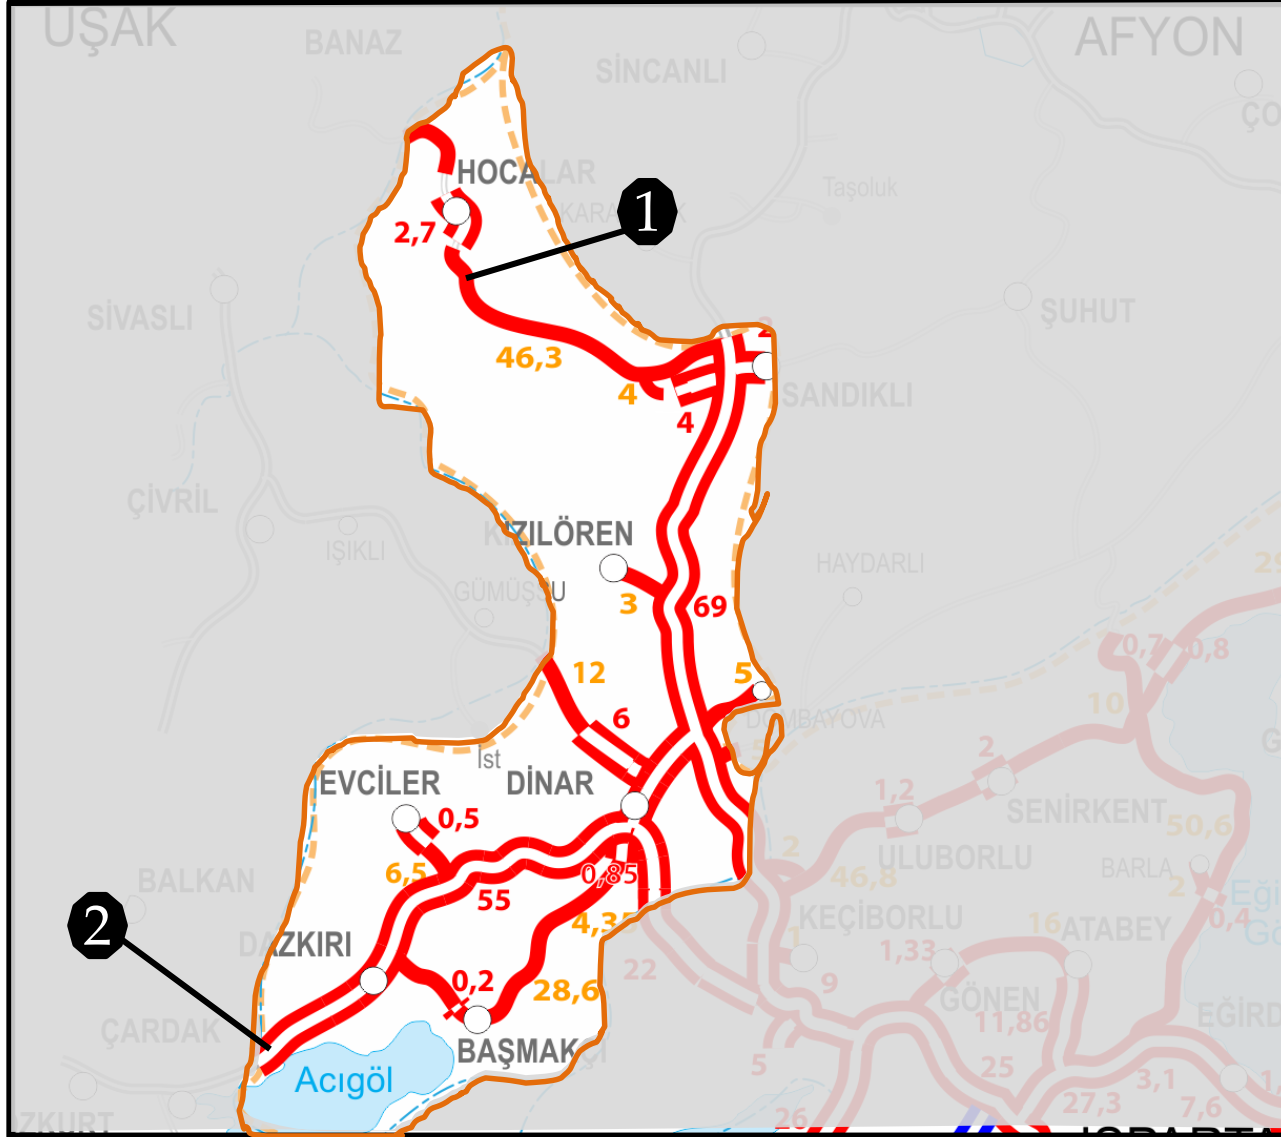

1- SANDIKLI-HOCALAR YAVAŞLAR BARAJI RÖLAKASYON YOLU


2-DİNAR-DAZKIRI-ÇARDAK YOLU HEYELAN ISLAHI

Hizmete Açık Bölünmüş Yollar	
Yapım Çalışmaları Devam Eden Bölünmüş Yollar	
İhale Edilecek Bölünmüş Yollar	
Projesi Devam Eden Bölünmüş Yollar	
Hizmete Açık Tek Yollar	
Yapım Çalışmaları Devam Eden Tek Yollar	
İhale Edilecek Tek Yollar	






# 1-SANDIKLI-HOCALAR YAVAŞLAR BARAJI RELOKASYON YOLU

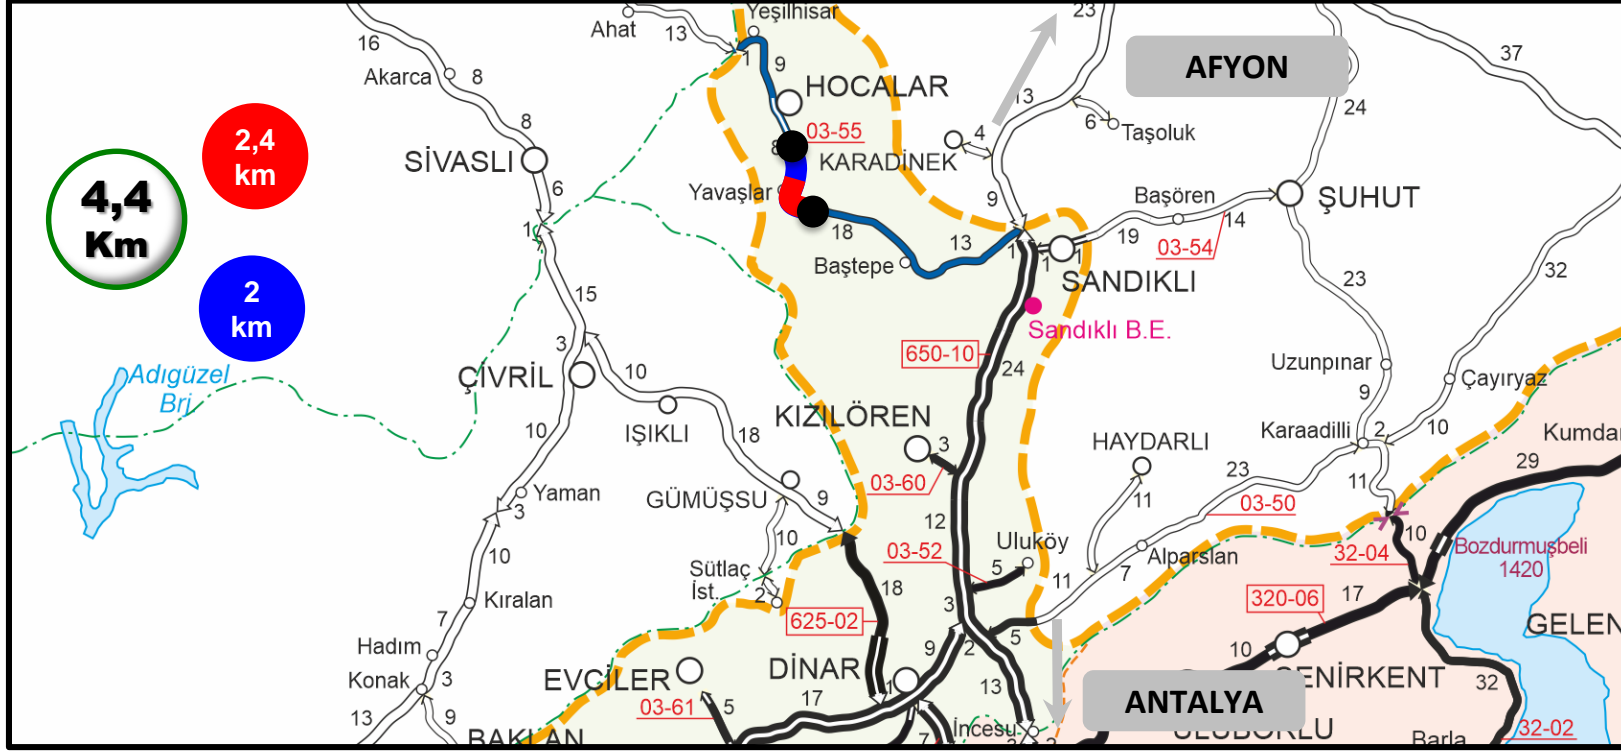

MEVCUT 4,4 km / 3 dk PROJELİ 4,4 km / 3 dk YOĞT 2.284 AĞIR TAŞIT

- ❑ Proje uzunluğu 4,4 km TY/SK'dır.
- ❑ 2024 yılında 4,4 km TY/SK tamamlanmıştır.

## YÜKLENİCİ: AS-YOL

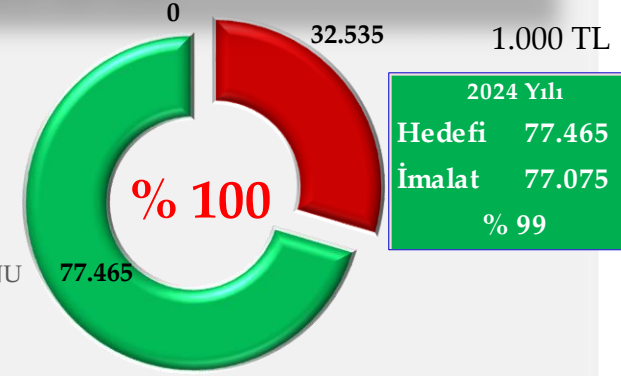

Proje Bedeli (1.000 TL) 110.000 Başlama Bitiş Tarihi 2023 2024

		KAPSAM	BİTEN	2024 HEDEF
BY	AA			
TY	A	4,4 km SK	2,4 km SK	4,4 km SK
Çift Tüp Tünel	DD			
Tek Tüp Tünel	D			
Çift Köprü	YY			
Tek Köprü	Y			
KöprülÜ Kavşak				

2024 HEDEFİ




# 1-SANDIKLI-HOCALAR YAVAŖLAR BARAJI RELOKASYON YOLU







## 2- DİNAR-DAZKIRI-ÇARDAK YOLU HEYELAN ISLAHI

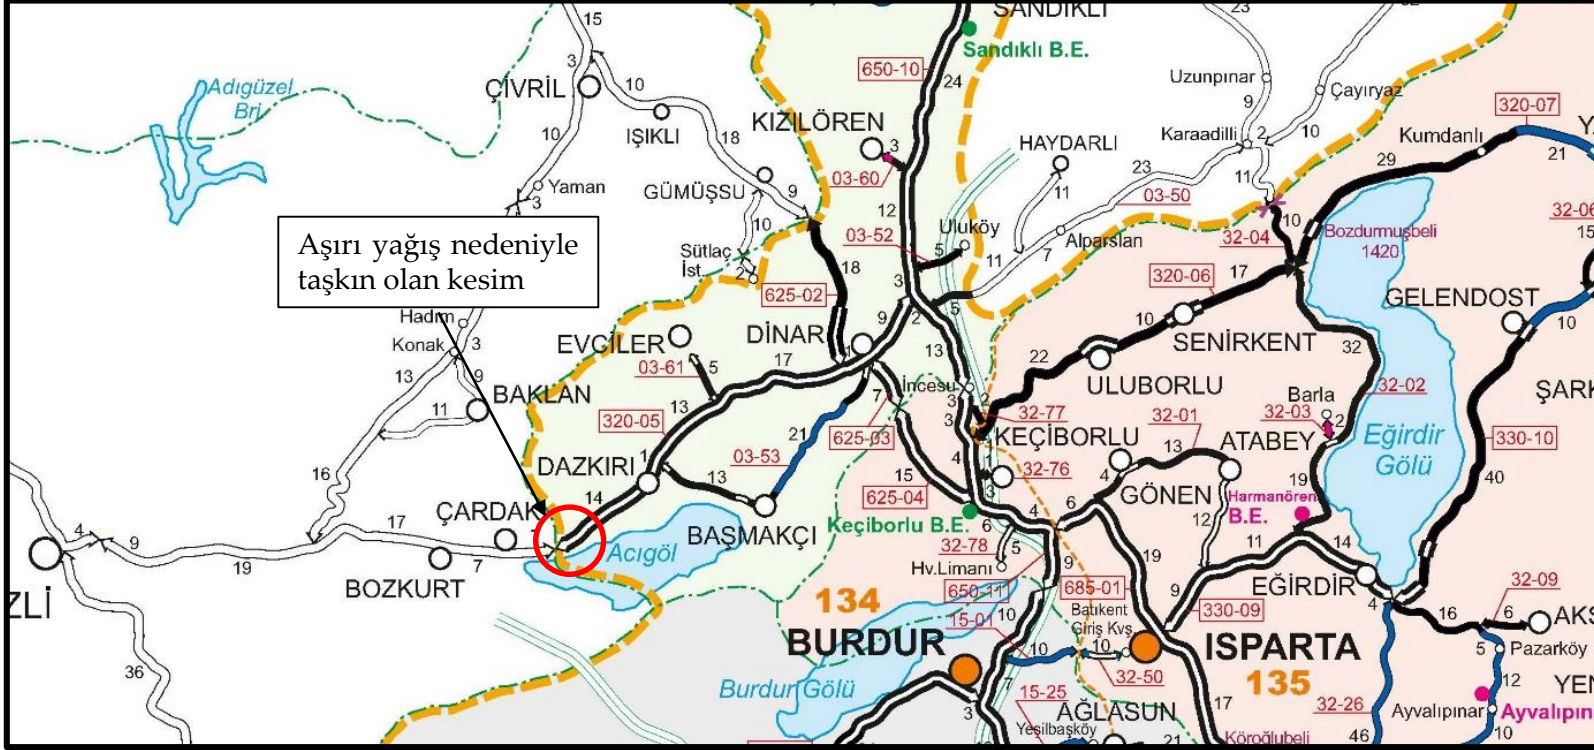

Aşırı yağış nedeniyle  
taşkın olan kesim

YÜKLENİCİ: ONKA

1.000 TL

2024 Yılı  
Hedefi  
İmalat 24.700  
% 0

2023 SONU

2024 YILI

2024 SONRASI



Proje Bedeli  
(1.000 TL)

65.000



Başlama  
Bitiş Tarihi

2024  
2024

		KAPSAM	BİTEN	2024 HEDEFİ
BY	AA			
TY	A			
Çift Tüp Tünel	AA			
Tek Tüp Tünel	A			
Çift Köprü	YY			
Tek Köprü	Y			
KöprülÜ Kavşak				

- 10.05.2024 tarihinde ihalesi yapılmış 29.05.2024 tarihinde çalışmalara başlanmıştır.
- Sahada heyelan etkilerinin tespiti ve ivedilikle giderilmesi amacıyla söz konusu kesimde heyelan ıslah projesi çalışmaları tamamlanmış olup, proje kapsamında, Derivasyon kanalları yapımı, Dere yatağı düzenlemeleri, menfez ve iksa duvarları yapılması planlanmıştır. 5 adet derivasyon kanalında çalışmalar başlatılmıştır.












# 2003-2023 ARASI TAMAMLANAN İŞLER

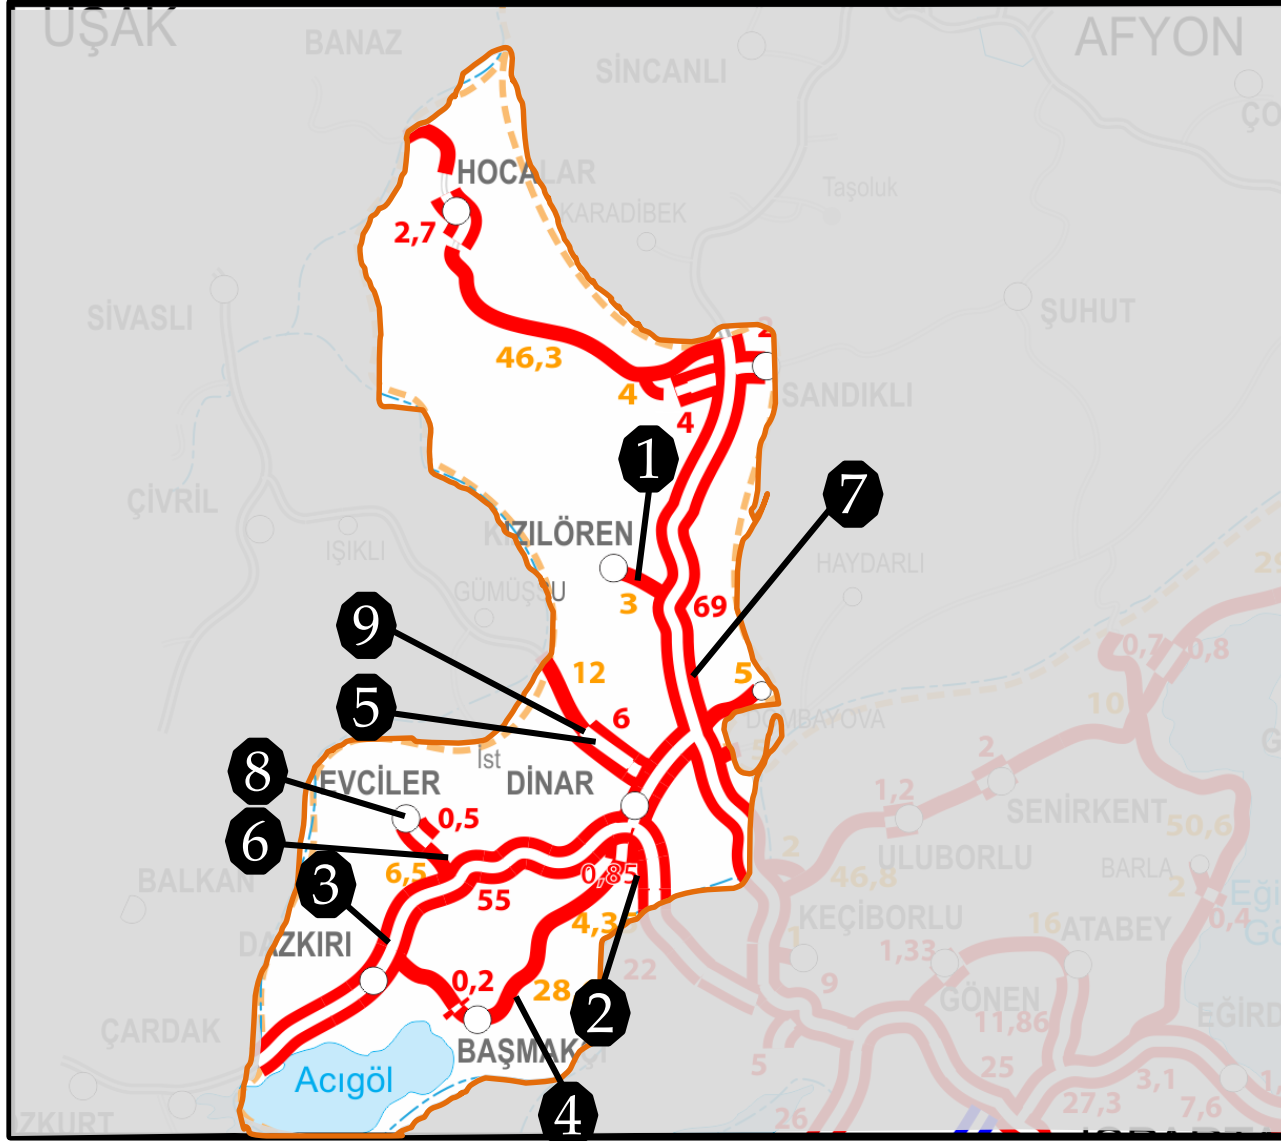

1. (AFYONKARAHİSAR-BURDUR) AYR.-  
KIZILÖREN YOLU (3 KM TY/BSK)

2. KEÇİBORLU-DİNAR YOLU (7 KM BY/BSK)

3. DİNAR-DAZKIRI YOLU (55 KM BY/BSK)

4. DİNAR-BAŞMAKÇI-DAZKIRI YOLU  
(1 KM BY/BSK, 22 KM TY/BSK)

5. DİNAR-ÇİVRİL YOLU  
(5,6 KM BY/BSK, 12,4 KM TY/BSK)

6. DİNAR AYR.-EVCİLER YOLU  
(0,5 KM BY/BSK, 6,5 KM TY/BSK)

7. AFYONKARAHİSAR-ANTALYA YOLU  
(55 KM BY/BSK)

8. EVCİLER DDY ÜST GEÇİT KÖPRÜSÜ

9. DİNAR – ÇİVRİL YOLU DDY ÜST GEÇİT  
KÖPRÜSÜ

Hizmete Açık Bölünmüş Yollar	
Yapım Çalışmaları Devam Eden Bölünmüş Yollar	
İhale Edilecek Bölünmüş Yollar	
Projesi Devam Eden Bölünmüş Yollar	
Hizmete Açık Tek Yollar	
Yapım Çalışmaları Devam Eden Tek Yollar	
İhale Edilecek Tek Yollar	



## 2024 yılında Afyonkarahisar İlinde Ayrıca;

- Yol Bakım-Onarım Hizmetleri için **23,5 Milyon ₺**,
- Trafik GüvenliĐi Hizmetleri için **15 Milyon ₺**,
- DiĐer Harcamalar için **12,4 Milyon ₺**  
olmak üzere Toplam **50,9 Milyon ₺** Harcama YapılmıŖtır.







# 2024 YILI AFYONKARAHİSAR İLİ TRAFİK GÜVENLİĐİ ÇALIŖMALARINI



2024 yılında 30.09.2024 tarihi itibariyle;

- 185.000 m<sup>2</sup> Yatay İŖaretleme,
- 340 m<sup>2</sup> Düşey İŖaretleme
- 2 km Otokorkuluk çalışması yapılmıştır.

Trafik GüvenliĐi Çalışmaları için **15 Milyon TL** harcama yapılmıştır.







# 2024 YILI SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI



AFYON HEDEF SATH.KAP.	K (KM) ÇİFT	K (M <sup>2</sup> ) ÇİFT	KO(KM) ÇİFT	KO (M <sup>2</sup> ) ÇİFT	(KM) TOPLAM	(M <sup>2</sup> ) TOPLAM
	5	55000	5	55000	10	110000

AFYON GERÇEKLEŞEN SATH.KAP.	K (KM) ÇİFT	K (M <sup>2</sup> ) ÇİFT	KO(KM) ÇİFT	KO (M <sup>2</sup> ) ÇİFT	(KM) TOPLAM	(M <sup>2</sup> ) TOPLAM
				9,6	110700	9,6



**ARZ EDERİM**

**Hasan SARIOĞLAN**  
**Bölge Müdürü**

**Organize 2 Köprülü Kavşağı**

**Kuzey Çevre Yolu**
