



T.C. ULAŖTIRMA VE
ALTYAPI BAKANLIĐI




KARAYOLLARI
GENEL MÜDÜRLÜĐÜ

Afyonkarahisar İli 2024 Yılı - 3. Dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısı

3.
Bölge Müdürlüğü

Afyonkarahisar

22 EKİM 2024-AFYONKARAHİSAR

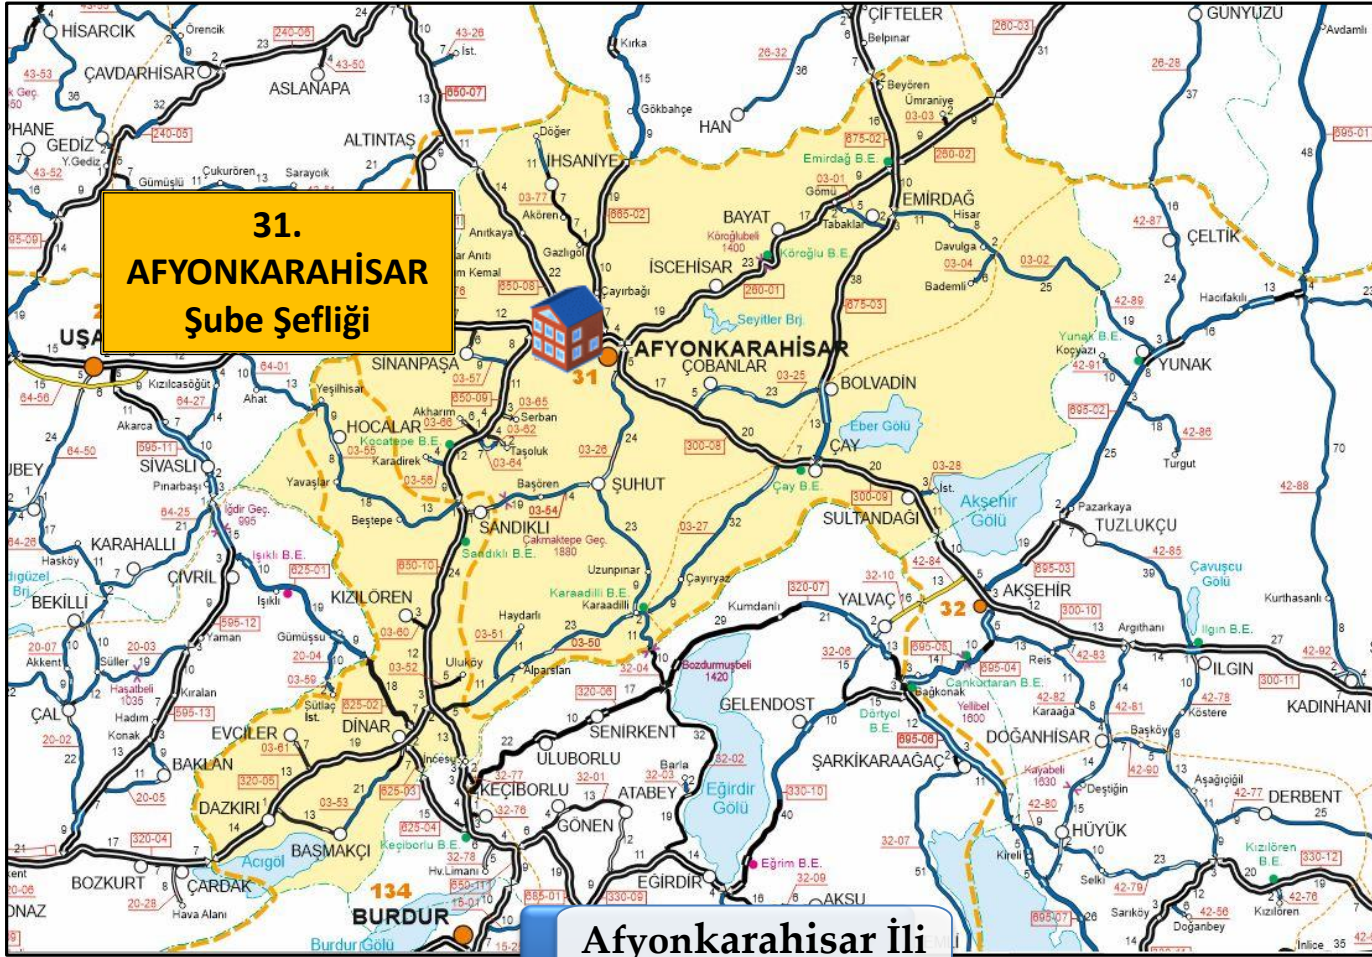

31.
AFYONKARAHİSAR
Şube Şefliği


Afyonkarahisar İli
1.017 km

3.Bölge 777 km


13.Bölge 238 km

2.Bölge 2 km

YOL AĞI (1.017 km)

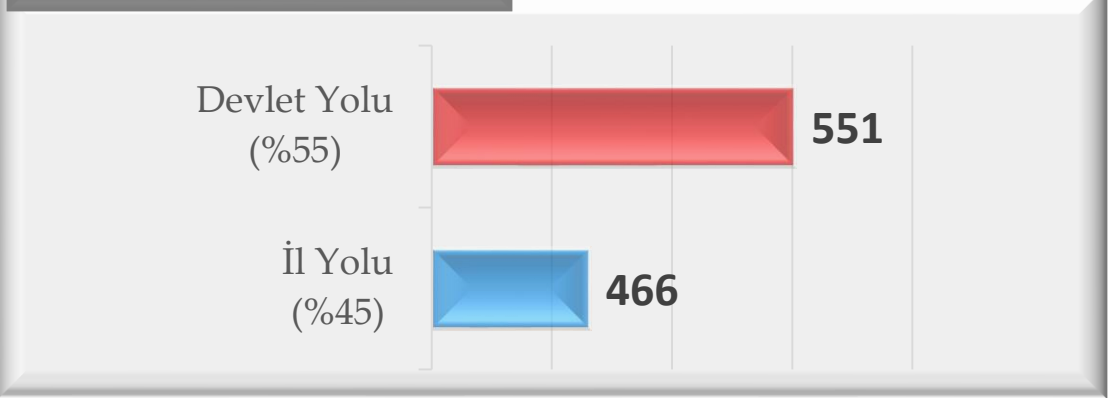

SATIŞ CİNSİ

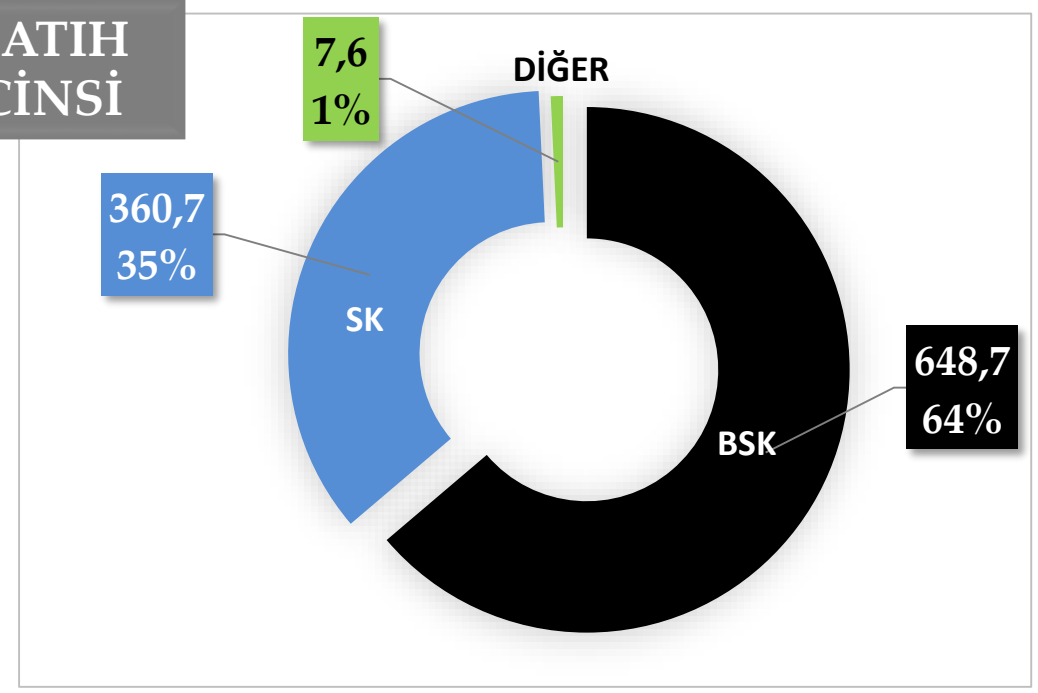

YATIRIM İZLEME RAPORU

Toplam Proje Sayısı	: 9
Biten Proje Sayısı	: 2
Devam Eden Proje Sayısı	: 7
Toplam Proje Tutarı	: 7 Milyar 694 Milyon TL
Önceki Yılların Harcaması	: 4 Milyar 442 Milyon TL
Yılı Ödeneđi	: 514 Milyon 998 Bin TL
Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama	: 395 Milyon 159 Bin TL
Kümülatif Parasal Gerçekleşme	: % 63
Kümülatif Fiziksel Gerçekleme	: % 65




2024 YILINDA ALIŐILAN PROJELER



- ay - Bolvadin-Emirdađ Yolu
- Emirdađ - Davulga-Yunak Yolu
- Afyonkarahisar – UŐak Yolu BSK Onarımı
- Afyonkarahisar – Ŗuhut Yolu



YÜKLENİCİ: KIZILIRMAK (3 İŞ)

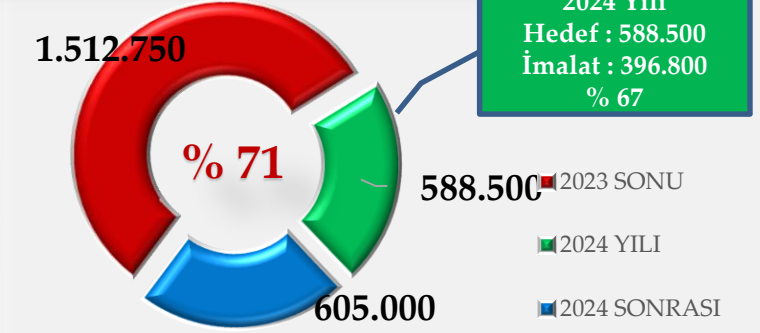

Proje Bedeli
(1.000 TL)

2.706.250



Başlama
Bitiş
Tarihi

2014
2025

		KAPSAM	BİTEN	2024 HEDEF
BY		52,9 km (BSK)	52,9 km (BSK)	3,5 km (BSK)
TY				
Çift Tüp Tünel				
Tek Tüp Tünel				
Çift Köprü		2 adet (2x61 m)	1 adet (1x61 m)	
Tek Köprü				
Köprülü Kavşak				

2024 HEDEFİ

- ❑ Proje kapsamında 52,9 km BY-BSK yapım işi bulunmaktadır.
- ❑ 2023 sonu itibarıyla 49,4 BY-BSK yapımı tamamlanmıştır.
- ❑ 2024 yılında 22 km BY-Aşınma imalatı, 3,5 km BY-BSK ve Km:29+100-29+450 arası heyelan ıslah çalışmalarının tamamlanması hedeflenmiştir.
- ❑ 2024 yılında 7,4 km BY-Aşınma imalatı ve 3,5 km BY-BSK imalatı tamamlanmış olup heyelan ıslahında ve DDY Köprüsünde çalışmalara devam edilmektedir.
- ❑ Projenin 2025 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.



1-ÇAY - BOLVADİN - EMİRDAĞ YOLU







Km: 9+500



Km: 11+100

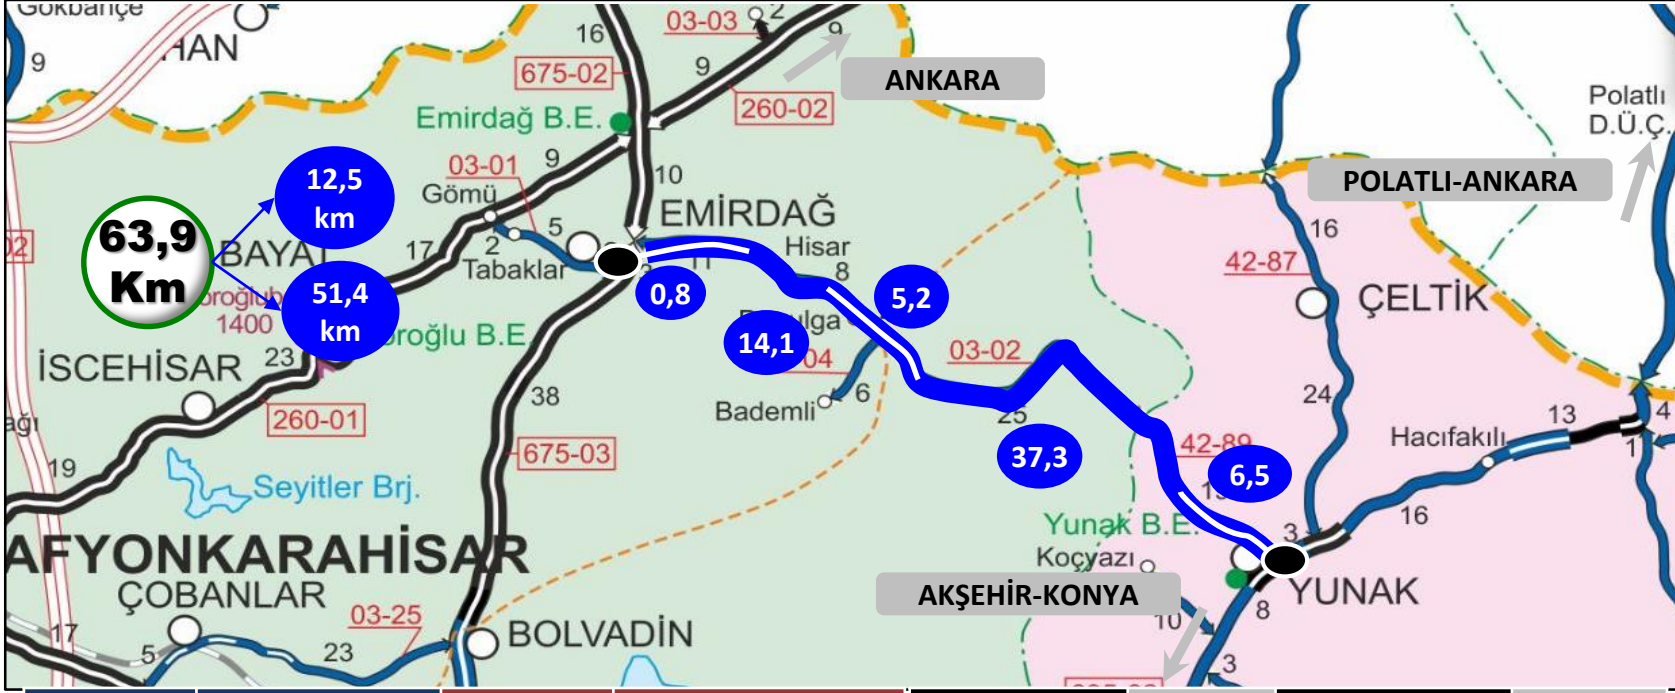

YÜKLENİCİ: AS-YOL+MKBE İNŞ.

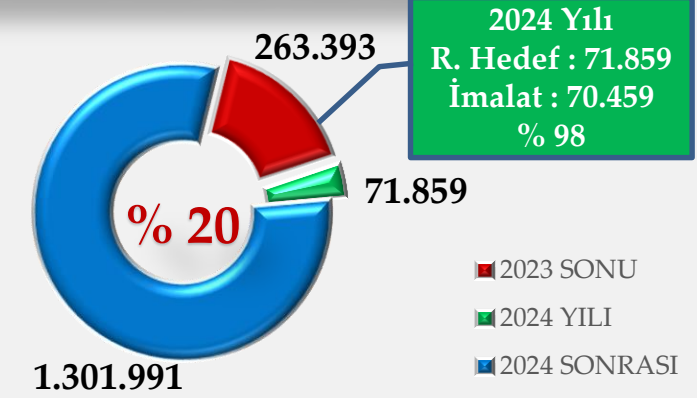

Proje Bedeli (1.000 TL)	1.637.243	Başlama Bitiş Tarihi	2018 2026
----------------------------	-----------	-------------------------	--------------

MEVCUT	67,9 km / 75 dak	PROJELİ	63,9 km / 48 dak	YOGT	1.353	AĞIR TAŞIT	% 10
--------	------------------	---------	------------------	------	-------	------------	------

2024 HEDEFİ

- ❑ Proje bünyesinde 63,9 km BSK kaplamalı yol (12,5 km BY- 51,4 km TY) yer almaktadır.
- ❑ 2023 yılı sonu itibari ile toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılmıştır.
- ❑ 2024 yılında Km:56+500-63+888 arasında toprak işleri seviyesinde çalışmalara devam edilmesi hedeflenmiştir.
- ❑ Projenin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

		KAPSAM	BİTEN	2024 HEDEF
BY	AA	12,5 km (BSK)		
TY	A	51,4 km (BSK)		
Çift Tüp Tünel	AA			
Tek Tüp Tünel	A			
Çift Köprü	YY	2 Adet 2x245m		
Tek Köprü	Y	2 Adet 44 m		
Köprülü Kavşak				

2-EMİRDAĞ - DAVULGA - YUNAK YOLU



2-EMİRDAĐ - DAVULGA - YUNAK YOLU




Emirdađ- Davulga- Yunak Yolu Km: 49+500




Emirdađ- Davulga- Yunak Yolu Km: 55+500

3- AFYONKARAHİSAR – UŞAK BSK ONARIMI

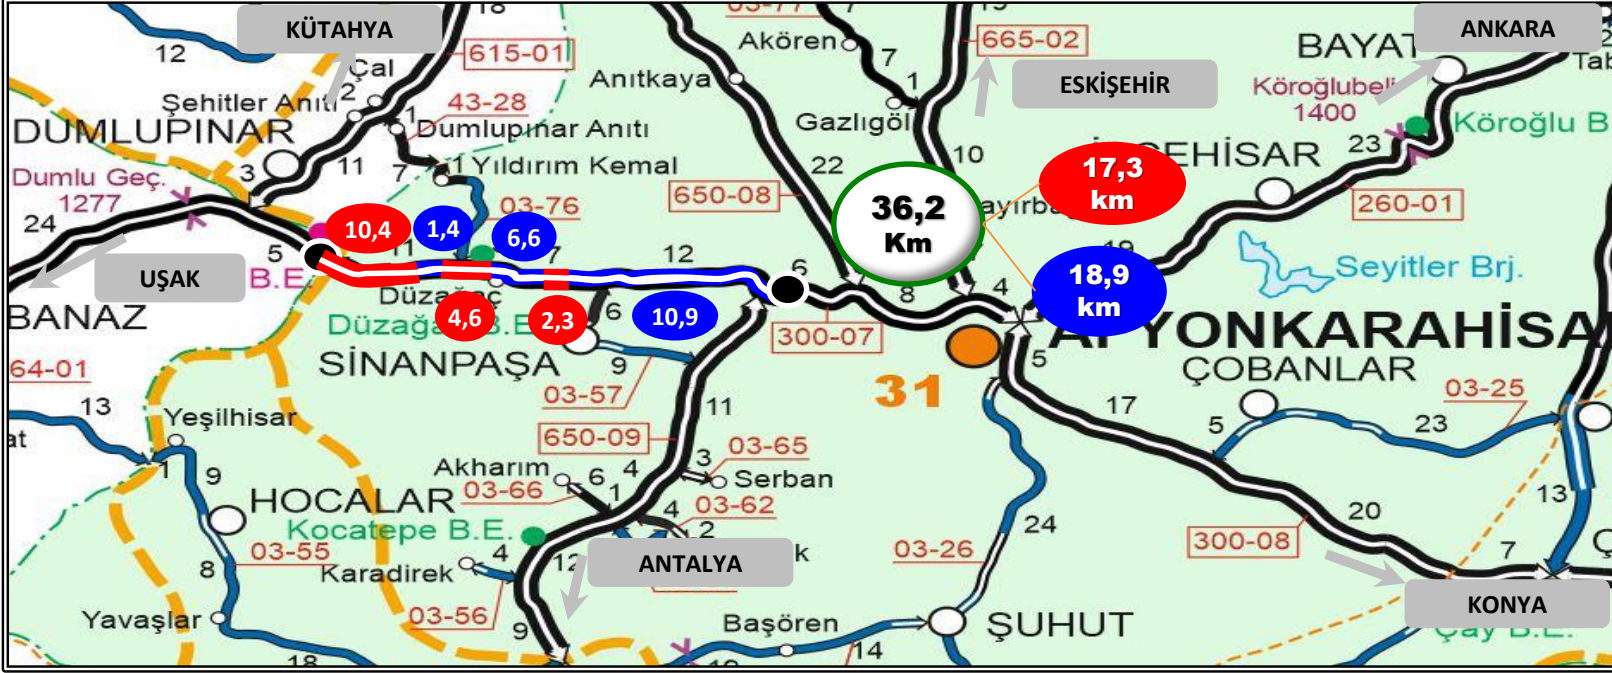

YÜKLENİCİ: ÖZTAŞOĞLU

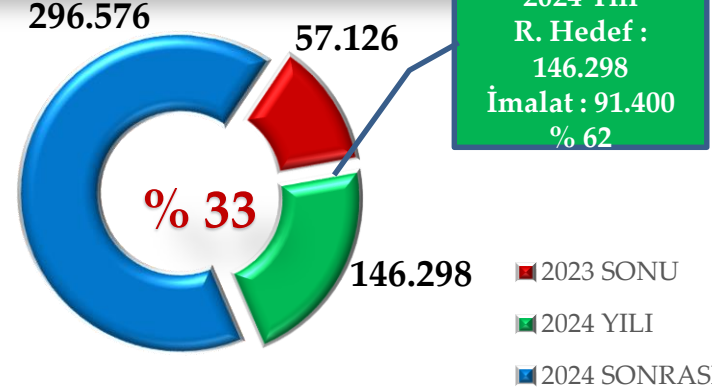


Proje Bedeli (1.000 TL)	450.000	Başlama Bitiş Tarihi	2021 2025
-------------------------	---------	----------------------	--------------

MEVCUT	36,2 km / 20 dak	PROJELİ	36,2 km /20 dak	YOGT	20.189	AĞIR TAŞIT	% 21
--------	------------------	---------	-----------------	------	--------	------------	------

- ❑ Proje kapsamında önceki yıllarda 36,2 km BY-BSK olarak tamamlanan güzergahta, BSK onarım işleri yer almaktadır.
- ❑ 2023 yılı sonu itibariyle 5 km BY-BSK onarımı yapılmıştır.
- ❑ 2024 yılında 12,3 km BY-BSK onarımı tamamlanmıştır. Çalışmalara devam edilmektedir.
- ❑ Projenin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

		KAPSAM	BİTEN	2024 HEDEF
BY	AA	36,2 km (BSK Onarım)	17,3 km (BSK Onarım)	7 km (BSK Onarım)
TY	A			
Çift Tüp Tünel	BB			
Tek Tüp Tünel	B			
Çift Köprü	YY			
Tek Köprü	Y			
Köprülü Kavşak	BB			

3- AFYONKARAHİSAR – UŞAK BSK ONARIMI

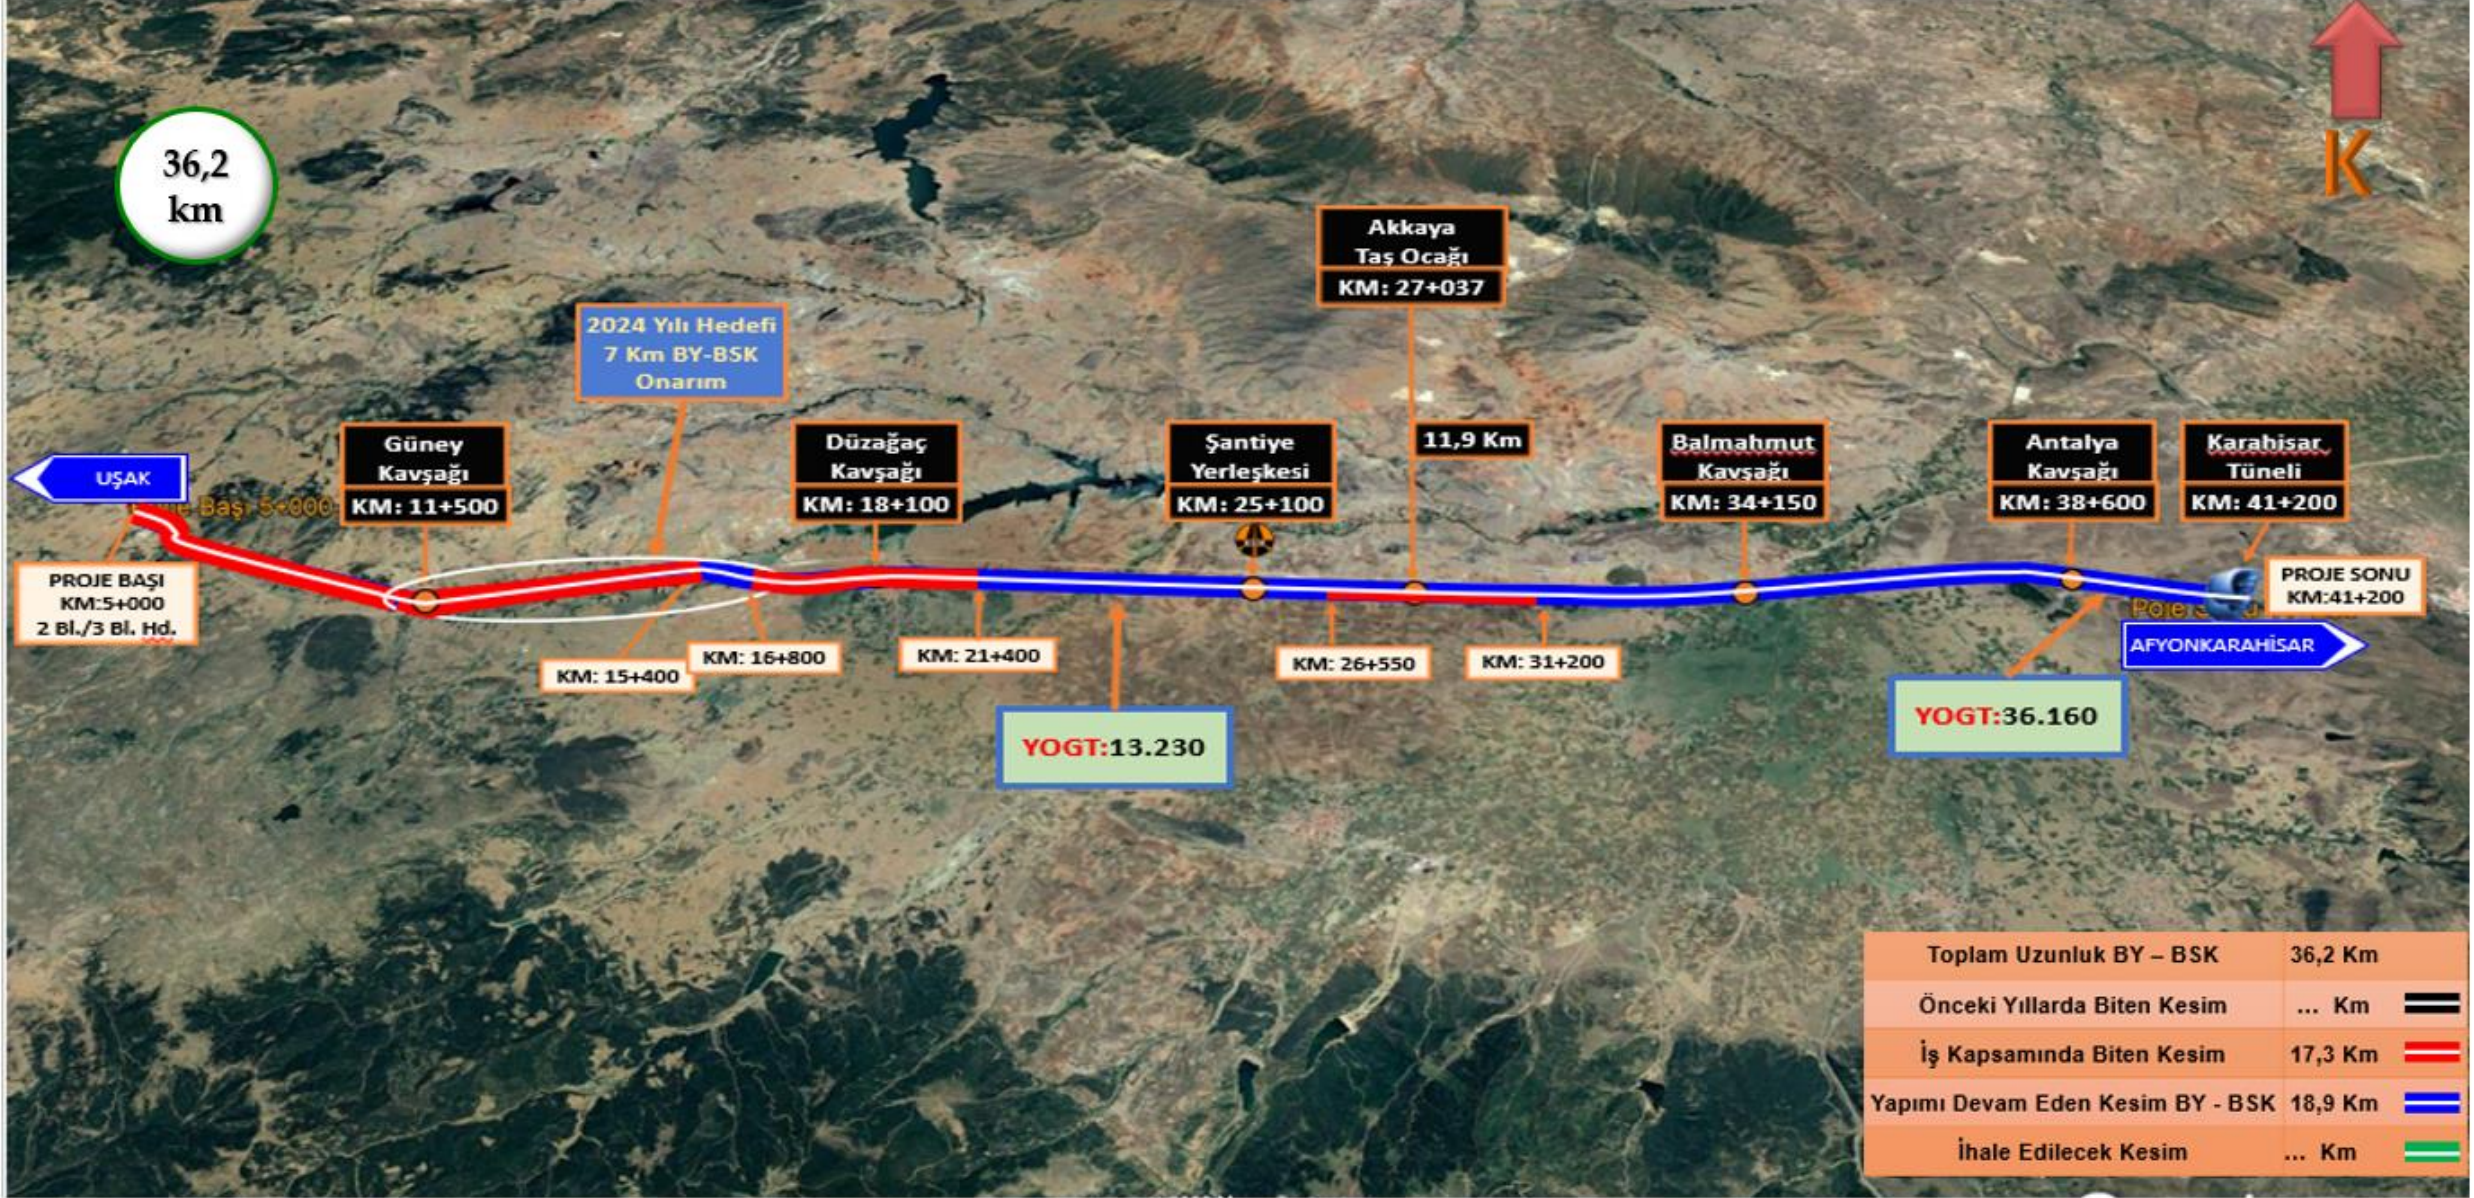




AFYONKARAHİSAR-UŐAK YOLU Km: 21+000 –
21+200



AFYONKARAHİSAR-UŐAK YOLU Km: 18+000 –
18+300

TARİHİ KIRKGÖZ , TARİHİ DEVELİ KIRGÖZ (TAŞKÖPRÜ) KÖPRÜLERİ VE ANTİK YOL-1 UYGULAMA PROJESİ

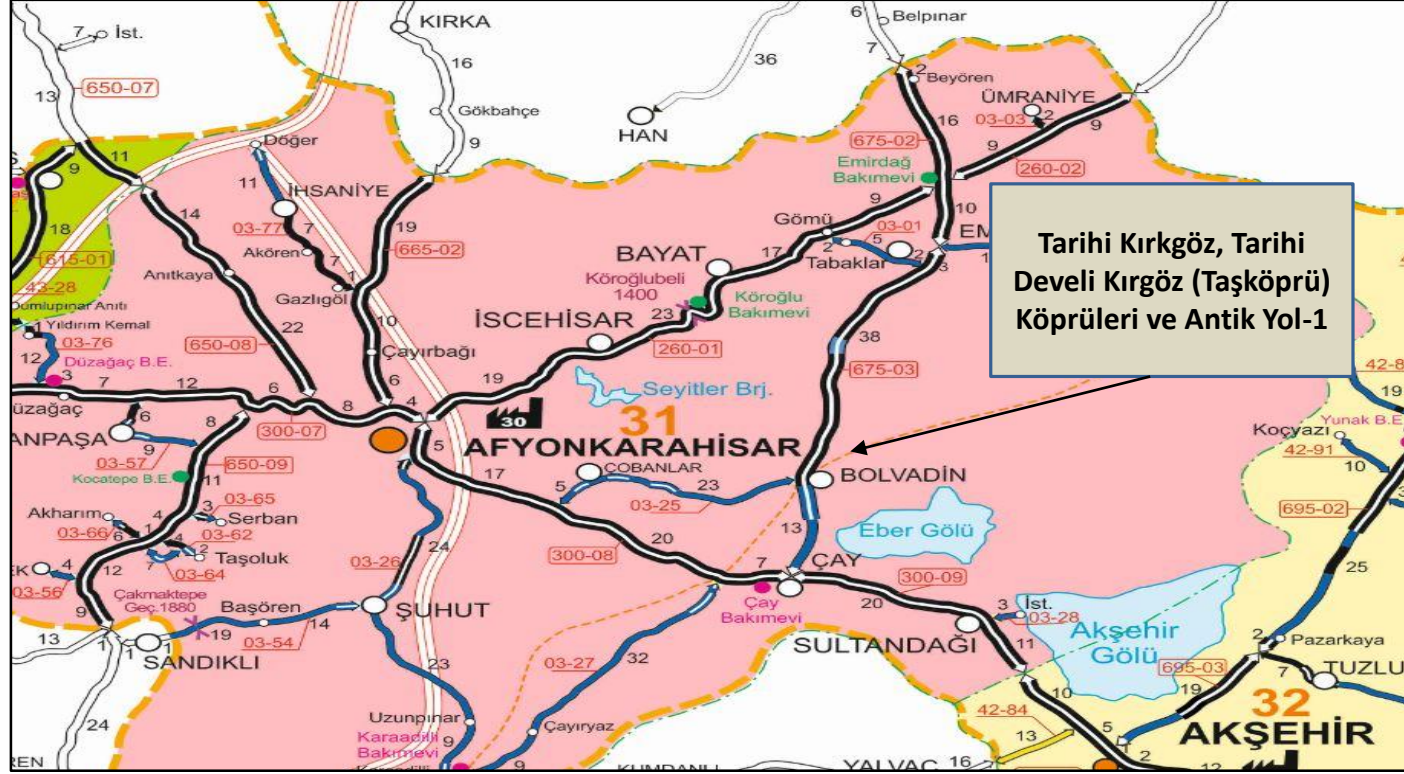

- ❑ Tarihi Kırkgöz, Tarihi Develi Kırğöz (Taşköprü) Köprüleri ve Antik Yol-1'e ait rölöve, restitüsyon, restorasyon (onay tarihi 24.08.2022) ve çevre düzenleme projeleri (onay tarihi 17.10.2022) onaylanmış olup 2024 yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından ihale edilmesi planlanmaktadır. Söz konusu Tarihi köprüler ve antik yol Yatırım Programında bulunmaktadır.

Etüt Proje
Hizmetleri

TARİHİ KIRKGÖZ , TARİHİ DEVELİ KIRGÖZ (TAŞKÖPRÜ) KÖPRÜLERİ VE ANTİK YOL-1 UYGULAMA PROJESİ





SATHİ KAPLAMA VE TRAFİK GÜVENLİĐİ ÇALIŖMALARI

- 2024 yılında **12 km** sathi kaplama yapımı gerekleŖmiŖtir.
- 2024 yılında **16,8 km** otokorkuluk, **14 adet** dūŖey iŖaretleme, **748 km** yatay iŖaretleme ve **5 adet sinyalizasyon** alıŖması gerekleŖmiŖtir.



KARAHİSAR TUNELİ

Afyon-Uşak Yolu Karahisar Tüneli

ARZ EDERİM.

GÖKHAN KÖROĞLU

KARAYOLLARI
3. BÖLGE MÜDÜRÜ

Karahisar Köprülü Kavşağı
