



“Yaşanabilir çevre ve marka şehirler“



YATIRIMCI KURULUŞLAR DÖNEM RAPORU (Bakanlığımız Genel Bütçe Yatırımları)

Dönemi	: 1 OCAK – 31 ARALIK 2024
Yatırımcı Kuruluş	: AFYONKARAHİSAR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Proje Sayısı	: 4 Adet
Projelerin Sektörlere Dağılımı :	Eğitim Sektörü : - Konut Sektörü : - Genel İdare Sektörü : 4 Adet
Toplam Proje Tutarı	: 465.200.000,00.-TL
Önceki Yıllar Harcaması	: 0,00-TL
Yılı Ödeneği	: 138.475.081,81 TL
Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama	: 66,648.157,80.-TL (12 Ad. Arsa Devri)
Parasal Gerçekleşme %	: 44
Fiziki Gerçekleşme %	: 47
Biten Proje Sayısı	: -
Devam Eden Proje Sayısı	: 3
İhale Aşamasındaki Proje Sayısı	: -
Başlamayan Proje Sayısı	: 1
Başlamama Nedenleri	: İhale için Bakanlık Talimatı beklenildiğinden başlanamamıştır.



AFYONKARAHİSAR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 – OCAK-ARALIK (Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan Genel Bütçe Yatırımlarımız)

Sıra No	Sektörün Adı	Projenin Adı	İşin		Revize Proje Maliyet Tutarı (TL)	Önceki Yıllardaki Harcama Miktarı (TL)	2024 Yılı Ödeneği (TL) KDV Dahil	Dönem Sonu Har. Miktar (TL) KDV Dahil	Nakti Gerç. % (Yılı içi)	Fiziki Gerç.%	AÇIKLAMALAR
			Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi							
1	GENEL	Afyonkarahisar Merkez Çocuk Evleri Sitesi Yapım İşi	2024	2026	84.500.000,00	0	25.000.000,00	14.738.166,44	19,92	20	Yapım işi kapsamında çalışmalara devam edilmektedir.
2	GENEL	Afyonkarahisar Merkez Huzurevi Yapım İşi	2024	2026	380.700.000,00	0	67.000.000,00	10.390.610,36	3,52	4	Yapım işi kapsamında çalışmalara devam edilmektedir.
3	GENEL	Afyonkarahisar Dinar Sosyal Hizmet Merkezi Yapım İşi	2024	2024	0	0	0	0	0	0	Ödenek talep edilmiş olup, ihale talimatı beklenilmektedir.
4	GENEL	Afyonkarahisar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi	2023	2025	46.475.081,81 (Arsa karşılığı)	-	46.475.081,81	41.519.381,00 Arsa Devri (12 Ad/14 Ad)	89 (Arsa Devri)	92	I. Kısım Yapım İşi çalışmaları tamamlanmış olup, II. Kısım Yapım İşi çalışmaları devam etmektedir.

Bakanlığımız Yatırım Programında (etüt-proje-inşaat) **4 adet** işimiz mevcut olup, toplam proje bedeli **465.200.000,00.-TL** dir.

BAKANLIK GENEL BÜTÇE YATIRIMLARI



Müdürlüğümüz Proje ve Yapım İşleri Şube Müdürlüğünün görev alanı kapsamında;

2024 Yılı Bakanlığımız Yatırım Programında (inşaat) 4 adet işimiz mevcut olup söz konusu işlerin toplam proje bedeli **465.200.000,00.-TL dir.**

Bakanlığımız yatırım programında bulunan;

1- Afyonkarahisar Merkez Çocuk Evleri Sitesi Yapım İşi: Yapım işi kapsamında çalışmalara devam edilmektedir.

2- Afyonkarahisar Merkez Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşi: Yapım işi kapsamında çalışmalara devam edilmektedir.

3- Afyonkarahisar Dinar Sosyal Hizmet Merkezi Yapım İşi: Ödenek talep edilmiş olup, ihale talimatı beklenilmektedir.

4- Afyonkarahisar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi: I. Kısım Yapım İşi çalışmaları tamamlanmış olup, II. Kısım Yapım İşi çalışmaları devam etmektedir.



AFYONKARAHİSAR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPIM İŞİ

Yeni hizmet binası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi (Pazarlık Usulü) ihale yöntemi ile arsa karşılığında eski hizmet binasının bulunduğu Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Osmangazi Mahallesinde bulunan 925 ada 1 parsel numaralı 13.053,14 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde yapılmaktadır.



BAKANLIK GENEL BÜTÇE YATIRIMLARI



AFYONKARAHİSAR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPIM İŞİ

Yüklenici: SARE İŞ ORTAKLIĞI (BAŞYAPI & İNKOSA)

İhale Tarihi: 22.12.2022

Sözleşme Tarihi: 25.01.2023

1.Kısım (Hizmet Binası Kısımı) Yer Teslim Tarihi: 01.02.2023

1.Kısım Geçici Kabul Onay Tarihi: 02.09.2024

Hizmet Binası Yapı Kullanma İzin Tarihi: 13.09.2024

2. Kısım (Otopark ve Peyzaj) Yer Teslim Tarihi : 24.09.2024

2. Kısım İmalatları ve İşin Bitim Tarihi : 22.03.2025

Toplam inşaat alanı 5,600 m² olup, B+Z+3 kattan oluşan hizmet binası, nizamiye binası, sosyal faaliyet alanı, çevre düzenlemesi, sıfır atık üniteleri, yağmur suyu depolama sistemi, 17 resmi ve 100 araçlık misafir araç otoparkı, 6 adet araç şarj istasyonu, 10 kW kapasiteli güneş enerji sistemi uygulamalarını içermektedir.

Jet-2 yöntemi ile 60cm çapında, 14m yükseklikte 325 adet jetgrout kolonu ile zemin iyileştirme yapılmıştır.

Son durum itibariyle, işin 2. kısım imalatları kapsamında otopark alanı ve peyzaj düzenlemesi yapılmaktadır.





AFYONKARAHİSAR MERKEZ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YAPIM İŞİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında «Açık İhale Usulü» ile ihalesi gerçekleştirilmiş olup, eski huzurevi binasının bulunduğu Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Hasan Karaağaç Mahallesinde bulunan 5035 ada 8 parsel numaralı 20.133,21 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde yapılmaktadır.



BAKANLIK GENEL BÜTÇE YATIRIMLARI



AFYONKARAHİSAR MERKEZ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YAPIM İŞİ

Yüklenici : Sayın Prefabrik İnşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş. + Afyon Betosan İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı

İhale Tarihi : 02.05.2024

Sözleşme Tarihi : 19.07.2024

Yer Teslim Tarihi : 24.07.2024

İşin Bitim Tarihi : 01.10.2026



Toplam inşaat alanı 12.789,60 m² olup, B+Z+3 kattan oluşan bina 98 oda ve 164 yatak kapasitesine sahiptir. Bina bünyesinde fizik tedavi merkezi, sinema, tiyatro, bayramlaşma, konferans ve dinleti aktivitelerinin yapılabileceği çok amaçlı salon, hobi odaları ve huzurevi sakinlerine yönelik fiziksel aktivite gerçekleştirilmesine imkân verecek şekilde boççe salonu bulunmaktadır.

Son durum itibariyle, alanda bulunan yükseltinin kaldırılmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.



AFYONKARAHİSAR MERKEZ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ YAPIM İŞİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında «Açık İhale Usulü» ile ihalesi gerçekleştirilmiş olup, Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Ertuğrul Gazi Mahallesinde bulunan 3299 ada 2 ve 3 parsel numaralı 10.216,76 m² yüzölçümlü taşınmazların üzerinde yapılmaktadır.



BAKANLIK GENEL BÜTÇE YATIRIMLARI



AFYONKARAHİSAR MERKEZ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ YAPIM İŞİ

Yüklenici : Ömer Bilge

İhale Tarihi : 09.07.2024

Sözleşme Tarihi : 14.08.2024

Yer Teslim Tarihi : 21.08.2024

İşin Bitim Tarihi : 19.09.2026



Toplam inşaat alanı 2.650,89 m² olup, 50 kişi kapasitelidir. Kompleks bünyesinde idari bina, 2 adet ikiz blok yaşam birimi, tek katlı yaşam birimi, sosyal faaliyet binası, spor ve oyun alanları ile etkinlik alanları bulunmaktadır.

Son durum itibariyle, blokların subasman imalatları ve çevre duvarı imalatları tamamlanmıştır.



YAPI YAKLAŞIK MALİYETİ HESABI

Pratik hesaplama esas olmak üzere yağma ve karkas yapılar için yapı birim alanına isabet eden yaklaşık metraj birim ölçüleri aşağıdadır.

	İMALAT CİNSİ	YIĞMA BINA		BETONARME KARKAS BINA	
1	Betonarme Beton	0,250	m ³ /m ²	0,380	m ³ /m ²
2	Betonarme Demiri	22	kg/m ²	34	kg/m ²
3	Kalıp	1,75	m ³ /m ²	2,60	m ³ /m ²
4	Kalıp iskelesi	1,90	m ³ /m ²	2,80	m ³ /m ²
5	İş iskelesi	1,43	m ² /m ²	1,43	m ² /m ²
6	Tuğla Duvar	0,200	m ³ /m ²	0,150	m ³ /m ²
7	İç Sıva	2,40	m ² /m ²	2,40	m ² /m ²
8	Dış Sıva	1,30	m ² /m ²	1,30	m ² /m ²
9	Tavan Sıvası	0,90	m ² /m ²	0,90	m ² /m ²
10	Badana (iç)	3,00	m ² /m ²	3,00	m ² /m ²
11	Fayans – seramik	0,30	m ² /m ²	0,30	m ² /m ²
12	Ahşap yapı + karkas	0,15	m ² /m ²	0,15	m ² /m ²
13	Ahşap Pencere	0,12	m ² /m ²	0,12	m ² /m ²
14	Yağlı Boya	0,42	m ² /m ²	0,42	m ² /m ²
15	Ahşap çatı, kiremit örtü (Toplam İnş. Alanı Üzerinden)				
	Tek kat	1,25	m ² / m ²	1,25	m ² / m ²
	İki kat	0,63	m ² / m ²	0,63	m ² / m ²
	Üç kat	0,42	m ² / m ²	0,42	m ² / m ²
	Dört kat	0,33	m ² / m ²	0,33	m ² / m ²
	Beş kat	0,25	m ² / m ²	0,25	m ² / m ²
16	Metal örtü (Toplam İnşaat alanı üzerinden)				
	Tek kat	1,33	m ² / m ²	1,33	m ² / m ²
	İki kat	0,67	m ² / m ²	0,67	m ² / m ²
	Üç kat	0,44	m ² / m ²	0,44	m ² / m ²
	Dört kat	0,34	m ² / m ²	0,34	m ² / m ²
	Beş kat	0,27	m ² / m ²	0,27	m ² / m ²
17	Mozaik Döşeme Kaplaması	0,90	m ² / m ²	0,90	m ² / m ²
18	Cam	0,10	m ² / m ²	0,10	m ² / m ²

Örnek olarak

Toplam alanı Betonarme karkas ve konut olan 1 500 m² bir binanın metraj olarak hesaplanması gerekiyor ise;
Betonarme Beton = 0,380 x 1 500 = 570 m³
Betonarme Demiri = 0,034 x 1 500 = 51 ton
Betonarme Kalıbı = 2,60 x 1 500 = 2 600 m²
Tuğla Duvarı = 0,150 x 1 500 = 150 m³

Proje den metraj çıkarılması esas olmak üzere yaklaşık pratik kabuller:

Tesviye Tabakası Alanı = Mozaik döşeme kaplaması Alanı 1 m³ beton = 7-8 m² kalıp
Blokaj Alanı = Grobeton Alanı = Mozaik Alanı Demirli beton hacmine = 70-90 kg demir
Kiremit Alanı = Ahşap Çatı Alanı Pencere doğrama alanının = %75-80 normal düz cam
Tavan Sıvası = Tavan Kireç Badana Tüm Demirin = %40-45 ince
Çatı yalıtım alanı Kapı kanal alanının = % 25'i buzluk cam

C) Hazineye ait taşınmazların üzerinde yapılan, Hazineye intikal eden, yerinde korunması mümkün olan ve İdarece değerlendirilmesine ihtiyaç duyulan her türlü yapı ve tesislerin asgari levazım bedelinin hesaplanması kapsamında 2024 yılı içerisinde **9 adet** taşınmaz üzerinde yer alan yapı ve tesislerin “**Asgari Levazım Bedel Hesabı**” ile **14 adet** taşınmaz üzerinde yer alan yapı ve tesislerin “**Yapı Yaklaşık Maliyet Hesabı**” yapılarak ilgili Milli Emlak Birimine iletilmiştir.

İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde **4 adet** yeni kamu binasına ait “**Ödenek Teminine Esas Tahmini Bedel Hesabı-EK4 Belgesi**” hazırlanarak ilgili kuruma iletilmiştir.

DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BÜTÇE YATIRIMLARI



Ayrıca ;

2024 yılı içerisinde, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yatırımları kapsamında ilgili kuruluşun talebi üzerine toplam **16** adet işin denetim kontrollük hizmetleri Müdürlüğümüzden görevlendirilen teknik elamanlarca gerçekleştirilerek **15** adet işin geçici kabul işlemleri tamamlanmış olup, **1** adet işe ilişkin çalışmalara devam edilmektedir. Söz konusu işlerin toplam sözleşme bedeli **19.285.619,90.-TL**'dir. Ayrıca, bahse konu işler kapsamında önceki yıllarda geçici kabulü yapılan **6** adet işin kesin kabul işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Valiliğimize bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının (İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hariç) 2024 yılı yatırım programında yer alan işlere ilişkin ilgili kurumun talebi üzerine Müdürlüğümüz teknik elamanlarınca gerekli incelemeler gerçekleştirilerek ödeneğe esas **40 Adet Keşif Özeti**, ihaleye esas **20 Adet Yaklaşık Maliyet** tanzim edilmiş ve ilgili kurumlara gönderilmiştir.

Kamu Yapılarının Deprem Performans Analizi çalışmaları kapsamında çeşitli kurumlardan gelen talepler doğrultusunda toplam **4** adet binaya ait deprem tahkiki hizmet alımı ihalesine esas teknik şartname ve yaklaşık maliyet belgeleri hazırlanması iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir.

DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BÜTÇE YATIRIMLARI



4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNLARI UYARINCA 2024 YILINDA YAPILAN İŞLER

Denetim ve Kontrollüğü Yapılan İşler	: 16 Adet
Geçici Kabulü Yapılan İşler	: 15 Adet
Devam Eden İşler	: 1 Adet
İlgili Kurumların talebine istinaden; Ödenek Teminine esas Keşif Özeti	: 40 Adet
İlgili Kurumların talebine istinaden; Yaklaşık Maliyet	: 20 Adet



DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BÜTÇE YATIRIMLARI



DENETİM VE KONTROLLUĞU MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN İŞLER LİSTESİ

Sıra No	KURUMU-SEKTÖRÜN ADI	İŞİN ADI	SÖZLEŞME TARİHİ	TEKLİF (İhale) BEDELİ (TL)	FİZİKİ GER. %	NAKDİ GER. %	AÇIKLAMALAR
1	ÇAY KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	ÇAY HÜKÜMET KONAĞI HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ	05.12.2023	255.000,00.-TL	100	100	MUAYENE VE KABULÜ YAPILDI.
2	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞUHUT 1 NOLU ASM ZEMİN ETÜT İŞİ	14.07.2023	270.000,00.-TL	100	100	GEÇİCİ KABUL YAPILDI.
3	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	DİNAR HAYDARLI DEV.HAS.TADİLAT EV ONARIM İŞİ	13.09.2024	1.958.000,00.-TL	100	100	GEÇİCİ KABUL YAPILDI.
4	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEVLET HAS. A BLOK 9 ADET ASANSÖRÜN YENİLENMESİ İŞİ	24.09.2024	12.225.000,00.-TL	40	20	ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.
5	AFYONKARAHİSAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI	ADLİYE BİNASI YANGIN KAPISI YAPIM İŞİ	24.04.2024	347.460,00.-TL	100	100	GEÇİCİ KABUL YAPILDI.
6	AFYONKARAHİSAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI	ADLİYE BİNASI 8.CEZA VE 5.ASLİYE MAHK.SALONU OLUŞTURULMASI YAPIM İŞİ	01.08.2024	604.000,00.-TL	100	100	GEÇİCİ KABUL YAPILDI
7	AFYONKARAHİSAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI	KADIN AÇIK CEZA İNFAZ KUR. ATÖLYE BİNASI ZEMİN ETÜT İŞİ	18.04.2024	97.500,00.-TL	100	100	GEÇİCİ KABUL YAPILDI.
8	EMİRDAĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI	ADLİYE BİNASI LAMİNAT PARKE VE PENCERELERİNE SİNEKLİK YAPIM İŞİ	27.11.2024	105.903,00.-TL	100	100	MUAYENE VE KABULÜ YAPILDI.
9	EMİRDAĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI	ADLİYE BİNASI ASANSÖR REVİZYONU İŞİ	19.11.2024	76.697,00.-TL	100	100	MUAYENE VE KABULÜ YAPILDI.
10	ÇAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI	ADLİYE BİNASI WC VE LAVOBO TADİLAT VE ONARIM İŞİ	28.10.2024	206.000,00.-TL	100	100	MUAYENE VE KABULÜ YAPILDI.

Müdürlüğümüzce yürütülen söz konusu **16** adet işin toplam sözleşme bedeli **19.285.619,90.-TL.**'dir.

DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BÜTÇE YATIRIMLARI



DENETİM VE KONTROLLUĞU MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN İŞLER LİSTESİ

Sıra No	KURUMU-SEKTÖRÜN ADI	İŞİN ADI	SÖZLEŞME TARİHİ	TEKLİF (İhale) BEDELİ (TL)	FİZİKİ GER. %	NAKDİ GER. %	AÇIKLAMALAR
11	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ	ÇAY MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ HİZ.BİN.ONARIM İŞİ	03.05.2024	200.500,00.-TL	100	100	GEÇİCİ KABUL YAPILDI.
12	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ	İSCEHİSAR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ HİZ.BİN.ONARIM İŞİ	17.07.2024	118.069,90.-TL	100	100	GEÇİCİ KABUL YAPILDI.
13	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	SİNANPAŞA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜD.HİZ.BİN.KAZAN DAİRESİ ONARIM İŞİ	08.07.2024	206.000,00.-TL	100	100	GEÇİCİ KABUL YAPILDI.
14	HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI	058 GM NOLU GÜVENLİK HİZ.BİN.ONARIM İŞİ	27.05.2024	988.000,00.-TL	100	100	GEÇİCİ KABUL YAPILDI.
15	HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI	95 GM NOLU ER KOĞUŞLARI BİN.GENEL ONARIM İŞİ	27.05.2024	548.990,00.-TL	100	100	GEÇİCİ KABUL YAPILDI.
16	HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI	UÇUŞ HATTI KAPLAMALI SAHALAR ONARIM İŞİ	02.08.2024	1.078.500,00.-TL	100	100	GEÇİCİ KABUL YAPILDI.

Müdürlüğümüzce yürütülen söz konusu **16** adet işin toplam sözleşme bedeli **19.285.619,90.-TL.**'dir.

DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BÜTÇE YATIRIMLARI



KONTROLLÜK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DİĞER KAMU KURUMLARI BÜTÇE YATIRIMLARI

BAKANLIK GENEL BÜTÇE YATIRIMLARI DIŞINDA MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE DİĞER KURUMLARA KONTROLLÜK HİZMETLERİNDE DE DESTEK VERİLMEKTEDİR.

2024 YILI İÇERİSİNDE 6.672.019,90.-TL SÖZLEŞME BEDELİNE SAHİP TOPLAM 12 ADET İŞİN KONTROLLÜK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TEKNİK PERSONELİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.



KANO MERKEZİ 2021



ÇAY KAYMAKAMI LOJMANI 2023



DEVLET HASTANESİ EK BİNASI 2022



DİĞER KAMU KURUMLARI BÜTÇE YATIRIMLARI



YAPI KOOPERATİFLERİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPI KOOPERATİFLERİNİN ;

-KURULUŞ,

-ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ,

-GENEL KURULLARA BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÖREVLENDİRİLMESİ,

İŞ VE İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.

İLİMİZ YAPI KOOPERATİFLERİ SAYISI

Toplam Yapı : 137
Kooperatifleri Sayısı

Konut Yapı : 114
Kooperatifleri Sayısı Faal:49
Tasfiye:62
Münfesi:3


Toplu İşyeri Yapı : 12
Kooperatifleri Sayısı Faal:5
Tasfiye:7

Küçük Sanayi Sitesi Yapı : 11
Kooperatifleri Sayısı Faal:8
Tasfiye:3

2024 Yılında Genel Konut Yapı Koop : 69
Kurul Yapan Kooperatif Küçük Sanayi Site Yapı
Sayısı Koop: 8
Toplu İşyeri Yapı Koop: 8



DİĞER KAMU KURUMLARINCA KURULAN ÇEŞİTLİ KOMİSYONLARA DESTEK VERİLMEKTEDİR.

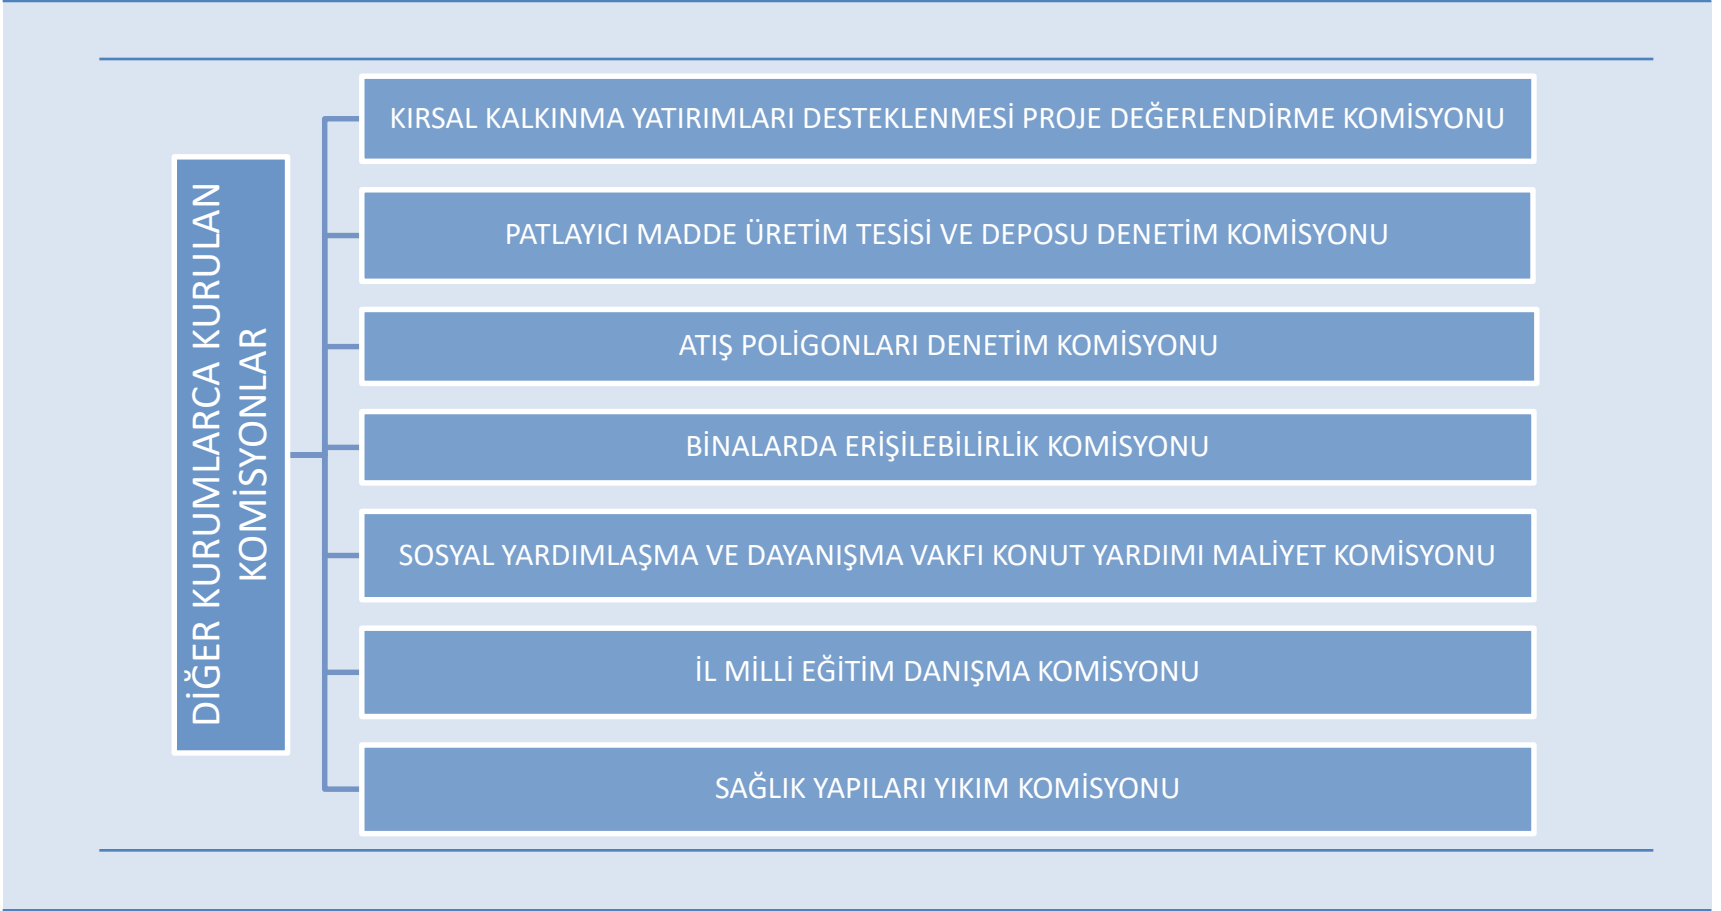

DİĞER KAMU KURUMLARINA VERİLEN TEKNİK DESTEKLER



ÇEVRE İLE İLGİLİ BAKANLIĞIMIZ YARDIMLARI

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilatı Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik gereğince, Bakanlığımızca 2024 Yılında yerel yönetimlere (30) 48.194.783,52 TL yardım ödeneği aktarılmıştır.

	Yardım Yapılan İdare	Yardım Konusu	Harcanan miktar
21	KILIÇASLAN BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI	1.000.000,00
22	KIZILÖREN BELEDİYESİ	NEW HOLLAND TT55 4WD TRAKTÖR ALIMI+SONDAJ İMALATI MALZEME ALIM İŞİ	1.895.358,00
23	KOCATEPE BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI	1.000.000,00
24	KÜÇÜKHÖYÜK BELEDİYESİ	ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI	596.200,00
25	SEYDİLER BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI	1.000.000,00
26	SUSUZ BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI	1.000.000,00
27	SÜLÜN BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI	1.000.000,00
28	TAŞOLUK BELEDİYESİ	ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI	190.000,00
29	TATARLI BELEDİYESİ	ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI	1.000.000,00
30	YAYLABAĞI BELEDİYESİ	BETON PARKE TAŞI ALIMI	2.250.000,00

ÇEVRE İLE İLGİLİ BAKANLIĞIMIZ YARDIMLARI



ÇEVRE İLE İLGİLİ BAKANLIĞIMIZ YARDIMLARI

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilatı Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik gereğince, Bakanlığımızca 2024 Yılında yerel yönetimlere (30) 48.194.783,52 TL yardım ödeneği aktarılmıştır.

	Yardım Yapılan İdare	Yardım Konusu	Harcanan miktar
1	AFYONKARAHİSAR İL BELEDİYESİ	ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI+ÇİFT KABİN KAMYONET	6.287.077,88
2	İL ÖZEL İDARTESİ	ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI	3.848.473,62
3	AHMETPAŞA BELEDİYESİ	ÇEVRE DÜZENLEMESİ MAL VE MALZEME ALIMI-ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI	1.000.000,00
4	AKÖREN BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI+ ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ	1.000.000,00
5	BAYAT BELEDİYESİ	ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI	1.000.000,00
6	BEYYAZI BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI-BETON BORDÜR TAŞI ALIMI	1.000.000,00
7	ÇAYIRBAĞ BELEDİYESİ	ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI	1.000.000,00
8	ÇOBANLAR BELEDİYESİ	ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI	2.963.874,72
9	DAVULGA BELEDİYESİ	ÇEVRE DÜZENLEMESİ MAL VE MALZEME ALIMI	1.000.000,00
10	DIŞLI BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI	1.000.000,00
11	EMİRDAĞ BELEDİYESİ	ÇÖP KONTEYNERİ VE KİLİTLİ PARKE ALIMI	1.400.000,00
12	ERKMEN BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI	999.000,00
13	EVÇİLER BELEDİYESİ	BETON PARKE TAŞI ALIMI	1.000.000,00
14	GAZLIGÖL BELEDİYESİ	KAZICI VE YÜKLEYİCİ +ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI	5.034.399,30
15	GEBECER BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI	1.000.000,00
16	GÖMÜ BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI	1.000.000,00
17	GÜNEY BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI	1.000.000,00
18	HOCALAR BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI	983.400,00
19	İHSANİYE BELEDİYESİ	FORD ÇİFT KABİN KAMYONET ALIM	1.000.000,00
20	KAYIHAN BELEDİYESİ	KAZICI VE YÜKLEYİCİ +ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI	3.747.000,00

ÇEVRE İLE İLGİLİ BAKANLIĞIMIZ YARDIMLARI
