



**TÜRKİYE CUMHURİYETİ**  
**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**

**18.Bölge Müdürlüğü**  
**Afyonkarahisar İli Yatırımları**  
**Osman ERKAN**  
**Bölge Müdürü**

**17 Ocak 2025**



## TOPLAM PROJE SAYISI

125

## DEVAM EDEN PROJE SAYISI

21

## İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI

74

## TAMAMLANAN PROJE SAYISI

30

## TOPLAM PROJE TUTARI (TL)

12 107 942 000

## ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)

1 237 262 000

## 2024 YILI ÖDENEĞİ (TL)

743 346 000

## DÖNEM SONU HARCAMA (TL)

743 345 000

## PARASAL GERÇEKLEŞME (%)

100



T.C. TARIM VE  
ORMAN BAKANLIĐI



# 2024 Yılı Yatırım Programında Yer Alan İşler



T.C. TARIM VE  
ORMAN BAKANLIĞI

# 2024 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Büyük Su İşleri (25 Adet)



İŞ ADEDİ	İŞİN ADI	PROJE TUTARI (TL)	2024 YILI ÖDENEĞİ (TL)	YILI HARCAMA (TL)	NAKDİ GERÇ. (%)
26	<b>TOPLAM</b>	<b>4 307 724 000</b>	<b>101 625 000</b>	<b>101 624 000</b>	<b>100</b>
AFYONKARAHİSAR İLİ BÜYÜK SU İŞLERİ PROJELERİ		1	BAYAT ASARCİK SULAMASI YENİLEME PROJESİ (1 447 ha)		
11 ADET SULAMA		1	Afyonkarahisar-Bayat Asarcık Göleti Sulaması Yenilemesi (1 447 ha)		
		2	Afyonkarahisar-Bayat Asarcık Göleti Sulaması Yenilemesi KGM Protokol Bedeli		
		3	Afyonkarahisar-Bayat Asarcık Göleti Sulaması Yenilemesi Malzeme Temini (Çelik Boru)		
		4	Afyonkarahisar-Bayat Asarcık Göleti Sulaması Yenilemesi Malzeme Temini (HDPE)		
7 ADET İÇMESUYU		2	ÇAY SELEVİR SULAMASI YENİLEMESİ PROJESİ (8 760 ha)		
		5	Afyonkarahisar Çay Selevir Sulaması Yenileme (2 866 ha)		
		6	Afyonkarahisar Çay Selevir Sulaması Yenileme 2. Kısım (2 042 ha)		
		7	Afyonkarahisar-Çay Selevir Sulaması Yenileme 3. Kısım (3 852 ha)		
4 ADET ATIKSU		3	KARAKUYU (DOMBAY) POMPAJ SULAMASI YENİLEME 1. KISIM PROJESİ (1 200 ha)		
		8	Afyonkarahisar-Dinar Karakuyu (Dombay) Pompaj Sulaması Yenileme Kısım Arazi Edinim Planlarının ve Arazi Edinim Planı İzleme Raporlarının Hazırlanması Danışmanlık Hizmetleri		
1 ADET TAMAMLAMA PROJELERİ		9	Afyonkarahisar-Dinar Karakuyu (Dombay) Pompaj Sulaması Yenileme 1. Kısım (1 200 ha)		
		10	Kayseri Sarımsaklı Barajı Sulaması Yenileme ve Afyonkarahisar-Dinar Karakuyu (Dombay) Pompaj Sulaması Yenileme 1. Kısım Yapım İşleri İçin Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) Hazırlanması Danışmanlık Hizmetleri		
3 ADET ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ		4	ÇOBANLAR SEYİTLER SULAMASI YENİLEME (TAMAMLAMA) PROJESİ (1 765 ha)		
		11	Afyonkarahisar Çobanlar Seyitler Sulaması Yenileme 2. Kısım (1 765 ha)		
		5	SANDIKLI-YAVAŞLAR PROJESİ (TAMAMLAMA PROJESİ)		
		12	Afyonkarahisar Sandıklı Yavaşlar Barajı Relokasyon Yolu Ek 2 Protokol Bedeli		



AFYONKARAHİSAR İLİ BÜYÜK SU İŞLERİ PROJELERİ	6	AFYONKARAHİSAR İÇMESUYU PROJESİ 2. MERHALE
11 ADET SULAMA	13	Afyonkarahisar Sandıklı İlçesi İçmesuyu Tesisleri (3,71 hm <sup>3</sup> /yıl)
	14	Afyonkarahisar Sinanpaşa Güney Beldesi İsale Hattı (0,31 hm <sup>3</sup> /yıl)
	15	Afyonkarahisar Şuhut İlçesi İçmesuyu Tesisleri (1,6 hm <sup>3</sup> /yıl)
	16	Afyonkarahisar-Akarçay Havzası Bolvadin Dışli- Özburun Atıksu Arıtma Tesisi (1.900 m <sup>3</sup> /gün)
	17	Afyonkarahisar-Akarçay Havzası Merkez Büyükkalecik Atıksu Arıtma Tesisi (850 m <sup>3</sup> /gün)
7 ADET İÇMESUYU	18	Afyonkarahisar-Akarçay Havzası Merkez Gebeceler Atıksu Arıtma Tesisi (850 m <sup>3</sup> /gün)
	19	Afyonkarahisar-Emirdağ İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi (1,095 hm <sup>3</sup> /yıl)
	20	Afyonkarahisar-Kızılören İçmesuyu Tesisleri (8 km, 1,10 hm <sup>3</sup> /yıl)
4 ADET ATIKSU	21	Afyonkarahisar-Sandıklı İçmesuyu Arıtma Tesisi (18 000 m <sup>3</sup> /gün)
	22	Afyonkarahisar-İhsaniye Döğeri İlçesi İçmesuyu Tesisleri İkmali (0,67 hm <sup>3</sup> /yıl)
1 ADET TAMAMLAMA PROJELERİ	23	Afyonkarahisar-Sinanpaşa Taşoluk Beldesi İçmesuyu Tesisleri İkmali (0,54 hm <sup>3</sup> /yıl)
	7	ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ (28 325 ha)
3 ADET ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ	24	Afyonkarahisar 2.Kısım AT ve TİGH (16.869 ha)
	25	Afyonkarahisar 3.Kısım AT ve TİGH (9.500 ha)
	26	Afyonkarahisar-Bayat Asarcık Topplulaştırma Yolu ve Sanat Yapıları (1.956 ha)



T.C. TARIM VE  
ORMAN BAKANLIĞI

# Afyonkarahisar İli Genel Vaziyet Planı



- 1) ÇAY SELEVİR SULAMASI YENİLEME PROJESİ
- 2) ÇOBANLAR SEYİTLER SULAMASI YENİLEME PROJESİ
- 3) BAYAT ASARCİK SULAMASI YENİLEMESİ
- 4) SANDIKLI-YAVAŞLAR PROJESİ
- 5) AFYONKARAHİSAR İÇMESUYU 2.MERHALE PROJESİ
- 6) AFYONKARAHİSAR-ÇAY VE BOLVADİN İÇMESUYU PROJESİ
- 7) KARAKUYU (DOMBAY) POMPAJ SULAMASI YENİLEME 1.KISIM
- 8) ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ



T.C. TARIM VE  
ORMAN BAKANLIĐI



# Çay Selevir Sulaması Yenileme Projesi



T.C. TARIM VE  
ORMAN BAKANLIĞI

# AFYONKARAHİSAR ÇAY SELEVİR SULAMASI YENİLEME



100  
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YÜZÜNCÜ YILI

Su Kaynağı Adı: Selevir Barajı		Su Kaynağı Durumu: İşletme	Su kaynağı F.G: %100	Sulama Alanı	2 866 ha
Ana kanal: Borulu	Ana Boru: 30.198 m	Yerleşim Birimi Faydası: 1 ilçe, 3 kasaba, 6 köy		İhale Tarihi	07.02.2017
Cazibe: 2.866 ha	Pompaj: -	Hm: -		Sözleşme Tarihi	14.04.2017
				Sözleşme Bedeli (TL)	44.658.000
				İşe Başlama Tarihi	24.04.2017
				Son İş Bitim Tarihi	18.07.2021
				Yüklenici	ETHAŞ+ENSAR
				2024 Yılı Fiyatlarıyla Maliyet (TL)	724.218.000
				2024 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyeti (TL)	7.872.000
				2024 Yılı Ödeneği (TL)	7.000.000
				2024 Yılı Revize Ödeneği (TL)	5.000.000
				2024 Yılı Harcaması (TL)	-
				Parasal Gerçekleşme (%)	99
Fiziki Gerçekleşme (%)	100				
				İlave Ödenek İhtiyacı	
				Açıklama: İş tamamlanmıştır.	
2024 yılı öncesi tamamlanan	2024 yılı tamamlanan	2024 yılı hedefi (Resmi KPI)	2025 ve sonrası hedefi		
2.866 ha	-	-	-		





T.C. TARIM VE  
ORMAN BAKANLIĞI

# AFYONKARAHİSAR ÇAY SELEVİR SULAMASI YENİLEME 2. KISIM



Su Kaynağı Adı: Selevir Barajı	Su Kaynağı Durumu: İşletme	Su kaynağı F.G: %100	Sulama Alanı	2 042 ha
Ana kanal: Borulu	Ana Boru: 30.198 m	Yerleşim Birimi Faydası: 1 ilçe, 3 kasaba, 6 köy	İhale Tarihi	24.12.2020
Cazibe: 2.866 ha	Pompaj: -	Hm: -	Sözleşme Tarihi	19.03.2021
			Sözleşme Bedeli (TL)	35.959.000
			İşe Başlama Tarihi	29.03.2021
			Son İş Bitim Tarihi	18.08.2024
			Yüklenici	GÜRSESLİ+ARES
			2024 Yılı Fiyatlarıyla Maliyet (TL)	296.142.000
			2024 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyeti (TL)	13.222.000
			2024 Yılı Ödeneği (TL)	25.000.000
			2024 Yılı Revize Ödeneği (TL)	12.999.000
			2024 Yılı Harcaması (TL)	12.999.000
			Parasal Gerçekleşme (%)	96
			Fiziki Gerçekleşme (%)	100
			İlave Ödenek İhtiyacı	-
			Açıklama: İş tamamlanmıştır.	
			2024 yılı öncesi tamamlanan	2024 yılı tamamlanan
2.042 ha	-	-	-	



T.C. TARIM VE  
ORMAN BAKANLIĞI

# AFYONKARAHİSAR ÇAY SELEVİR SULAMASI YENİLEME 3. KISIM



Su Kaynağı Adı: Selevir Barajı	Su Kaynağı Durumu: İşletme	Su kaynağı F.G: %100	Sulama Alanı	3 852 ha
Ana kanal: Borulu	Ana Boru: 30.198 m	Yerleşim Birimi Faydası: 1 ilçe, 3 kasaba, 6 köy	İhale Tarihi	-
Cazibe: 3.852 ha	Pompaj: -	Hm: -	Sözleşme Tarihi	-
			Sözleşme Bedeli (TL)	-
			İşe Başlama Tarihi	-
			Son İş Bitim Tarihi	-
			Yüklenici	-
			2024 Yılı Fiyatlarıyla Maliyet (TL)	1.750.000.000
			2024 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyeti (TL)	1.750.000.000
			2024 Yılı Ödenegi (TL)	-
			2024 Yılı Revize Ödenegi (TL)	-
			2024 Yılı Harcaması (TL)	-
			Parasal Gerçekleşme (%)	-
Fiziki Gerçekleşme (%)	-			
İlave Ödenek İhtiyacı	-			
<p><b>Açıklama:</b> 2025 Yılı içerisinde ihale edilmesi hedeflenmektedir.</p>				
2024 yılı öncesi tamamlanan	2024 yılı tamamlanan	2024 yılı hedefi (Resmi KPI)	2025 ve sonrası hedefi	
-	-	-	3 852 ha	



T.C. TARIM VE  
ORMAN BAKANLIĐI



# Bayat Asarcık Sulaması Yenileme Projesi



T.C. TARIM VE  
ORMAN BAKANLIĞI

# AFYONKARAHİSAR-BAYAT ASARCİK GÖLETİ SULAMASI YENİLEMESİ



100  
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YÜZÜNCÜ YILI

Su Kaynağı Adı: Asarcık Göleti		Su Kaynağı Durumu: İşletme	Su kaynağı F.G: %100	Sulama Alanı	1 447 ha				
Ana kanal: Borulu	Ana Boru: 15.198 m	Yerleşim Birimi Faydası: 1 ilçe, 1 kasaba		İhale Tarihi	07.12.2017				
Cazibe: 1.447 ha	Pompaj: -	Hm: -		Sözleşme Tarihi	28.03.2018				
<p>1.000 ha</p> <p>447 ha</p> <p>Asarcık Göleti 3,07 hm<sup>3</sup></p> <p>Bayat</p> <p>Image © 2024 Maxar Technologies Image © 2024 Airbus</p> <p>Google Earth</p>				Sözleşme Bedeli (TL)	12.053.000				
				İşe Başlama Tarihi	09.04.2018				
				Son İş Bitim Tarihi	30.07.2024				
				Yüklenici	ARES İnşaat				
				2024 Yılı Fiyatlarıyla Maliyet (TL)	178.238.000				
				2024 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyeti (TL)	9.341.000				
				2024 Yılı Ödeneği (TL)	15.000.000				
				2024 Yılı Revize Ödeneği (TL)	36.633.000				
				2024 Yılı Harcaması (TL)	36.632.000				
				Parasal Gerçekleşme (%)	98				
				Fiziki Gerçekleşme (%)	98				
				İlave Ödenek İhtiyacı	-				
				<p><b>Açıklama:</b> Yapım işi kapsamında Topplulaştırma proje yapımı çalışmalarında Toprak Etütleri ve Arazi Derecelendirme tamamlandı, blok planı onaylandı. Toplam 9.400 m çelik borunun 9.205 m'si, 50.084 m HDPE borunun 49.580 m'si döşenmiştir. Sanat yapılarının imalatları devam etmektedir. İşte 2.008.000 TL tutarında iş artışı alınmıştır, iş tamamlanmak üzeredir</p>					
				2024 yılı öncesi tamamlanan	2024 yılı tamamlanan	2024 yılı hedefi (Resmi KPI)	2025 ve sonrası hedefi		
1 000 ha	-	447 ha	-						



T.C. TARIM VE  
ORMAN BAKANLIĐI



# Karakuyu (Dombay) Pompaj Sulaması Yenileme 1. Kısım



# T.C. TARIM VE AFYONKARAHİSAR-DİNAR KARAKUYU (DOMBAY) ORMAN BAKANLIĞI POMPAJ SULAMASI YENİLEME 1. KISIM



Su Kaynağı Adı: Karakuyu Depolama.		Su Kaynağı Durumu: İşletmede	Su kaynağı F.G: %100	Sulama Alanı	1 200 ha
Ana kanal: Borulu	Ana Boru: 15.580m	Yerleşim Birimi Faydası: 8 köy		İhale Tarihi	Aralık 2024
Cazibe: -	Pompaj: 3 064 ha	Hm: 59,7 m		Sözleşme Tarihi	-
				Sözleşme Bedeli (TL)	-
				İşe Başlama Tarihi	-
				Son İş Bitim Tarihi	-
				Yüklenici	-
				2024 Yılı Fiyatlarıyla Maliyet (TL)	395.000.000
				2024 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyeti (TL)	-
				2024 Yılı Ödeneği (TL)	-
				2024 Yılı Revize Ödeneği (TL)	-
				2024 Yılı Harcaması (TL)	-
				Parasal Gerçekleşme (%)	-
Fiziki Gerçekleşme (%)	-				
İlave Ödenek İhtiyacı	-				
				<p><b>Açıklama:</b> 2022 yılında yatırım programına alınan söz konusu işimizde sulama alanının (3.064 ha) bir kısmının (1.200 ha) Dünya Bankası Kredili olarak yapılması planlanmakta olup 2025 Mayıs ayında Genel Müdürlüğümüzce ihale edilmesi hedeflenmektedir.</p>	
2024 yılı öncesi tamamlanan	2024 yılı tamamlanan	2024 yılı hedefi (Resmi KPI)	2025 ve sonrası hedefi		
-	-	-	1 200 ha		




T.C. TARIM VE  
ORMAN BAKANLIĐI



# Çobanlar Seyitler Sulaması Yenileme Projesi



Su Kaynağı Adı: Seyitler Barajı		Su Kaynağı Durumu: İşletmede	Su kaynağı F.G: %100
Ana kanal: Borulu	Ana Boru: 16 798 m	Yerleşim Birimi Faydası: 1 ilçe, 2 kasaba, 1köy	
Cazibe: 3.115 ha	Pompaj: -	Hm: -	

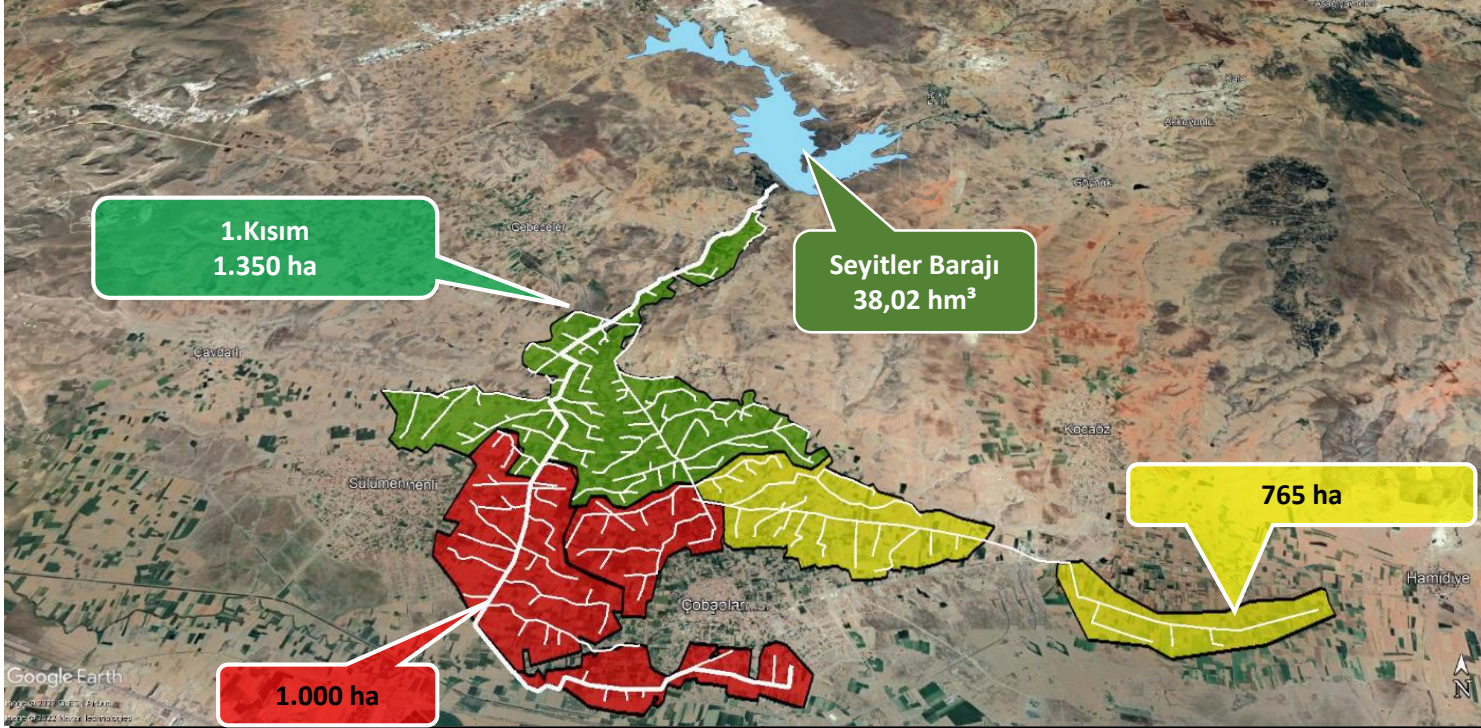

Sulama Alanı	1 765 ha
İhale Tarihi	02.02.2021
Sözleşme Tarihi	28.10.2021
Sözleşme Bedeli (TL)	31.343.000
İşe Başlama Tarihi	05.11.2021
Son İş Bitim Tarihi	29.03.2024
Yüklenici	ALİ DEMİROK İNŞAAT
2024 Yılı Fiyatlarıyla Maliyet (TL)	248.405.000
2024 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyeti (TL)	17.816.000
2024 Yılı Ödeneği (TL)	-
2024 Yılı Revize Ödeneği (TL)	2.972.000
2024 Yılı Harcaması (TL)	2.972.000
Parasal Gerçekleşme (%)	93
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
İlave Ödenek İhtiyacı	-

Açıklama: İş tamamlanmıştır.

2024 yılı öncesi tamamlanan	2024 yılı tamamlanan	2024 yılı inşaatı devam eden	2025 ve sonrası hedefi
1.765 ha	-	-	-





T.C. TARIM VE  
ORMAN BAKANLIĐI



TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YÜZÜNCÜ YILI

# Afyonkarahisar Arazi Topplulaştırma ve Tigh Projesi



T.C. TARIM VE  
ORMAN BAKANLIĞI

# AFYONKARAHİSAR İLİ A.T VE T.İ.G.H PROJELERİ



SIRA NO	PROJE ADI	YERLEŞİM BİRİMİ SAYISI	FAYDASI (HA)	TOPLAM KEŞİF / İHALE BEDELİ	FİZİKİ GERÇ. (%)	NAKDİ GERÇ. (%)	İŞ BİTİM TARİHİ	2024 YILI ÖDENEĞİ
	<b>TOPLAM</b>	<b>27</b>	<b>28 325</b>	<b>283 256 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 976 000</b>
<b>1</b>	Afyonkarahisar 2.Kısım AT ve TİGH Projesi	17	16 869	111 760 000	65	58	27.06.2025	10 000 000
<b>2</b>	Afyonkarahisar 3.Kısım AT ve TİGH	10	9 500	144 659 000	7	7	23.10.2026	6 976 000
<b>3</b>	Afyonkarahisar-Bayat Asarcık Topplulaştırma Yolu ve Sanat Yapıları	-	1 956	26 836 000	-	-	29.06.2024	-



T.C. TARIM VE  
ORMAN BAKANLIĞI

# Küçük Su İşleri Projeleri (99 Adet)



İŞ ADEDİ	İŞİN ADI	PROJE TUTARI (TL)	2024 YILI ÖDENEĞİ (TL)	YILI HARCAMA (TL)	FAYDA (HA)	NAKDİ GERÇ. (%)	İŞİN DURUMU
99	<b>TOPLAM</b>	<b>7 800 218 000</b>	<b>641 720 000</b>	<b>641 720 000</b>		<b>100</b>	-
48	Taşkın Koruma	1 688 464 000	160 432 000	160 432 000	42 Köy, 5 İlçe Merkezi ve İl Merkezi	100	7 Adet İş Tamamlanmıştır.
1	Geçirgen Tersip Bentleri	54 000 000	1	-	İl Merkezi	-	-
3	Yerüstü Sulamaları	295 532 000	22 816 000	22 816 000	1 204	100	1 Adet İş Tamamlanmıştır.
19	Yeraltısuyu Sulama Şebekeleri	1 011 993 000	136 654 000	102 961 000	3 732	75	4 Adet iş bitti 5 Adet İş devam ediyor.
13	Gölet Sulamaları	723 330 000	108 958 000	108 958 000	2 961	100	6 Adet İş Tamamlanmıştır.
15	Gölet ve Sulamaları	4 026 897 000	199 382 000	199 382 000	3 416	100	1 Adet İş Tamamlanmıştır.



T.C. TARIM VE  
ORMAN BAKANLIĐI



# Yatırım Programındaki Tamamlanan İşler



T.C. TARIM VE  
ORMAN BAKANLIĞI

# TAMAMLANAN İŞLER



TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YÜZÜNCÜ YILI

SIRA NO	İŞİN ADI	2024 Yılı Fiyatı ile Maliyeti	Faydası
1	AFYONKARAHİSAR ÇAY SELEVİR SULAMASI YENİLEME	724.218.000	2.866 ha
2	AFYONKARAHİSAR ÇAY SELEVİR SULAMASI YENİLEME 2. KISIM	296.142.000	2.042 ha
3	AFYONKARAHİSAR-ÇOBANLAR SEYİTLER SULAMASI YENİLEME 2. KISIM	248.405.000	1.765 ha
4	AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI DEREÇİNE REGÜLATÖRÜ ve SULAMASI İKMALİ	55.992.000	100 ha sulama
5	AFYONKARAHİSAR DİNAR BADEMLİ 1. KISIM YAS	13.325.000	61 ha sulama
6	AFYONKARAHİSAR DİNAR DOĞANLI 5. KISIM YAS	8.291.000	37 ha sulama
7	AFYONKARAHİSAR ŞUHUT ARIZLI YAS SULAMASI	12.192.000	82 ha sulama
8	AFYONKARAHİSAR BOLVADİN YAS SULAMALARI GES KURULUMU (HİBE)	24.598.000	
9	AFYONKARAHİSAR İHSANİYE KAYIHAN GÖLETİ SULAMASI	24.322.000	63 ha sulama
10	AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI ÇIĞRI GÖLETİ SULAMASI	137.866.000	481 ha sulama
11	AFYONKARAHİSAR DAZKIRI ÇİFTLİK GÖLETİ SULAMASI	30.965.000	139 ha sulama



T.C. TARIM VE  
ORMAN BAKANLIĞI

# TAMAMLANAN İŞLER



TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YÜZÜNCÜ YILI

SIRA NO	İŞİN ADI	2024 Yılı Fiyatı ile Maliyeti	Faydası
12	AFYONKARAHİSAR SANDIKLI BALLIK GÖLETİ SULAMASI	24.364.000	79 ha sulama
13	AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA ELVANPAŞA GÖLETİ SULAMASI	101.709.000	187 ha sulama
14	AFYONKARAHİSAR ŞUHUT ARIZLI GÖLETİ SULAMASI	14.832.000	75 ha sulama
15	AFYONKARAHİSAR ÇAY KARAMIK GÖLETİ ve SULAMASI İKMALİ	162.079.000	480 ha sulama
16	AFYONKARAHİSAR SANDIKLI İLÇE MERKEZİ 3. KISIM	49.497.000	1 İlçe 40 ha taşkın koruma
17	AFYONKARAHİSAR SANDIKLI YAVAŞLAR KASABASI AKPINAR DERESİ 2. KISIM	19.668.000	1 köy 15 ha taşkın koruma
18	AFYONKARAHİSAR DİNAR BÜYÜKMENDERES NEHRİ 2. KISIM	37.243.000	1 İlçe 45 ha taşkın koruma
19	AFYONKARAHİSAR DİNAR YIPRAK KINIK KÖYLERİ 1. KISIM	32.776.000	2 köy 45 ha taşkın koruma
20	AFYONKARAHİSAR İHSANİYE KAYIHAN KASABASI	38.922.000	1 köy 23 ha taşkın koruma
21	AFYONKARAHİSAR MERKEZ ATAÖY KIŞLACIK KÖYLERİ İKMALİ 2. KISIM	33.326.000	1 köy 30 ha taşkın koruma
22	AFYONKARAHİSAR ŞUHUT BALÇIKHİSAR KÖYÜ 2. KISIM	23.129.000	1 köy 19 ha taşkın koruma



T.C. TARIM VE  
ORMAN BAKANLIĐI



# Önemli KSI İşleri




T.C. TARIM VE  
ORMAN BAKANLIĞI

# AFYONKARAHİSAR MERKEZ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ SULAMASI



100  
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YÜZÜNCÜ YILI

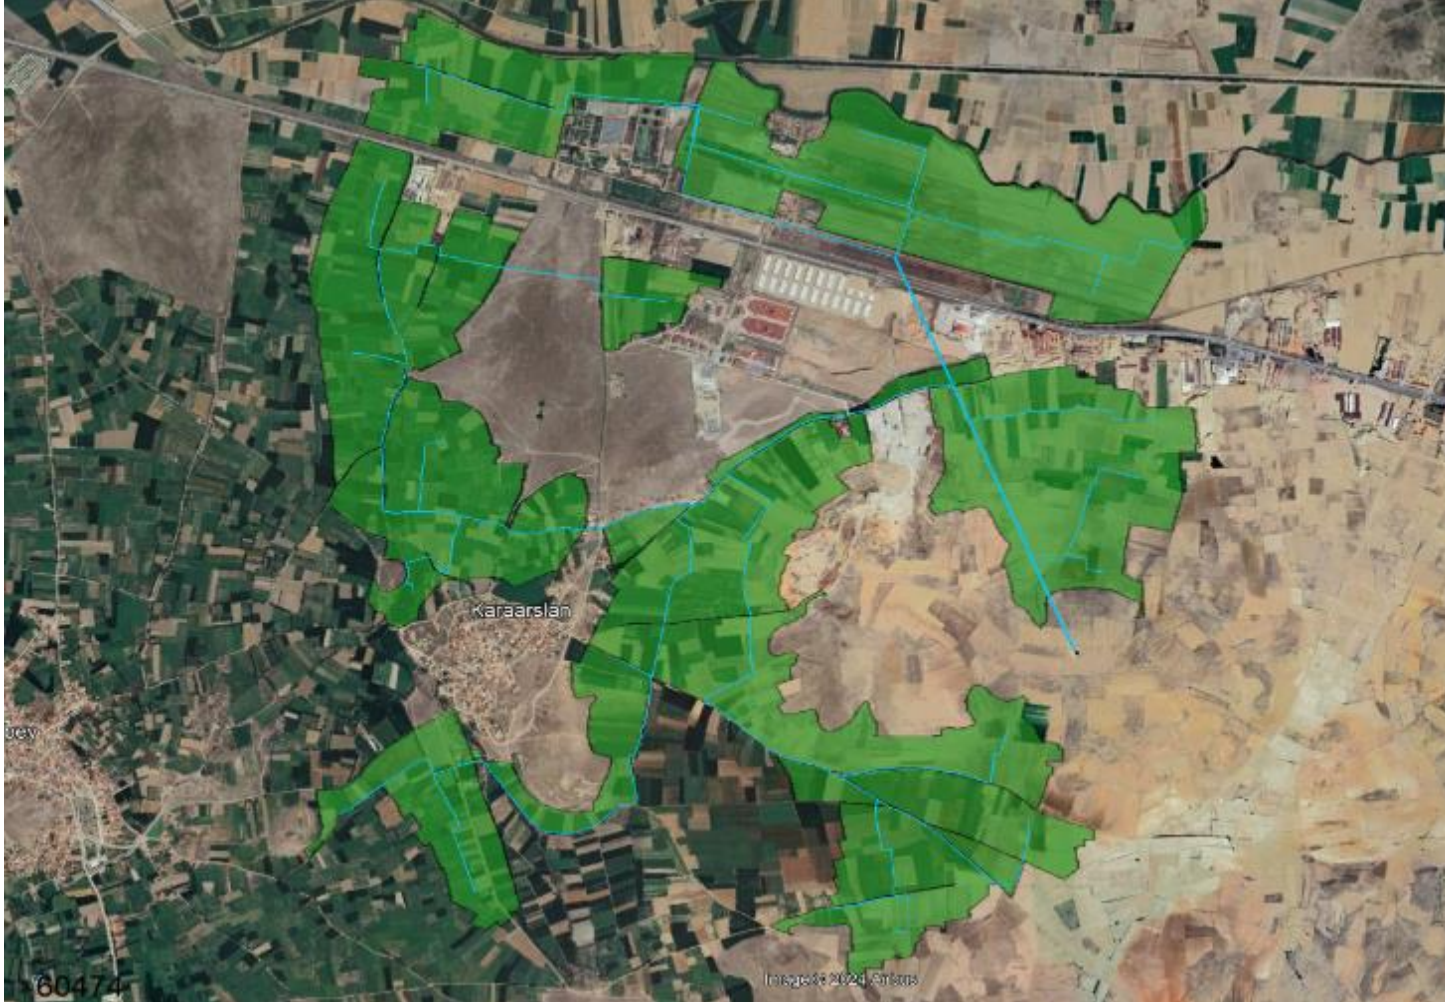

Sulama Alanı	9380 dekar
Zirai Gelir Artışı (TL)	79.730.000
İhale Tarihi	12.12.2016
Sözleşme Tarihi	29.05.2017
Sözleşme Bedeli (TL)	36.021.000
İşe Başlama Tarihi	08.06.2017
Son İş Bitim Tarihi	26.07.2024
Yüklenici	Karaca İnşaat
2024 Yılı Fiyatlarıyla Maliyet (TL)	615.062.000
2024 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyet (TL)	19.621.000
2024 Yılı Ödeneği (TL)	7.000.000
2024 Yılı Revize Ödeneği (TL)	22.816.000
2024 Yılı Harcama (TL)	22.816.000
Parasal Gerçekleşme (%)	97
Fiziki Gerçekleşme (%)	98

**Açıklama:** 30.000 m HDPE boru ve 4300 m çelik boru montajı ile sanat yapıları, regülasyon havuzu ve dezenfeksiyon ünitesi ile GES, Laboratuvar binası imalatı tamamlanmıştır.



# AFYONKARAHİSAR MERKEZ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ SULAMASI






T.C. TARIM VE  
ORMAN BAKANLIĞI

# AFYONKARAHİSAR SANDIKLI EŞÖREN GÖLETİ SULAMASI İKMALİ



100  
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YÜZÜNCÜ YILI

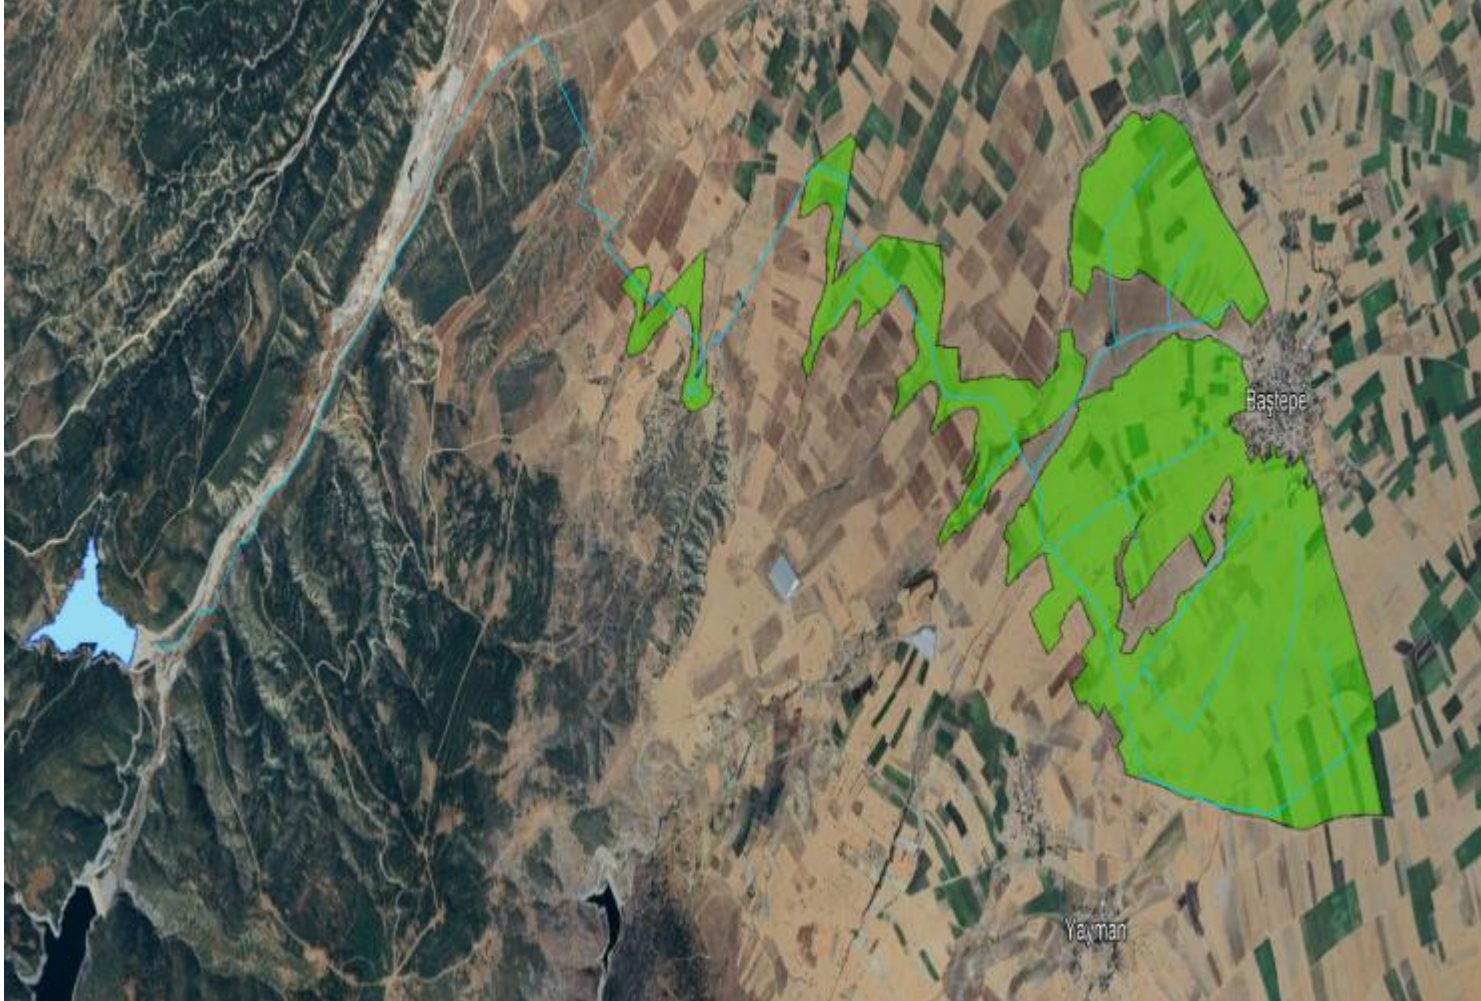

Sulama Alanı	5190 dekar
Zirai Gelir Artışı (TL)	44.115.000
İhale Tarihi	06.07.2023
Sözleşme Tarihi	12.09.2023
Sözleşme Bedeli (TL)	66.789.000
İşe Başlama Tarihi	20.09.2023
Son İş Bitim Tarihi	14.11.2025
Yüklenici	Ares Harita
2024 Yılı Fiyatlarıyla Maliyet (TL)	124.441.000
2024 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyet (TL)	29.040.000
2024 Yılı Ödeneği (TL)	42.000.000
2024 Yılı Revize Ödeneği (TL)	95.401.000
2024 Yılı Harcama (TL)	95.401.000
Parasal Gerçekleşme (%)	90
Fiziki Gerçekleşme (%)	90

Açıklama: 9982 m PE, 3773 m çelik boru ihzaratı yapıldı.  
İmalatlar devam ediyor

# AFYONKARAHİSAR SANDIKLI EŐÖREN GÖLETİ SULAMASI İKMALİ





T.C. TARIM VE  
ORMAN BAKANLIĞI

# AFYONKARAHİSAR – ŞUHUT BAŞÖREN TEKKE KAVAKLI GÖLETİ İKMALI



Projenin Maksadı: 236 ha Sulama – 1,60 hm <sup>3</sup> İçmesuyu	Gövde Tipi: SSB	Gövde Hacmi: 0,225 hm <sup>3</sup>	Projenin Maksadı	236 ha Sulama – 1,60 hm <sup>3</sup> İçmesuyu
Rezervuar Kaplama: Yok	Aktif Hacim: 1,950 hm <sup>3</sup>	Gövde Yüksekliği: 39 m / 41.5 m (Talveg / Temel)	İhale Tarihi	30.01.2019
			Sözleşme Tarihi	03.05.2019
			Sözleşme Bedeli (TL)	51.282.000
			İşe Başlama Tarihi	13.05.2019
			Son İş Bitim Tarihi	08.06.2025
			Yüklenici	NVS + AK-YAL Adi Ortaklığı
			2024 Yılı Fiyatlarıyla Maliyet (TL)	564.902.000
			2024 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyet (TL)	43.379.000
			2024 Yılı Ödeneği (TL)	20.000.000
			2024 Yılı Revize Ödeneği (TL)	105.000.000
			2024 Yılı Harcama (TL)	105.000.000
Parasal Gerçekleşme (%)	94			
Fiziki Gerçekleşme (%)	99			
			<p><b>Açıklama:</b> Sağ sahil hasır çelik ankraj ve shotcrete imalatları tamamlandı, IBO bulonlama imalatı tamamlandı. 80.000 m<sup>3</sup> SSB gövde dolgusu tamamlandı. Kalan 70.000 m<sup>3</sup> SSB gövde dolgusu devam ediyor.</p>	



TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**

**ARZ EDERİM**
