



T.C. ULAŖTIRMA VE
ALTYAPI BAKANLIđI



KARAYOLLARI
GENEL MÜDÜRLÜđÜ

AFYONKARAHİSAR İLİ KARAYOLU YATIRIMLARI

13.
Bölge Müdürlüđü

Afyonkarahisar


Çidemediđin yer senin deđildir.

Halil Rifat PaŖa

17 OCAK 2025



AFYONKARAHİSAR İLİ YOL AĞI BİLGİLERİ

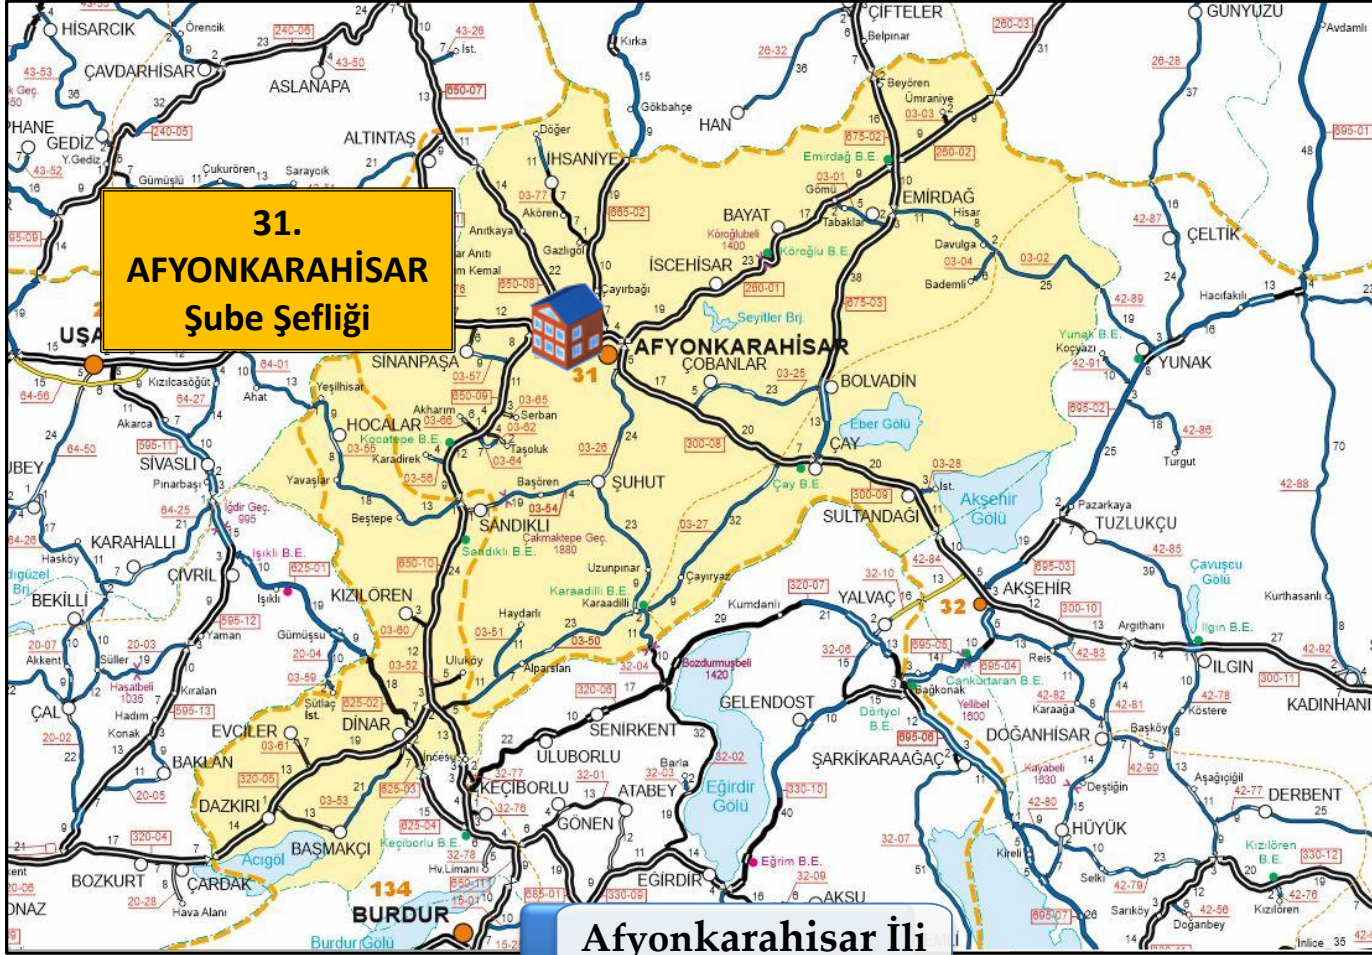

3.Bölge 777 km

13.Bölge 238 km

2.Bölge 2 km

YOL AĞI


Devlet Yolu
(%57)

135

İl Yolu
(%43)

103

SATIŞ CİNSİ

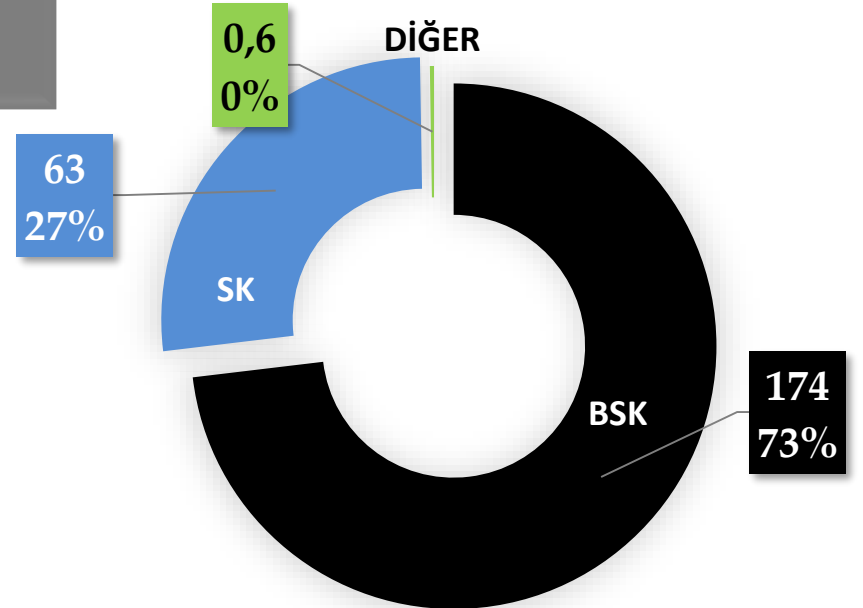



AFYONKARAHİSAR İLİ YATIRIMLARI

Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluk alanı içerisine giren Afyonkarahisar ili hudutları dâhilinde **135 km** Devlet Yolu, **103 km** İl Yolu olmak üzere Toplam **238 km** yol ađı bulunmaktadır. Yollarımızın **174 km' si** BSK'lı, **63 km'si** sathi kaplamalı, **1 km'si** parke kaplamalıdır.

Afyonkarahisar ilinde daha önceki yıllardan başlayıp 2002 yılı sonuna kadar (ađ dışı dahil) **11 km BY**, 2003-2024 yılları arasında **118 km BY** olmak üzere toplamda **129 km** bölünmüş yol ađına ulaşılmıştır. İlimizdeki **238 km** uzunluğundaki yol ađı % **54** oranında Bölünmüş Yollardan oluşmaktadır.

2024 Yılında Afyonkarahisar İlimizde ;

4,4 Km	Tek Yol(Yol İyileştirme)
10 Km	Asfalt Çalışması(Astarlı Sathi Kaplama Onarım)
500 m ²	Trafik Düşey İşaretleme,
245.000 m ²	Trafik Yatay İşaretleme,
13 Km	Otokorkuluk çalışması yapılması hedeflenmiş,

31.12.2024 tarihi itibariyle;

4,4 Km	Tek Yol(Yol İyileştirme)(Sandıklı-Hocalar Yolu)
17 Km	Asfalt Çalışması(Astarlı Sathi Kaplama Onarım) (Sandıklı-Hocalar Yolu, Dinar-Başmakçı)
380 m ²	Trafik Düşey İşaretleme,
240.000 m ²	Trafik Yatay İşaretleme,
10 Km	Otokorkuluk çalışması tamamlanmıştır.



YATIRIM İZLEME RAPORU



Toplam Proje Sayısı :	4 Adet
Toplam Proje Tutarı :	541 Milyon TL
Önceki Yılları Harcaması :	104 Milyon TL
Yılı Ödeneđi :	257 Milyon TL
Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama	257 Milyon TL
Kümülatif Parasal Gerçekleşme	% 67




Afyonkarahisar İli Karayolları Yatırımları (TL)



1993-2002 Yılları Arasında		6.561.100.000
A	2003-2023 Yılları Arasında	42.296.500.000
B	2024 Yılında	257.105.000
C(A+B)	2003-2024 Yılları Toplamı	42.553.605.000



DEVAM EDEN İŞLER

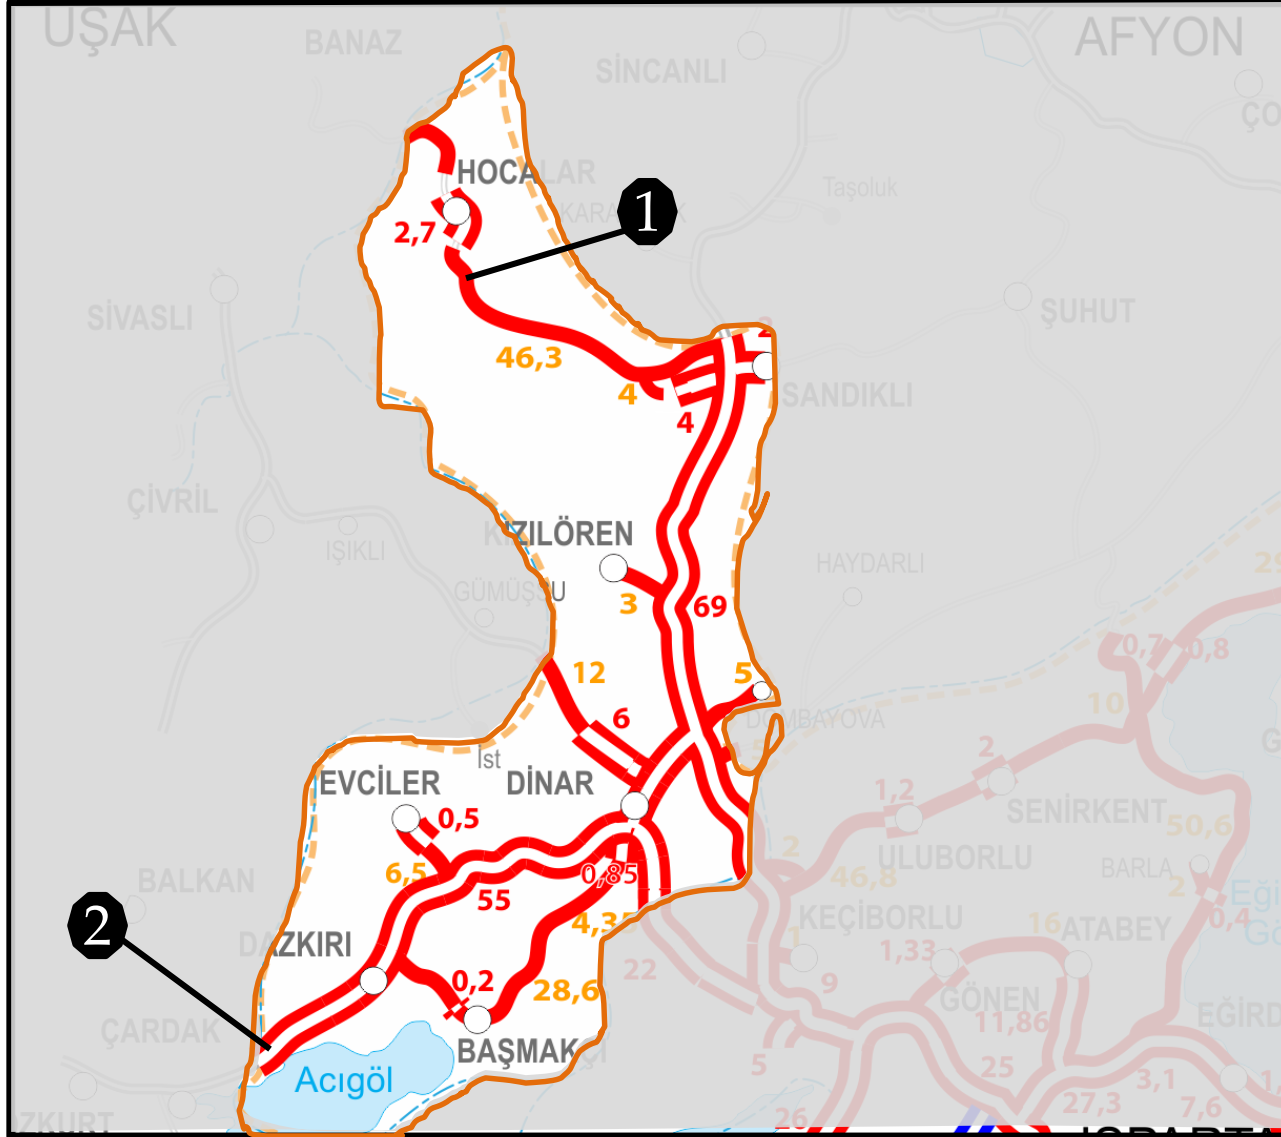


1- SANDIKLI-HOCALAR YAVAŞLAR BARAJI RÖLAKASYON YOLU

2-DİNAR-DAZKIRI-ÇARDAK YOLU HEYELAN ISLAHI

Hizmete Açık Bölünmüş Yollar	
Yapım Çalışmaları Devam Eden Bölünmüş Yollar	
İhale Edilecek Bölünmüş Yollar	
Projesi Devam Eden Bölünmüş Yollar	
Hizmete Açık Tek Yollar	
Yapım Çalışmaları Devam Eden Tek Yollar	
İhale Edilecek Tek Yollar	



1-SANDIKLI-HOCALAR YAVAŞLAR BARAJI RELOKASYON YOLU

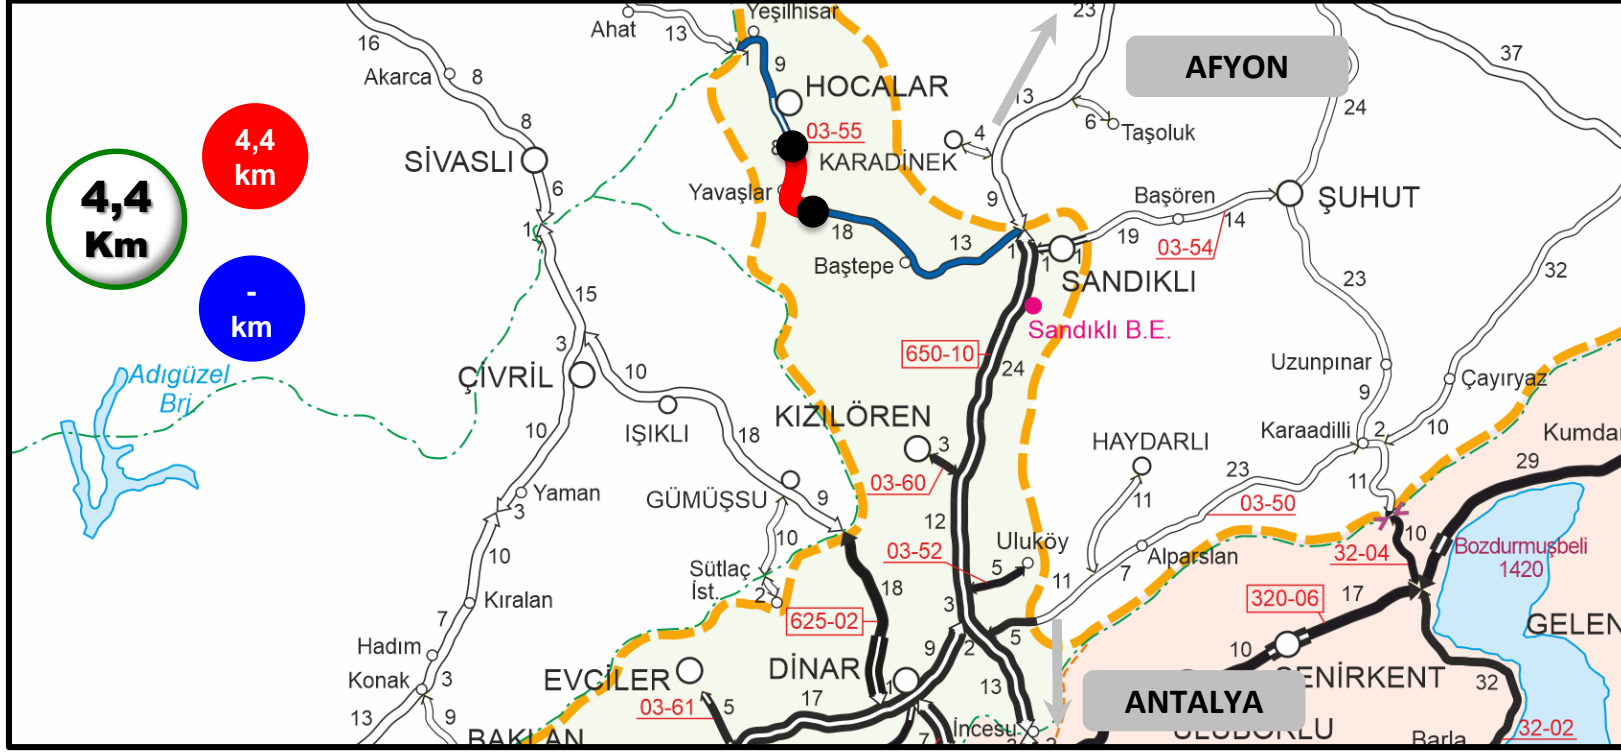


4,4
Km

4,4
km

-
km

YÜKLENİCİ: AS-YOL

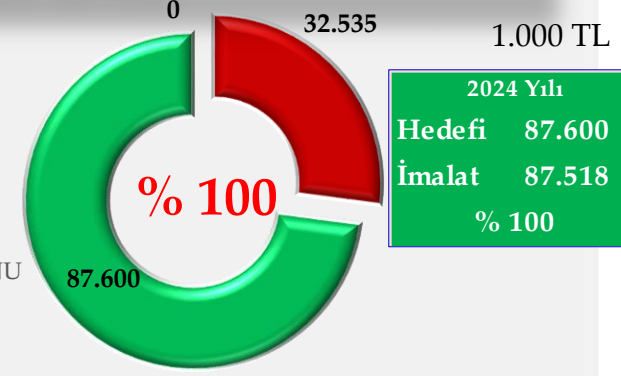

Proje Bedeli
(1.000 TL)

120.053



Başlama
Bitiş Tarihi

2023
2024

		KAPSAM	BİTEN	2024 HEDEFİ
BY	AA			
TY	A	4,4 km SK	4,4 km SK	4,4 km SK
Çift Tüp Tünel	AA			
Tek Tüp Tünel	A			
Çift Köprü	YY			
Tek Köprü	Y			
Köprülü Kavşak	YY			

MEVCUT

4,4 km / 3 dk

PROJELİ

4,4 km / 3 dk

YOĞT

2.284


AĞIR TAŞIT

❑ Proje uzunluğu 4,4 km TY/SK'dır.

❑ 2024 yılında 4,4 km TY/SK tamamlanmıştır.

2024 HEDEFİ

2- DİNAR-DAZKIRI-ÇARDAK YOLU HEYELAN ISLAHI

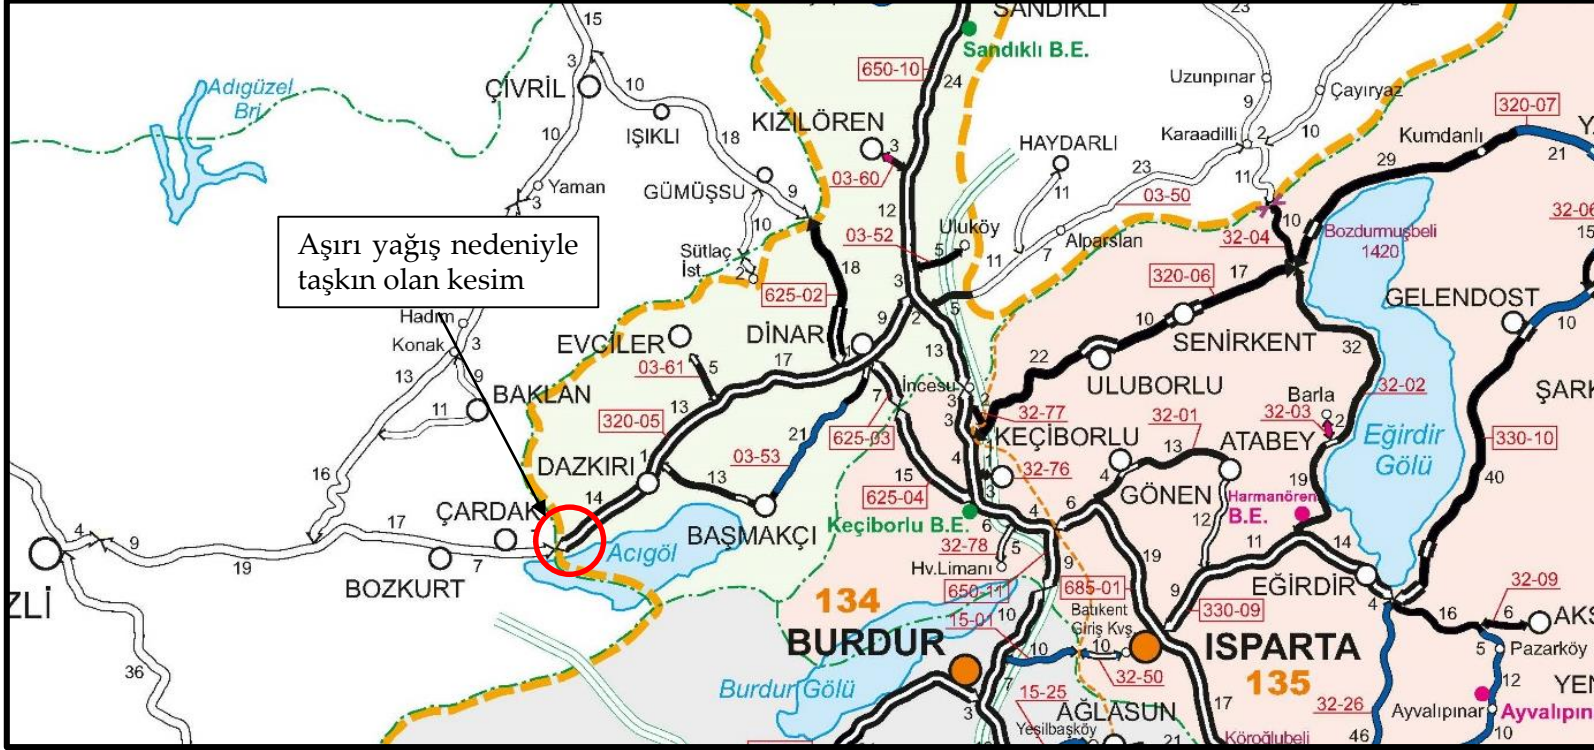

Aşırı yağış nedeniyle taşkın olan kesim

YÜKLENİCİ: ONKA

1.000 TL



2024 Yılı
Hedefi 58.500
İmalat 55.580
% 95

■ 2023 SONU

■ 2024 YILI

■ 2024 SONRASI



Proje Bedeli
(1.000 TL)

65.000



Başlama
Bitiş Tarihi

2024
2024



2024 HEDEFİ

- ❑ 10.05.2024 tarihinde ihalesi yapılmış 29.05.2024 tarihinde çalışmaya başlanmıştır.
- ❑ Sahada heyelan etkilerinin tespiti ve ivedilikle giderilmesi amacıyla söz konusu kesimde heyelan ıslah projesi çalışmaları tamamlanmış olup, proje kapsamında, 5 adet derivasyon kanalında çalışmalar başlatılmıştır.

MEVCUT	PROJELİ	YOCT	12.321	AĞIR TAŞIT
--------	---------	------	--------	------------

		KAPSAM	BİTEN	2024 HEDEFİ
BY	AA			
TY	A			
Çift Tüp Tünel	AA			
Tek Tüp Tünel	A			
Çift Köprü	YY			
Tek Köprü	Y			
KöprülÜ Kavşak				

2024 yılında Afyonkarahisar İlinde Ayrıca;

- Yol Bakım-Onarım Hizmetleri için **62,7 Milyon ₺**,
- Trafik GüvenliĐi Hizmetleri için **29,9 Milyon ₺**,
- DiĐer Harcamalar için **18,5 Milyon ₺**
olmak üzere Toplam **111 Milyon ₺** Harcama YapılmıŖtır.





2024 YILI AFYONKARAHİSAR İLİ TRAFİK GÜVENLİĐİ ÇALIŖMALARINI



2024 yılında 31.12.2024 tarihi itibariyle;


- 240.000 m² Yatay İŖaretleme,
- 380 m² Düşey İŖaretleme
- 10 km Otokorkuluk çalışması yapılmıştır.

Trafik GüvenliĐi Çalışmaları için **29,9 Milyon TL** harcama yapılmıştır.





2024 YILI SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI

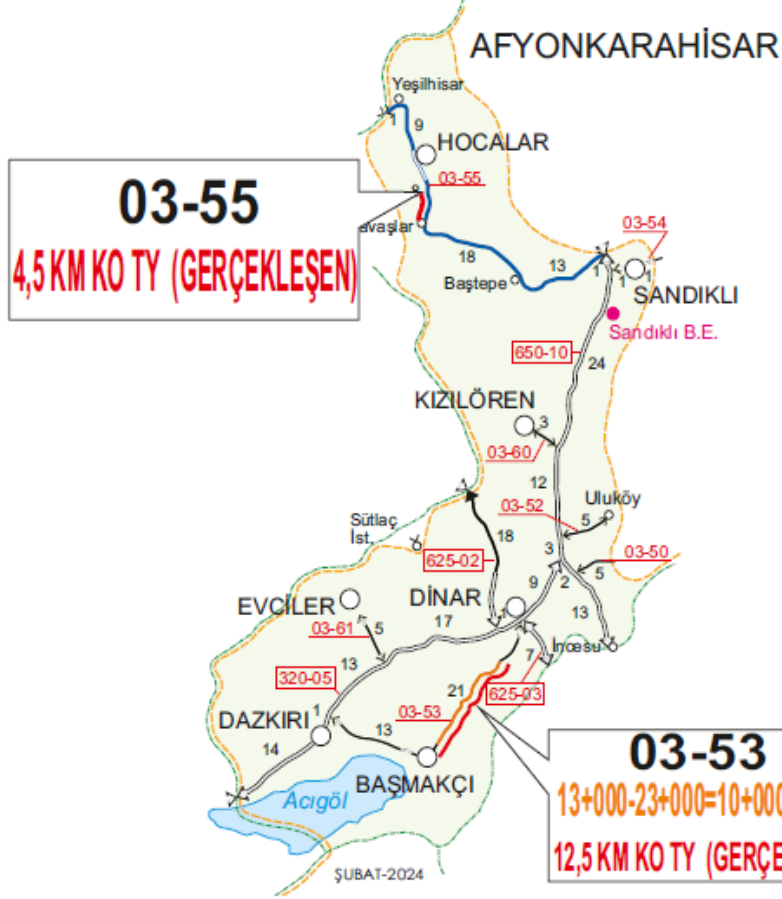

03-55
4,5 KM KO TY (GERÇEKLEŞEN)


03-53
13+000-23+000=10+000 (HEDEF)
12,5 KM KO TY (GERÇEKLEŞEN)

AFYON HEDEF SATH.KAP.	K (KM) ÇİFT	K (M ²) ÇİFT	KO(KM) ÇİFT	KO (M ²) ÇİFT	(KM) TOPLAM	(M ²) TOPLAM
	5	55000	5	55000	10	110000

AFYON GERÇEKLEŞEN SATH.KAP.	K (KM) ÇİFT	K (M ²) ÇİFT	KO(KM) ÇİFT	KO (M ²) ÇİFT	(KM) TOPLAM	(M ²) TOPLAM
			17	199500	17	199500



2003-2023 ARASI TAMAMLANAN İŞLER

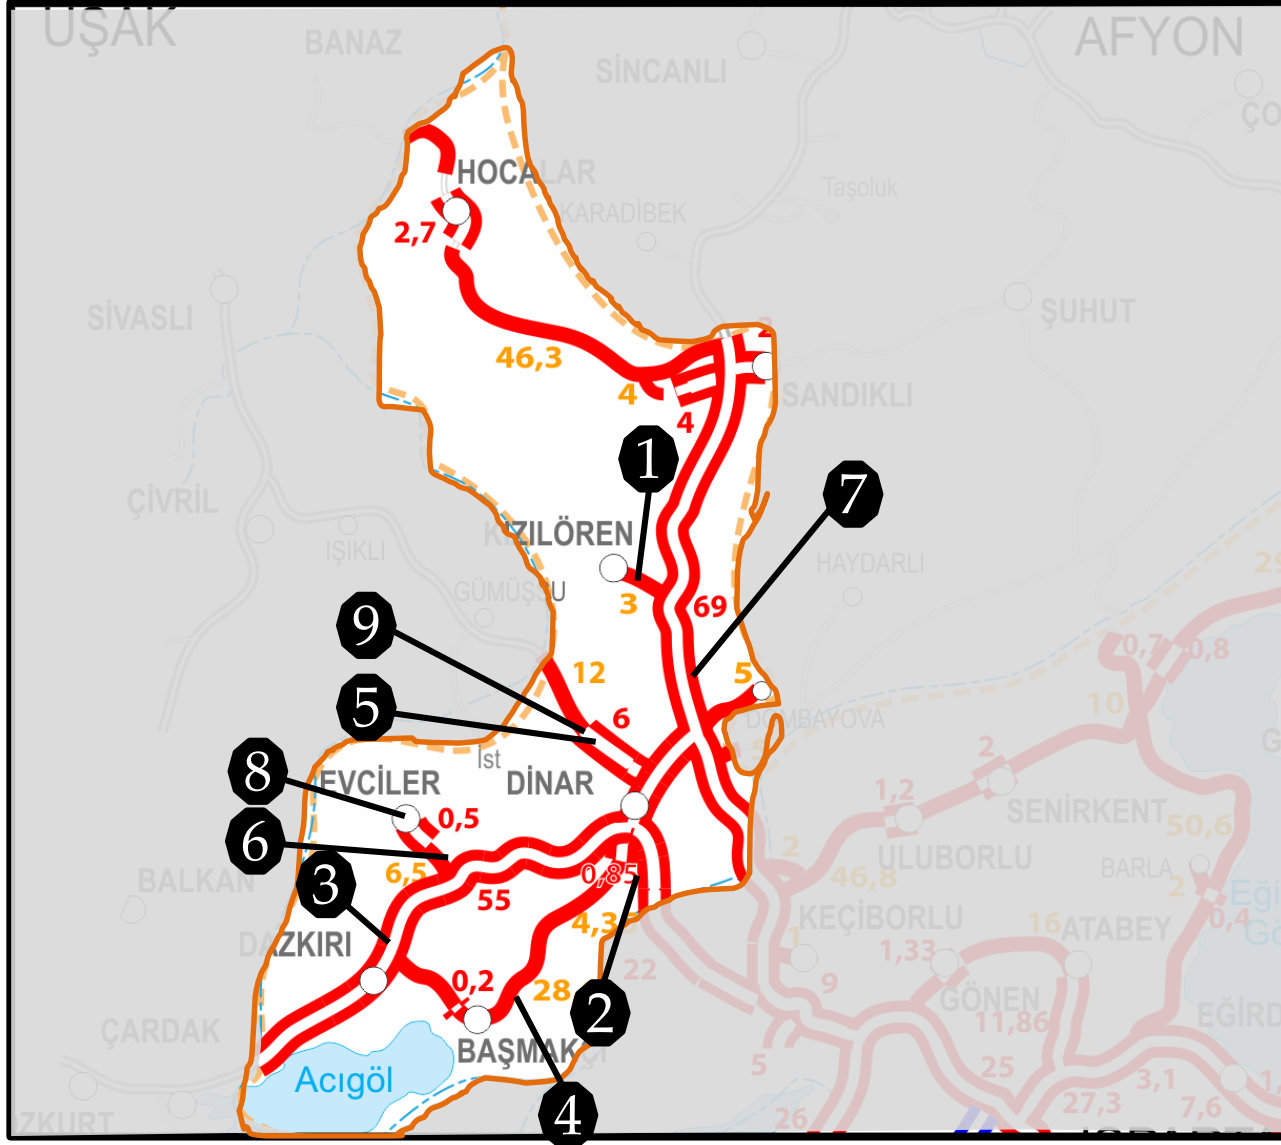

1. (AFYONKARAHİSAR-BURDUR) AYR.-
KIZILÖREN YOLU (3 KM TY/BSK)

2. KEÇİBORLU-DİNAR YOLU (7 KM BY/BSK)

3. DİNAR-DAZKIRI YOLU (55 KM BY/BSK)

4. DİNAR-BAŞMAKÇI-DAZKIRI YOLU
(1 KM BY/BSK, 22 KM TY/BSK)

5. DİNAR-ÇİVRİL YOLU
(5,6 KM BY/BSK, 12,4 KM TY/BSK)

6. DİNAR AYR.-EVCİLER YOLU
(0,5 KM BY/BSK, 6,5 KM TY/BSK)

7. AFYONKARAHİSAR-ANTALYA YOLU
(55 KM BY/BSK)

8. EVCİLER DDY ÜST GEÇİT KÖPRÜSÜ

9. DİNAR – ÇİVRİL YOLU DDY ÜST GEÇİT
KÖPRÜSÜ

Hizmete Açık Bölünmüş Yollar	
Yapım Çalışmaları Devam Eden Bölünmüş Yollar	
İhale Edilecek Bölünmüş Yollar	
Projesi Devam Eden Bölünmüş Yollar	
Hizmete Açık Tek Yollar	
Yapım Çalışmaları Devam Eden Tek Yollar	
İhale Edilecek Tek Yollar	



ARZ EDERİM

Hasan SARIOĞLAN
Bölge Müdürü

Organize 2 Köprülü Kavşağı

Kuzey Çevre Yolu
