



**KARAYOLLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA**



AFYONKARAHİSAR İLİ KOORDİNASYON

KURULU TOPLANTISI

17 OCAK 2025



AFYONKARAHİSAR İLİ YATIRIM DURUMU GÖSTERİR İCMAL DURUMU

1	YATIRIMCI KURULUŞUN ADI	Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü
2	SEKTÖRÜ	Ulaştırma
3	TOPLAM PROJE SAYISI	9
4	TOPLAM PROJE TUTARI	7,719 Milyar ₺
5	2023 SONU HARCAMA	4,442 Milyar ₺
6	2024 YILI TOPLAM ÖDENEK MİKTARI	726,940 Milyon ₺
7	2024 YILI DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	726,940 Milyon ₺
8	2024 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)	100
9	2024 YILI FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	100
10	BİTEN PROJE SAYISI	2
11	DEVAM EDEN PROJE SAYISI	7
12	BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	-
13	İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	-

Ayrıca Afyonkarahisar İlinde, Bakım, Trafik, Kamulaştırma çalışmaları ve diğer hizmetler için 264.318.795 TL harcama yapılmıştır.



KARAYOLLARI
3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BEDELİ	7,719 Milyar ₺
2023 SONU HARCAMA	4,442 Milyar ₺
2024 YILI ÖDENEĞİ	726,940 Milyon ₺
2024 YILI HARCAMA	726,940 Milyon ₺ (Ayrıca, Bakım ,Trf , Kamulaştırma vb. için 264.318.795 ₺ harcama yapılmıştır.)

AFYONKARAHİSAR İLİ YOL AĞI	
DEVLET YOLU	551 Km
İL YOLU	466 Km
TOPLAM	1.017 Km

BY ve BSK DURUMU	
BÖLÜNmüş YOL (Yol ağı dışına çıkan 9 km dahil)	595 Km
BSK'LI YOL (Yol ağına bulunan)	649 Km

2024 YILI		
	HEDEF	GERÇEKLEŞME
BY	3,5 Km	3,5 Km
BSK	3,5 Km	3,5 Km
TY	- Km	- Km
SK	34 Km	13,7 Km



KARAYOLLARI
3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

AFYONKARAHİSAR İL HARİTASI



İL SINIRI


ŞUBE SINIRI

BÖLGE SINIRI



KARAYOLLARI
3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

AFYONKARAHİSAR İLİ PROJELERİ

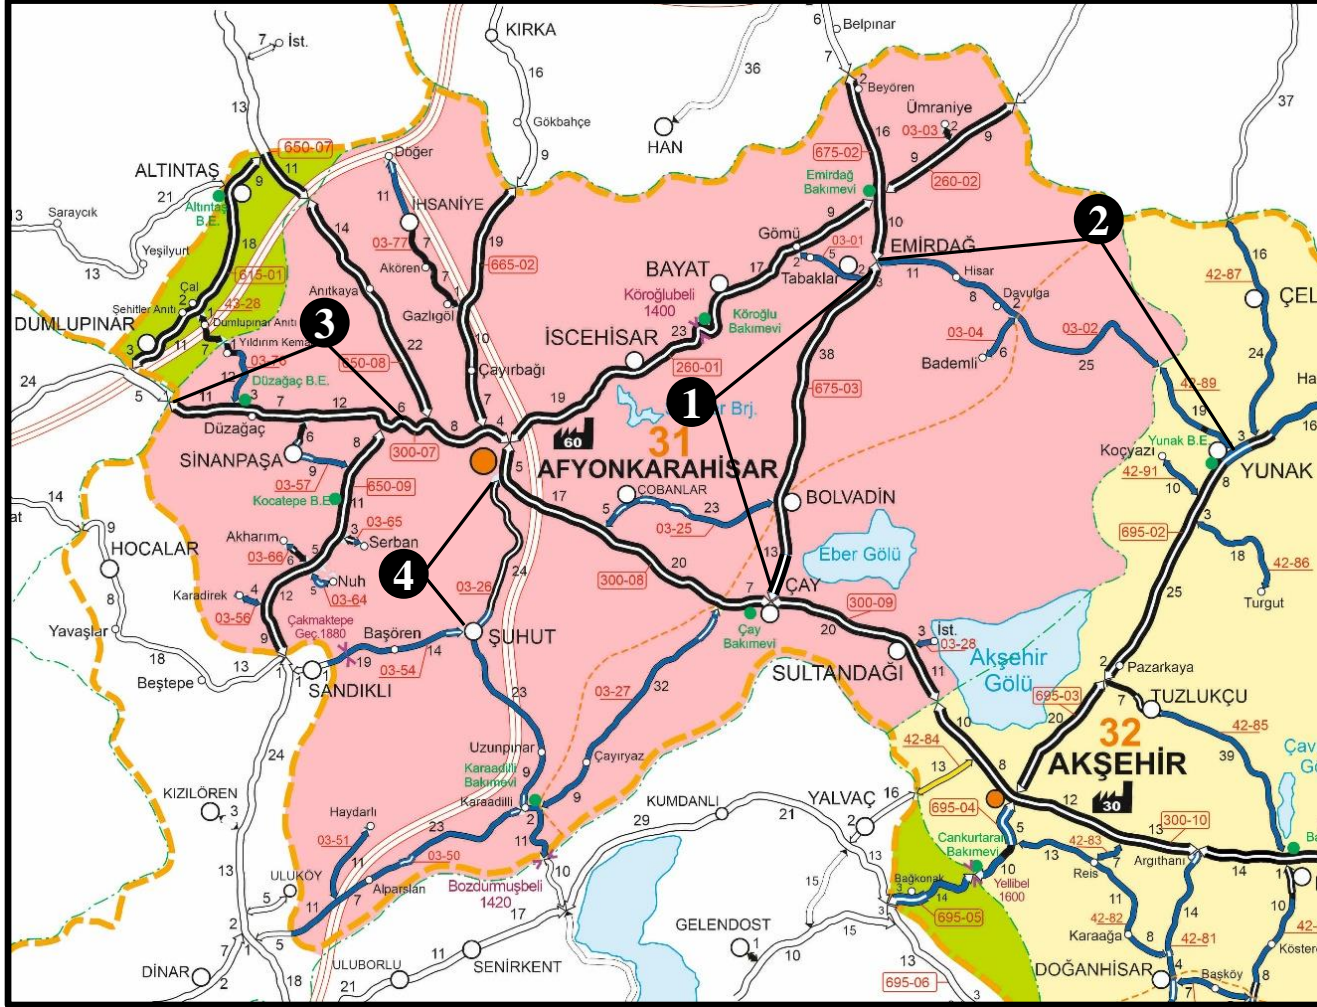

1 ÇAY-BOLVADİN-EMİRDAĞ YOLU

2 EMİRDAĞ-DAVULGA-YUNAK YOLU

3 AFYONKARAHİSAR-UŞAK YOLU

4 AFYONKARAHİSAR-ŞUHUT YOLU



İL SINIRI



ŞUBE SINIRI



BÖLGE SINIRI



KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



1-ÇAY-BOLVADİN-EMİRDAĞ YOLU

- ❑ Proje kapsamında 52,9 km BY-BSK yapım işi bulunmaktadır.
- ❑ 2023 sonu itibarıyla 49,4 BY-BSK yapımı tamamlanmıştır.
- ❑ 2024 yılında 20,5 km BY-Aşınma imalatı, 3,5 km BY-BSK ve DDY üstgeçit köprüsü tamamlanmış olup Km:29+100-29+450 arasında heyelan ıslahında çalışmalara devam edilmektedir.

MÜTEAHHİDİ: Kızılırmak İnş.




Km: 9+500



Km: 11+100



KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

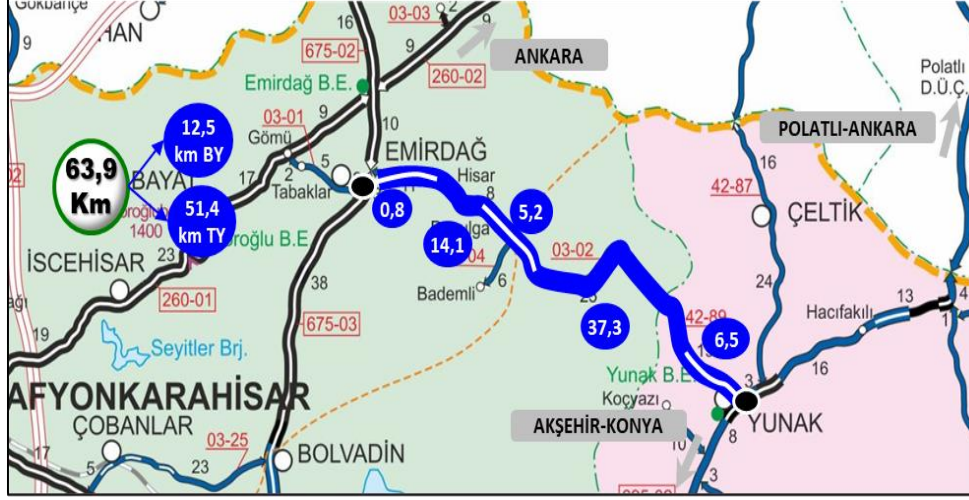

2-EMİRDAĞ - DAVULGA - YUNAK

- ❑ Proje bünyesinde yer alan 63,9 km BSK kaplamalı yol 12,5 km BY- 51,4 km TY olarak projelendirilmiştir.
- ❑ 2023 yılı sonu itibari ile toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılmıştır.
- ❑ 2024 yılında Km: 40+000-57+000 arası kesimde toprak işleri ve sanat yapıları seviyesinde çalışılmıştır.

MÜTEAHHİDİ:As-Yol&MKBE İnş




Km: 49+500



Km: 52+200



KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

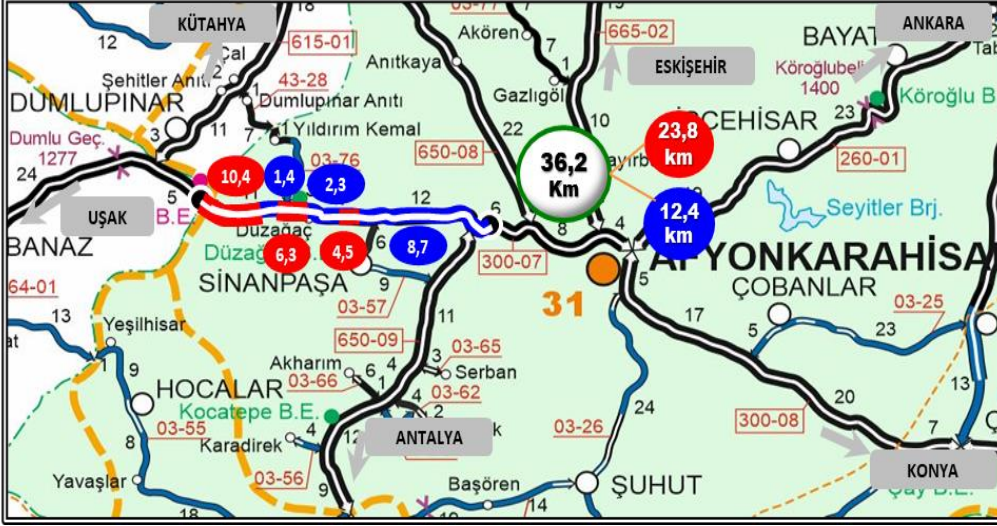

3- AFYONKARAHİSAR – UŞAK BSK ONARIMI:

- ❑ Proje kapsamında önceki yıllarda 36,2 km BY-BSK olarak tamamlanan güzergahta, BSK onarım işleri yer almaktadır.
- ❑ 2023 yılı sonu itibariyle 5 km BY-BSK onarımı yapılmıştır.
- ❑ 2024 yılında 18,8 km BY-BSK onarımı tamamlanmıştır.

MÜTEAHHİDİ: Öztaşoğlu İnş.




Km: 27+000



Km: 28+000



KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

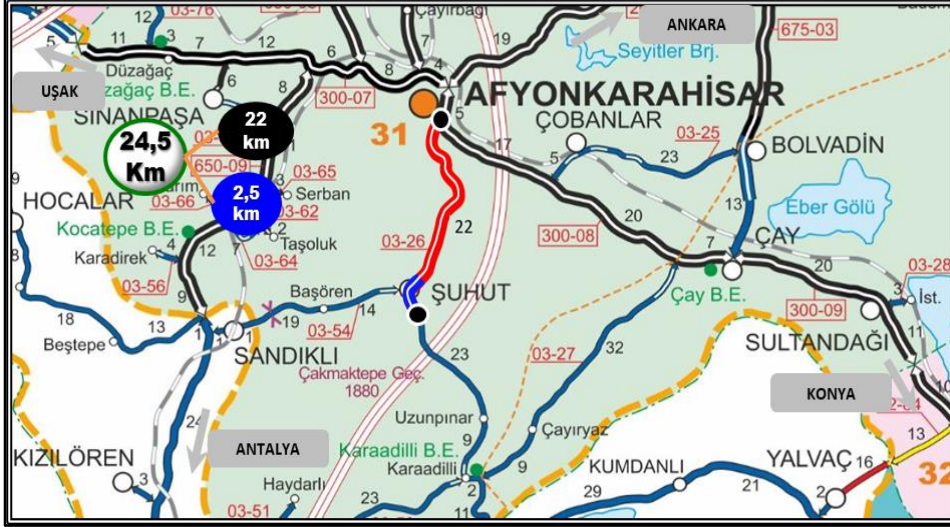

4- AFYONKARAHİSAR-ŞUHUT YOLU İKMAL İŞİ:

- ❑ Toplam 24,5 Km uzunluğunda BY-BSK standardındaki yolda 2023 yılı sonuna kadar önceki ihaleler kapsamında 22 Km'lik kesim binder seviyesinde bölünmüş yol olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır
- ❑ Proje kapsamında 24,5 Km uzunluğundaki kesimde 22 Km BY-Binder üstü Aşınma ile Şuhut şehir geçişinde 1,7 Km BY-BSK ve 0,8 Km TY-BSK imalatı yapılacaktır.
- ❑ 2024 yılında 5 km BY-Binder üstü Aşınma imalatı tamamlanmıştır.

MÜTEAHHİDİ: Öztaşoğlu İnş.



Km: 14+050



Km: 17+050



TRAFİK HİZMETLERİ

2024 yılında ayrıca;

- Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri için 133,7 Milyon ₺,
- Trafik Hizmetleri için 121,1 Milyon ₺,
- Kamulaştırma ve diğer hizmetler için 9,5 Milyon ₺ harcanmıştır.

2024 yılında

- 13,7 km sathi kaplama,
- 484.256 m² yatay işaretleme,
- 541 m² düşey işaretleme,
- 21.972 m otokorkuluk,
- 5 adet sinyalizasyon yapılmıştır.



665-02 K.K. No Afyonkarahisar- Eskişehir Devlet Yolu



KARAYOLLARI
3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAYOLLARI 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Arz Ederim .

Haluk Hakan İŞLER
Bölge Müdür Yardımcısı
