



7. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
ISPARTA

***AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ
İL KOORDİNASYON KURULU
1. DÖNEM TOPLANTISI
17.01.2025***

Etütler		Devam Eden Projeler		İhale Sürecindekiler		Tamamlanan Projeler	
TM	EİH	TM	EİH	TM	EİH	TM	EİH
154 kV İhsaniye TM	154 kV Afyon1 – Uşak EİH (Yenileme)	154 kV Bolvadin TM	-	154 kV Karaaslan TM	154 kV (Afyon-2 - Afyon Çimento) Brş. N. - Karaaslan EİH		154 kV (Emirdağ - Çay Seka) Brş. N. - Bolvadin EİH
-	154 kV Afyon-2 T Noktası - İhsaniye EİH	154 kV Karahisar GIS	-	154 kV Çay(Seka) TM Yenileme (Farklı Sahada)	154 kV İhsaniye - Altıntaş Brş N. EİH (TTFO)		154 kV Dazkırı - (Bozkurt - Dinar) Brş N. EİH
-	154 kV Toklucak - (Emirdağ - Sivrihisar) Brş N. EİH	154 kV Dazkırı TM	-	154 kV Toklucak TM	-		
-	400 kV Seydişehir – Afyon2 EİH(Yenileme)	-	-	-	-		
-	400 kV Afyon2 - Eskişehir EİH	-	-	-	-		

- Afyonkarahisar‘da Kuruluşumuzun devam eden 3, ihale aşamasında 5, etüt aşamasında 6, Tamamlanmış olan 2 adet projesi mevcuttur.

Sıra	Proje Adı	Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2024 Yılı Ödeneği	Dönem Sonu Harcama	Nakdi Gerç. %	Fiziki Gerç. %
1	154 kV Bolvadin TM	71.500.000 TL *	70.000.000 TL	1.500.000 TL	1.330.000 TL	88,67	35
2	154 kV Karaaslan TM	120.000.000TL	-	-	-	-	-
3	154 kV Afyon-2 T Noktası-İhsaniye EİH Yenileme (TTFO)	1.650.000 TL	2.000 TL	250.000 TL	-	-	-
4	154 kV Karahisar GIS TM	135.000.000 TL *	-	65.000.000 TL	59.886.000 TL	92,13	45
5	154 kV (Afyon-2 –Afyon Çimento) Brş. N.-Karaaslan EİH	16.000.000 TL	2.000 TL	2.000 TL	-	-	-
6	154 kV Çay(Seka) TM (Farklı Sahada)	70.000.000 TL	-	2.000 TL	-	-	-
7	154 kV İhsaniye TM	10.000 TL	-	7.000 TL	-	-	-
8	154 kV Dazkırı TM	106.420.000 TL*	40.000.000 TL	66.420.000 TL	44.421.000 TL	66,88	90
9	154 kV Toklucak TM	105.000.000 TL	-	10.000 TL	-	-	-
10	400 kV Afyon2 - Eskişehir EİH	5.000.000 TL	100.000 TL	1.030.000 TL	-	-	-

Not: * İhalesi yapılmış projelerin, Sözleşme bedelleri

- Afyonkarahisar‘da Kuruluşumuzun devam eden 3, ihale aşamasında 5, etüt aşamasında 6, Tamamlanmış olan 2 adet projesi mevcuttur.

Sıra	Proje Adı	Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2024 Yılı Ödeneği	Dönem Sonu Harcama	Nakdi Gerç. %	Fiziki Gerç. %
11	154 kV Afyon1 – Uşak EİH (Yenileme)	4.920.000 TL	2.000 TL	690.000 TL	-	-	-
12	154 kV İhsaniye - Altıntaş Brş N. EİH	60.000.000 TL	2.000 TL	102.000 TL	-	-	-
13	154 kV Toklucak-(Emirdağ-Sivrihisar) Brş N. EİH	2.430.000 TL	2.000 TL	365.000 TL	-	-	-
14	400 kV Seydişehir – Afyon2 EİH (Yenileme)	5.230.000 TL	-	-	-	-	-
Tamamlanan Projeler	154 kV (Emirdağ - Çay Seka) Brş. N.- Bolvadin TM EİH	20.888.000 TL*	-	20.002.000 TL	19.844.000 TL	99,21	100
	154 kV Dazkırı - (Bozkurt - Dinar) Brş N. EİH	31.124.000 TL*	-	28.000.000 TL	27.697.000 TL	98,92	100
	TOPLAM	755.172.000 TL	110.110.000 TL	183.380.000 TL	153.178.000 TL	83,53	30,93

Not: * İhalesi yapılmış projelerin, Sözleşme bedelleri

DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

1. 154 kV KARAHİSAR GAZ İZOLELİ TRANSFORMATÖR MERKEZİ

- Sözleşme Tarihi: 07/10/2022
- Sözleşme Bedeli: 135.000.000 TL
- İş Başlama Tarihi: 17/11/2022
- Süre Uzatımlı İş Bitiş Tarihi: 24.08.2025
- 2024 Yılı Ödeneği: 65.000.000 TL
- Dönem Sonu Harcama: 59.886.000 TL
- 17.11.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
 - Tesis çalışmaları devam etmektedir.



1. 154 kV KARAHİSAR GAZ İZOLELİ TRANSFORMATÖR MERKEZİ



2. 154 kV BOLVADİN TRANSFORMATÖR MERKEZİ

- Sözleşme Tarihi: 26/09/2022
- Sözleşme Bedeli: 71.500.000 TL
- İş Başlama Tarihi: 03/10/2022
- Süre Uzatımlı İş Bitiş Tarihi: 16.05.2025
- 2024 Yılı Ödeneği: 1.500.000 TL
- Dönem Sonu Harcama: 1.330.000 TL
- 03/10/2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
- Tesis çalışmaları devam etmektedir.



2. 154 kV BOLVADİN TRANSFORMATÖR MERKEZİ



3. 154 kV DAZKIRI TRAFİO MERKEZİ

- Sözleşme Tarihi: 27/04/2023
- Sözleşme Bedeli: 106.420.000 TL
- İş Başlama Tarihi: 06/05/2023
- Süre Uzatımlı İş Bitiş Tarihi: 09.03.2025
- 2024 Yılı Ödeneği : 66.420.000 TL
- Dönem Sonu Harcama: 44.421.000 TL
- 06.05.2023 Tarihinde Yer teslimi yapılmıştır.
- Tesis çalışmaları devam etmektedir.



3. 154 kV DAZKIRI TRAFİKO MERKEZİ



İHALE AŞAMASINDAKİ PROJELERİMİZ

1. 154 kV KARAASLAN TRANSFORMATÖR MERKEZİ

- 154 kV Trafo Merkezi Tesisi (Karaaslan TM).
- Proje Bedeli: 120.000.000 TL
- İstinaf Mahkemesi süreci kararı Teşekkülümüz lehine sonuçlanmıştır.
- Karaaslan TM Mera Vasıf Değişikliği talebimiz Mera Komisyonu tarafından reddedilmiştir.
- Alternatif alan çalışmalarımız devam etmektedir.

2. 154 kV ÇAY (SEKA) TM YENİLEME (FARKLI SAHADA)

- 154 kV Trafo Merkezi Tevsiat (Çay (Seka) TM).
- Proje Bedeli: 70.000.000 TL
- 2024 Yılı Ödeneği : 2.000 TL
- Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı ile Bölge Müdürlüğümüzce mahallinde incelemeler yapılmıştır.
- Mevcut Trafo merkezinde OG Şalt ve Kumanda Binası yenilemesi yerine Bolvadin TM tesisi sonrasında Çay(Seka) Trafo Merkezinin farklı bir sahada yenilenmesi konusunda mutabık kalınmış olup, alternatif saha çalışmalarımız devam etmektedir.

3. 154 kV TOKLUCAK TRAFİ MERKEZİ

- 154 kV Trafo Merkezi Tesisi (Toklucak TM)
- Proje Bedeli: 105.000.000 TL
- 2024 Yılı Ödeneđi : 10.000 TL
- İhale öncesi hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup; ihale edilmeye hazır durumdadır.

4. 154 kV (AFYON-2 - AFYON ÇİMENTO) BRŞ. N. - KARAASLAN EİH

- Hat uzunluğu: 2+2 km.
- Proje Bedeli: 16.000.000 TL.
- 2024 Yılı Ödeneği : 2.000 TL
- Teşekkülümüz Yatırım Programında 20D000012-23 proje numarası ile yer alan 154 kV, 1272 MCM karakteristiğinde, yaklaşık 2+2 km. uzunluğunda iki ayrı hat şeklinde tesis edilecek bağlantı hattımız için etüt süreci devam etmektedir.



5. 154 kV İHSANİYE – ALTINTAŞ BRŞ.N. EİH

- Hat uzunluğu: Yaklaşık 16 km
- Proje Bedeli: 60.000.000 TL.
- 2024 Yılı Ödeneği : 102.000 TL
- Teşekkülümüz Yatırım Programında 2020D00-149430-149468 proje numarası ile yer almaktadır.
- Etüt çalışmaları devam etmektedir.
- ÇED'e tabi olup; ÇED süreci devam etmektedir

6. 154 kV İHSANİYE TRAFİO MERKEZİ

- 154 kV Trafo Merkezi (İhsaniye TM).
- Proje Bedeli: 10.000 TL
- 2024 Yılı Ödeneđi : 7.000 TL
- İhale öncesi hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup; Yıl içerisinde ihale edilmesi beklenmektedir.

ETÜTLER GRUBUNDAKİ PROJELERİMİZ


1. 400 kV AFYON-2 - ESKİŞEHİR EİH

- Hat uzunluğu: 125 km.
- Proje Bedeli: 5.000.000 TL.
- 2024 Yılı Ödeneği : 1.030.000 TL
- Teşekkülümüz Yatırım Programında 20D000011-22 proje numarası ile etütler grubunda yer alan 400 kV, 3 B 1272 MCM karakteristiğinde, yaklaşık 125 km. uzunluğundaki Afyon2 - Eskişehir EİH projemiz için kurumlardan altlıklar toplanmaya başlanmıştır.
- Güzergah belirleme çalışmaları devam etmektedir.

2. 154 kV TOKLUÇAK -(EMİRDAĞ – SİVRİHİSAR) BRŞ. N. EİH

- Hat uzunluğu: 20+20 km.
- Proje Bedeli: 2.430.000 TL.
- 2024 Yılı Ödeneği : 365.000 TL
- 154 kV, 1272 MCM karakteristiğinde, yaklaşık 20+20 km. uzunluğunda iki ayrı hat şeklinde tesis edilecek hattımız için ihale öncesi çalışmalarımız devam etmektedir.
- ÇED'e tabi olup; ÇED süreci devam etmektedir.


3. 154 kV AFYON-2 T NOKTASI - İHSANIYE EİH (TTFO)

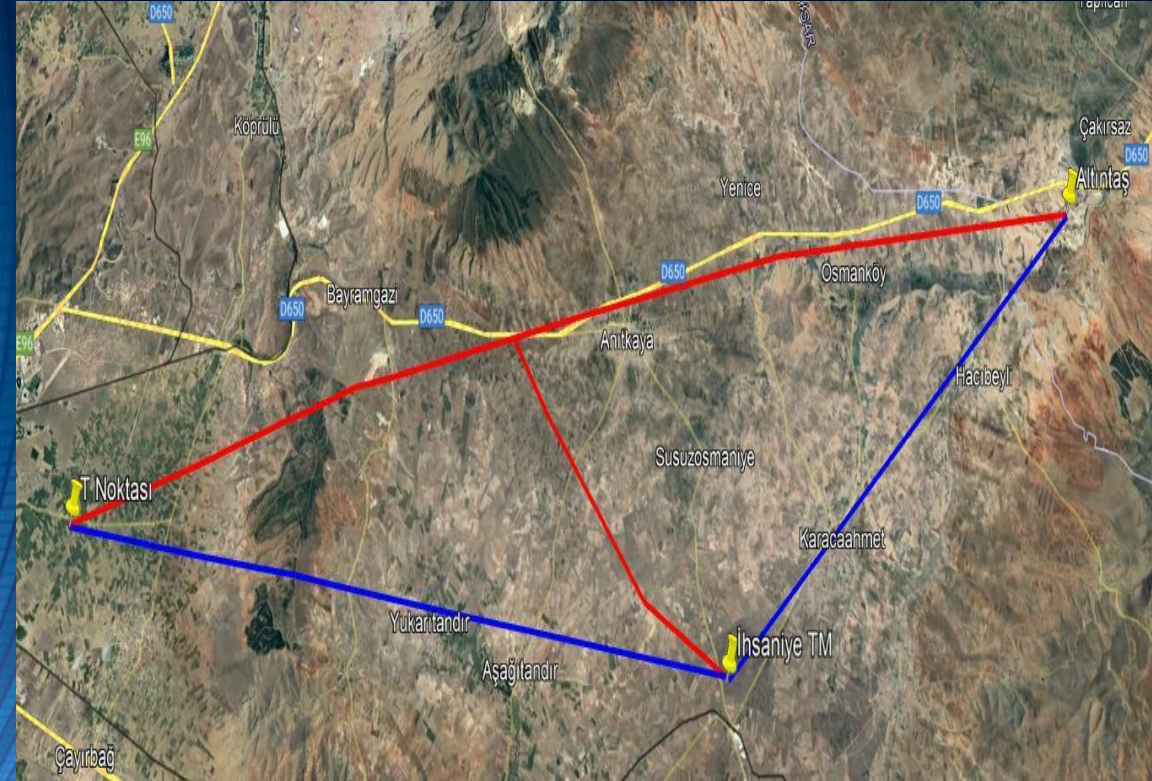

- Hat uzunluğu: 25 km.
- Proje Bedeli: 1.650.000 TL
- 2024 Yılı Ödeneği : 250.000 TL
- İhsaniye TM'nin Altıntaş ve Afyon2 TM'lerin arasına girmesi ile TM bağlantılarının Afyon- 2 T Noktası – İhsaniye ve İhsaniye – Altıntaş olacak şekilde revize edilmiştir.
- Etüt çalışmaları devam etmektedir.
- ÇED'e tabi olup; ÇED süreci devam etmektedir.

4. 154 kV AFYON 1 – UŞAK EİH (Yenileme)

- Hat Uzunluğu: 15+66 km.
- Proje Bedeli: 4.920.000 TL
- 2024 Yıllı Ödeneği : 690.000 TL
- Plan – Profil ve Tevziat Çalışmaları tamamlanan hattımız Uşak Karma OSB hattı ile eş zamanlı ihale edilecektir.
- Teşekkülümüz Yatırım Programında 18D00290-16 proje numarası ile yer alan hat 154 kV, 1272 MCM karakteristiğinde, yaklaşık 81 km., uzunluğunda hattımızın projemizin arazi ölçümü, plan, profil ve tevziat çalışmaları tamamlanmıştır. ihale öncesi çalışmalarımız devam etmektedir.

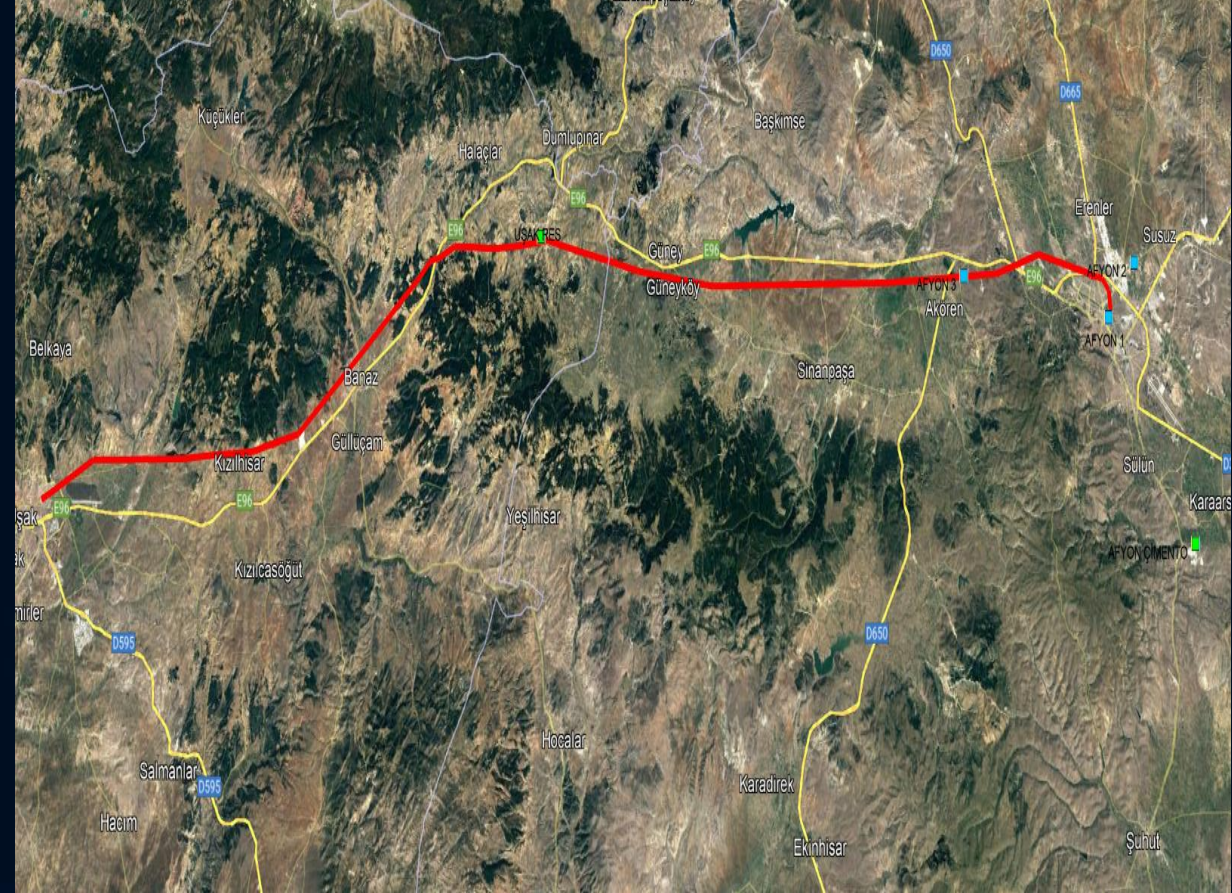

5. 400 kV SEYDİŞEHİR – AFYON2 EİH (YENİLEME)

- Hat uzunluğu: 190 km.
- Proje Bedeli: 5.230.000 TL
- Teşekkülümüz 2024 yılı yatırım programına 24D000011-2 proje numarası ile dahil olan hattımızın etüt çalışmaları devam etmektedir.

TAMAMLANMIŞ PROJELERİMİZ

1. 154 kV (EMİRDAĞ – ÇAY SEKA) BRŞ. N. – BOLVADİN EİH

- Hat uzunluğu: 1+1 km (İki ayrı hat)
- Sözleşme Bedeli: 20.888.000 TL
- 2024 Yılı Ödeneği : 20.002.000 TL
- Dönem Sonu Harcama: 19.844.000 TL
- İş Bitiş Tarihi: 13/07/2024
- Teşekkülümüz Yatırım Programında 2022D00-175939-176934 proje numarası ile yer alan 154 kV, 1272 MCM karakteristiğinde, yaklaşık 1+1 km. uzunluğunda iki ayrı hat şeklinde tesis edilecektir.
- 17.07.2024 Tarihinde geçici kabulü yapılmış olup; Hat enerjilendirilmiştir.

2. 154 kV DAZKIRI – (BOZKURT – DİNAR) BRŞ.N. EİH

- Hat uzunluğu: Yaklaşık 3+3 km (İki ayrı hat)
- Sözleşme Bedeli: 31.124.000 TL
- 2024 Yılı Ödeneği : 28.000.000 TL
- Dönem Sonu Harcama: 27.697.000 TL
- İş Bitiş Tarihi: 04/08/2024
- Teşekkülümüz Yatırım Programında 2023D00-194708-211555 proje numarası ile yer alan 154 kV, 1272 MCM karakteristiğinde, bağlantı hattımız iki ayrı hat şeklinde tesis edilecektir.
- 14.08.2024 Tarihinde geçici kabulü yapılmış olup; Hat enerjilendirilmiştir.



“Enerjinin Gücü”

    / kurumsalteias
www.teias.gov.tr

Saygılarımla arz ederim.

Ramazan AYYILDIZ
TEİAŞ 7. Bölge Müdürü
