



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

DSİ 18.Bölge Müdürlüğü
Afyonkarahisar İli Yatırımları
Osman ERKAN
Bölge Müdürü

18 Nisan 2025





TOPLAM PROJE SAYISI

110

DEVAM EDEN PROJE SAYISI

26

İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI

73

TAMAMLANAN PROJE SAYISI

11

TOPLAM PROJE TUTARI (TL)

14 210 090 000

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)

1 362 331 000

2025 YILI ÖDENEĞİ (TL)

239 302 000

DÖNEM SONU HARCAMA (TL)

11 999 000

PARASAL GERÇEKLEŞME (%)

10



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI



2025 Yılı Yatırım Programında Yer Alan İşler



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI



2025 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Büyük Su İşleri (21 Adet)



İŞ ADEDİ	İŞİN ADI	PROJE TUTARI (TL)	2025 YILI ÖDENEĞİ (TL)	YILI HARCAMA (TL)	NAKDİ GERÇ. (%)
21	TOPLAM	4 517 312 000	73 742 000	11 999 000	11
AFYONKARAHİSAR İLİ BÜYÜK SU İŞLERİ PROJELERİ	7 ADET SULAMA	1	BAYAT ASARCIK SULAMASI YENİLEME PROJESİ (1 447 ha)		
		1	Afyonkarahisar-Bayat Asarcık Göleti Sulaması Yenilemesi (1 447 ha)		
		2	ÇAY SELEVİR SULAMASI YENİLEMESİ PROJESİ (8 760 ha)		
		2	Afyonkarahisar Çay Selevir Sulaması Yenileme (2 866 ha)		
		3	Afyonkarahisar Çay Selevir Sulaması Yenileme 2. Kısım (2 042 ha)		
		4	Afyonkarahisar-Çay Selevir Sulaması Yenileme 3. Kısım (3 852 ha)		
		3	KARAKUYU (DOMBAY) POMPAJ SULAMASI YENİLEME 1. KISIM PROJESİ (1 200 ha)		
8 ADET İÇMESUYU	3 ADET ATIKSU	5	Afyonkarahisar-Dinar Karakuyu (Dombay) Pompaj Sulaması Yenileme 1. Kısım (1 200 ha)		
		6	Afyonkarahisar-Dinar Karakuyu (Dombay) Pompaj Sulaması Yenileme 1. Kısım Arazi Edinim Planlarının ve Arazi Edinim Planı İzleme Raporlarının Hazırlanması Danışmanlık Hizmetleri		
3 ADET ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ		7	Afyonkarahisar-Dinar Karakuyu (Dombay) Pompaj Sulaması Yenileme 1.Kısım Yapım işi için Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) Hazırlanması Danışmanlık Hizmetleri		



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI



2025 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Büyük Su İşleri (21 Adet)



AFYONKARAHİSAR İLİ BÜYÜK SU İŞLERİ PROJELERİ	4	AFYONKARAHİSAR İÇMESUYU PROJESİ 2. MERHALE
	8	Afyonkarahisar İhsaniye İçmesuyu Tesisleri (0,36 hm ³ /yıl)
	9	Afyonkarahisar Sandıklı İlçesi İçmesuyu Tesisleri (3,71 hm ³ /yıl)
	10	Afyonkarahisar Sinanpaşa Güney Beldesi İsale Hattı (0,31 hm ³ /yıl)
7 ADET SULAMA	11	Afyonkarahisar-Şuhut İlçesi İçmesuyu Tesisleri (1,6 hm ³ /yıl)
	12	Afyonkarahisar-Akarçay Havzası Bolvadin Dişli- Özburun Atıksu Arıtma Tesisi (1.900 m ³ /gün)
8 ADET İÇMESUYU	13	Afyonkarahisar-Akarçay Havzası Merkez Büyükkalecik Atıksu Arıtma Tesisi (850 m ³ /gün)
	14	Afyonkarahisar-Akarçay Havzası Merkez Gebeceler Atıksu Arıtma Tesisi (850 m ³ /gün)
	15	Afyonkarahisar-Emirdağ İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi (1,095 hm ³ /yıl)
	16	Afyonkarahisar-Kızılören İçmesuyu Tesisleri (8 km, 1,10 hm ³ /yıl)
3 ADET ATIKSU	17	Afyonkarahisar-Sandıklı İçmesuyu Arıtma Tesisi (18 000 m ³ /gün)
	18	Afyonkarahisar-Sinanpaşa Taşoluk Beldesi İçmesuyu Tesisleri İkmalî (0,54 hm ³ /yıl)
3 ADET ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ	5	ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ (28 325 ha)
	19	Afyonkarahisar 2.Kısım AT ve TİGH (16.869 ha)
	20	Afyonkarahisar 3.Kısım AT ve TİGH (9.500 ha)
	21	Afyonkarahisar-Bayat Asarcık Topplulaştırma Yolu ve Sanat Yapıları (1.956 ha)



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI



Afyonkarahisar İli Genel Vaziyet Planı



- 1) ÇAY SELEVİR SULAMASI YENİLEME PROJESİ
- 2) ÇOBANLAR SEYİTLER SULAMASI YENİLEME PROJESİ
- 3) BAYAT ASARCIK SULAMASI YENİLEMESİ
- 4) AFYONKARAHİSAR İÇMESUYU 2. MERHALE PROJESİ
- 5) AFYONKARAHİSAR-ÇAY VE BOLVADİN İÇMESUYU PROJESİ
- 6) KARAKUYU (DOMBAY) POMPAJ SULAMASI YENİLEME 1. KISIM
- 7) ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI



Çay Selevir Sulaması Yenileme Projesi



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI



AFYONKARAHİSAR ÇAY SELEVİR SULAMASI YENİLEME



Su Kaynağı Adı: Selevir Barajı		Su Kaynağı Durumu: İşletme		Su kaynağı F.G: %100	
Ana kanal: Borulu	Ana Boru: 30.198 m	Yerleşim Birimi Faydası: 1 ilçe, 3 kasaba, 6 köy			
Cazibe: 2.866 ha	Pompaj: -	Hm: -			
				Sulama Alanı	2 866 ha
				İhale Tarihi	07.02.2017
				Sözleşme Tarihi	14.04.2017
				Sözleşme Bedeli (TL)	44.658.000
				İşe Başlama Tarihi	24.04.2017
				Son İş Bitim Tarihi	18.07.2021
				Yüklenici	ETHAŞ+ENSAR
				2025 Yılı Fiyatlarıyla Maliyet (TL)	817.068.000
				2025 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyeti (TL)	8.881.000
				2025 Yılı Ödeneği (TL)	8.881.000
				2025 Yılı Revize Ödeneği (TL)	8.881.000
				2025 Yılı Harcaması (TL)	-
				Parasal Gerçekleşme (%)	99
				Fiziki Gerçekleşme (%)	100
İlave Ödenek İhtiyacı					
Açıklama: İş tamamlanmıştır. Kısmi Geçici Kabul yapılmıştır. İşletme ödemesi yapılacaktır.					
2024 yılı öncesi tamamlanan		2024 yılı tamamlanan		2025 yılı hedefi (Resmi KPI)	
2.866 ha		-		-	



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI



AFYONKARAHİSAR ÇAY SELEVİR SULAMASI YENİLEME 2. KISIM



Su Kaynağı Adı: Selevir Barajı		Su Kaynağı Durumu: İşletme	Su kaynağı F.G: %100	Sulama Alanı	2 042 ha
Ana kanal: Borulu	Ana Boru: 30.198 m	Yerleşim Birimi Faydası: 1 ilçe, 3 kasaba, 6 köy		İhale Tarihi	24.12.2020
Cazibe: 2.866 ha	Pompaj: -	Hm: -		Sözleşme Tarihi	19.03.2021
				Sözleşme Bedeli (TL)	35.959.000
				İşe Başlama Tarihi	29.03.2021
				Son İş Bitim Tarihi	18.08.2024
				Yüklenici	GÜRSESLİ+ARES
				2025 Yılı Fiyatlarıyla Maliyet (TL)	334.112.000
				2025 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyeti (TL)	12.477.000
				2025 Yılı Ödeneği (TL)	12.477.000
				2025 Yılı Revize Ödeneği (TL)	12.477.000
				2025 Yılı Harcaması (TL)	
				Parasal Gerçekleşme (%)	96
				Fiziki Gerçekleşme (%)	100
				İlave Ödenek İhtiyacı	-
				Açıklama: İş tamamlanmıştır. Geçici kabulü yapılmıştır. İşletme ödemesi yapılacaktır.	
				2024 yılı öncesi tamamlanan	2024 yılı tamamlanan
2.042 ha	-	-	-		



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI



AFYONKARAHİSAR ÇAY SELEVİR SULAMASI YENİLEME 3. KISIM



Su Kaynağı Adı: Selevir Barajı		Su Kaynağı Durumu: İşletme	Su kaynağı F.G: %100	Sulama Alanı	3 852 ha				
Ana kanal: Borulu	Ana Boru: 30.198 m	Yerleşim Birimi Faydası: 1 ilçe, 3 kasaba, 6 köy		İhale Tarihi	-				
Cazibe: 3.852 ha	Pompaj: -	Hm: -		Sözleşme Tarihi	-				
				Sözleşme Bedeli (TL)	-				
				İşe Başlama Tarihi	-				
				Son İş Bitim Tarihi	-				
				Yüklenici	-				
				2025 Yılı Fiyatlarıyla Maliyet (TL)	1.750.000.000				
				2025 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyeti (TL)	1.750.000.000				
				2025 Yılı Ödenegi (TL)	-				
				2025 Yılı Revize Ödenegi (TL)	-				
				2025 Yılı Harcaması (TL)	-				
				Parasal Gerçekleşme (%)	-				
				Fiziki Gerçekleşme (%)	-				
				İlave Ödenek İhtiyacı	-				
				Açıklama: 2025 Yılı Mayıs ayında ihale edilmesi hedeflenmektedir.					
				2024 yılı öncesi tamamlanan	2024 yılı tamamlanan	2025 yılı hedefi (Resmi KPI)	2026 ve sonrası hedefi		
-	-	1 000 ha	2 852 ha						



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI



Bayat Asarcık Sulaması Yenileme Projesi



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI



AFYONKARAHİSAR-BAYAT ASARCİK GÖLETİ SULAMASI YENİLEMESİ



Su Kaynağı Adı: Asarcık Göleti		Su Kaynağı Durumu: İşletme	Su kaynağı F.G: %100	Sulama Alanı	1 447 ha
Ana kanal: Borulu	Ana Boru: 15.198 m	Yerleşim Birimi Faydası: 1 ilçe, 1 kasaba		İhale Tarihi	07.12.2017
Cazibe: 1.447 ha	Pompaj: -	Hm: -		Sözleşme Tarihi	28.03.2018
				Sözleşme Bedeli (TL)	12.053.000
				İşe Başlama Tarihi	09.04.2018
				Son İş Bitim Tarihi	30.07.2024
				Yüklenici	ARES İnşaat
				2025 Yılı Fiyatlarıyla Maliyet (TL)	201.089.000
				2025 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyeti (TL)	3.379.000
				2025 Yılı Ödeneği (TL)	3.379.000
				2025 Yılı Revize Ödeneği (TL)	3.379.000
				2025 Yılı Harcaması (TL)	-
				Parasal Gerçekleşme (%)	98
				Fiziki Gerçekleşme (%)	100
				İlave Ödenek İhtiyacı	-
				Açıklama: İş tamamlanmıştır.	
2024 yılı öncesi tamamlanan		2024 yılı tamamlanan	2025 yılı hedefi (Resmi KPI)	2026 ve sonrası hedefi	
1 000		447 ha	-	-	



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI



Karakuyu (Dombay) Pompaj Sulaması Yenileme 1. Kısım




T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI



AFYONKARAHİSAR-DİNAR KARAKUYU (DOMBAY) POMPAJ SULAMASI YENİLEME 1. KISIM

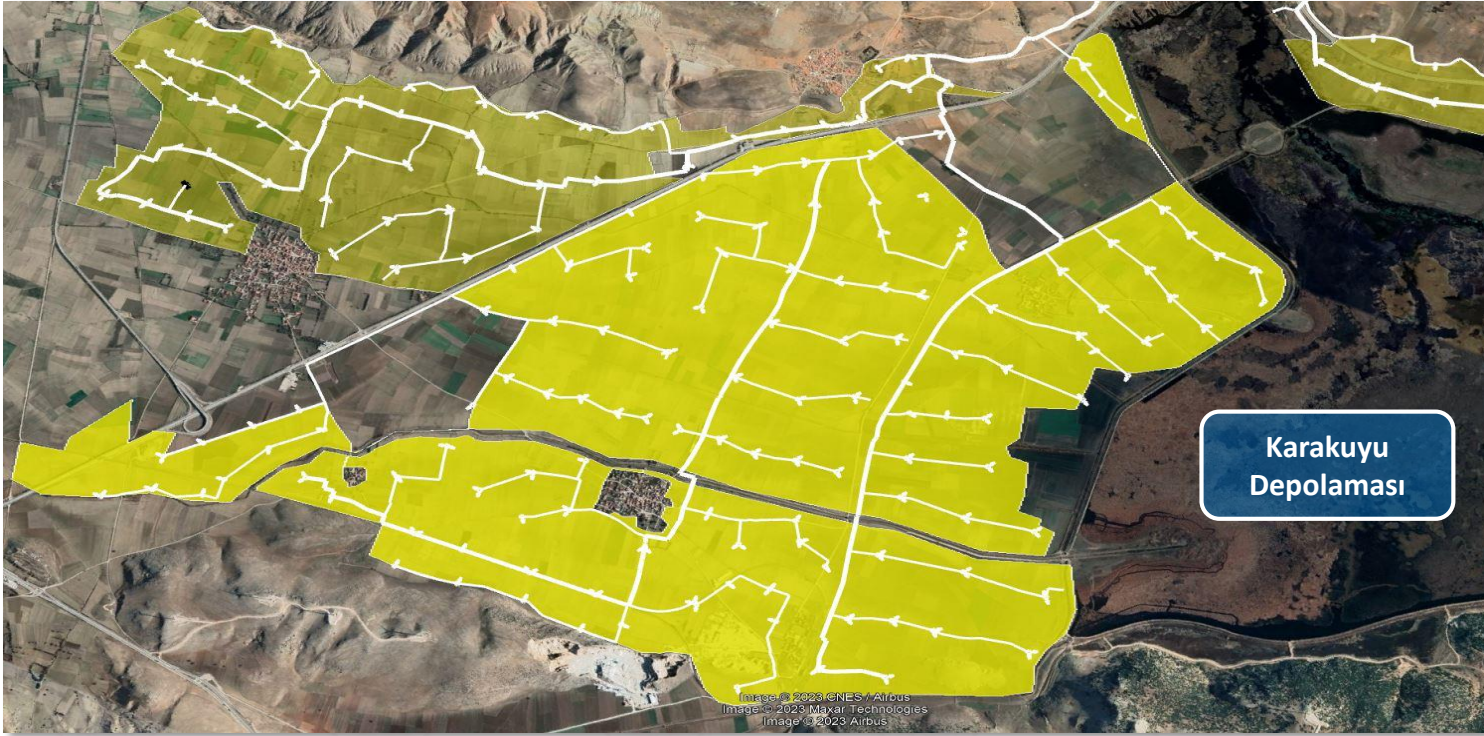

Su Kaynağı Adı: Karakuyu Depolama.		Su Kaynağı Durumu: İşletmede	Su kaynağı F.G: %100	Sulama Alanı	1 200 ha
Ana kanal: Borulu	Ana Boru: 15.580m	Yerleşim Birimi Faydası: 8 köy		İhale Tarihi	-
Cazibe: -	Pompaj: 3 064 ha	Hm: 59,7 m		Sözleşme Tarihi	-
				Sözleşme Bedeli (TL)	-
				İşe Başlama Tarihi	-
				Son İş Bitim Tarihi	-
				Yüklenici	-
				2025 Yılı Fiyatlarıyla Maliyet (TL)	550.000.000
				2025 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyeti (TL)	550.000.000
				2025 Yılı Ödeneği (TL)	-
				2025 Yılı Revize Ödeneği (TL)	-
				2025 Yılı Harcaması (TL)	-
				Parasal Gerçekleşme (%)	-
				Fiziki Gerçekleşme (%)	-
				İlave Ödenek İhtiyacı	-
				2024 yılı öncesi tamamlanan	
-		-	-	1 200 ha	
Açıklama: 2022 yılında yatırım programına alınan söz konusu işimizde sulama alanının (3.064 ha) bir kısmının (1.200 ha) Dünya Bankası Kredili olarak yapılması planlanmakta olup, İhale dokümanı evrakları 20.02.2023 tarihinde üst yazı ekinde Genel Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Süreç devam etmektedir.					



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI



Afyonkarahisar Arazi Topplulaştırma ve Tigh Projesi



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI



AFYONKARAHİSAR İLİ A.T VE T.İ.G.H PROJELERİ



SIRA NO	PROJE ADI	YERLEŞİM BİRİMİ SAYISI	FAYDASI (HA)	YILI FİYATLARIYLA TOPLAM MALİYET	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇ. (%)	TOPLULAŞTIRMADAN FAYDALANILACAK YERLEŞİM YERLERİ	YAPILAN ÇALIŞMALAR
1	Afyonkarahisar 2.Kısım AT ve TİGH	23	16.509	195.833.000		65	Çay İlçesi: Bulanık Köyü, Çayıryazı Köyü, Devederesi Köyü, Göcen Köyü, Kılıçyaka Köyü Dinar İlçesi: Belenpınar Köyü, Duman Köyü, Yeşilhüyük Köyü, Kabaklı Köyü, Kızıllı Köyü, Sütlaç Köyü, Yaka Köyü, Yüksel Köyü, Akgün Köyü, Karakuyu Köyü, Burunkaya Köyü, Gökçeli Köyü Dazkırı İlçesi: Sarıkavak Köyü Bolvadin İlçesi: Kemer kaya Köyü	Göcen Köyünün tapusu dağıtıldı. 6 Köy Kadastroda, 2 Köy Tapuda, 1 köy Merada, 1 Köy Tescile esas Asılacak, 1 Köyün Askısı Tamam ve 3 Köy sulamadan Dolayı Beklemede.
2	Afyonkarahisar 3.Kısım AT ve TİGH	19	10.000	164.200.000		7	Çay İlçesi: Aşağı Mahallesi, Aktaş Mahallesi, Pazarağaç/Afyon Mahallesi, Pazarağaç/Orta Mahallesi, Pazarağaç/Beşevler Mahallesi, Pazarağaç/Karabulut Mahallesi, Pazarağaç/Karacaören Mahallesi, Akkonak Kasabası, İnli Köyü, Maltepe Köyü, Kadıköy Köyü, Cumhuriyet Köyü, Orhaniye Köyü, Karamık Köyü Sultandağı İlçesi: Karakışla Köyü, Karapınar Köyü, Çukurcak Köyü, Üçkuyu Köyü	10 Yerleşimde Derecelendirme Askısı Yapıldı. Mülakatlara Başlanacak. Kanal Kapatma ve Kanalet Sökme Başlayacak
3	Afyonkarahisar -Bayat Asarcık Toplulaştırma Yolu ve Sanat Yapıları	2	1.854	30.277.000		-	Bayat ilçesi: Cumhuriyet ve Büyük mahalle	Projede sulama inşaatı tamamlandı arazi toplulaştırma yollarının yapımı bu yıl içerisinde tamamlanacaktır. Cumhuriyet Büyük mahallelerinde yer teslimi yapıldı. Mera tamam kadastro kontrollerine başlanacak yıl içerisinde tescilleri tamamlanacak.
TOPLAM		44	28.363	390.310.000		-		



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI



Küçük Su İşleri Projeleri (89 Adet)



İŞ ADEDİ	İŞİN ADI	PROJE TUTARI (TL)	2025 YILI ÖDENEĞİ (TL)	YILI HARCAMA (TL)	FAYDA (HA)	NAKDİ GERÇ. (%)	İŞİN DURUMU
89	TOPLAM	9 692 778 000	165 560 000	-	9 294	9	-
43	Taşkın Koruma	2 148 006 000	108 060 000	-	-	1	8 Adet İş Devam ediyor..
3	Geçirgen Tersip Bentleri	150 000 000	-	-	-	-	3 Adet İş İhale Edilecektir.
2	Yerüstü Sulamaları	286 948 000	-	-	1 104	68	1 Adet İş Tamamlanmıştır.
18	Yeraltısuyu Sulama Şebekeleri	1 353 419 000	22 500 000	-	3 162	-	4 Adet İş devam ediyor.
8	Gölet Sulamaları	737 041 000	-	-	2 076	15	2 Adet İş Tamamlanmıştır.
15	Gölet ve Sulamaları	5 017 362 000	35 000 000	-	2 952	9	2 Adet İş Tamamlanmıştır.



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI




Önemli KSi İşleri



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI



AFYONKARAHİSAR MERKEZ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ SULAMASI

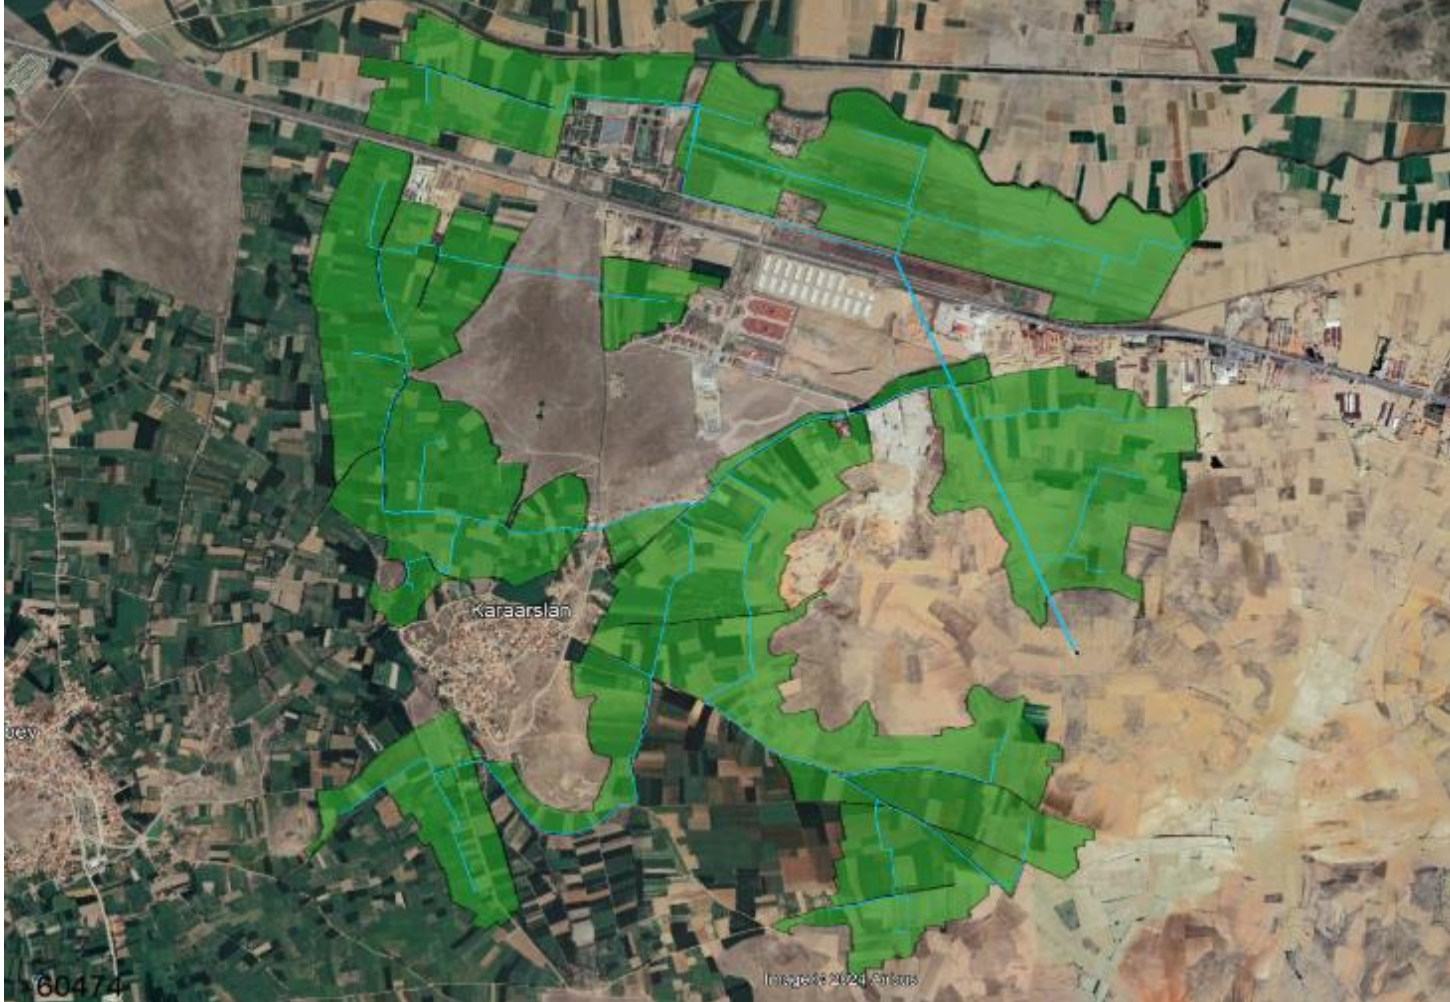

Sulama Alanı (ha)	938
Zirai Gelir Artışı (TL)	79.730.000
İhale Tarihi	12.12.2016
Sözleşme Tarihi	29.05.2017
Sözleşme Bedeli (TL)	36.022.000
İşe Başlama Tarihi	08.06.2017
Son İş Bitim Tarihi	26.07.2024
Yüklenici	Karaca İnşaat
2025 Yılı Fiyatlarıyla Maliyet (TL)	693.914.000
2025 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyet (TL)	18.318.000
2025 Yılı Ödeneği (TL)	2
2025 Yılı Revize Ödeneği (TL)	2
2025 Yılı Harcama (TL)	-
Parasal Gerçekleşme (%)	97
Fiziki Gerçekleşme (%)	100

Açıklama: Kısmi Geçici Kabulü yapılmıştır.

AFYONKARAHİSAR MERKEZ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ SULAMASI






T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI



AFYONKARAHİSAR SANDIKLI EŞÖREN GÖLETİ SULAMASI İKMALİ

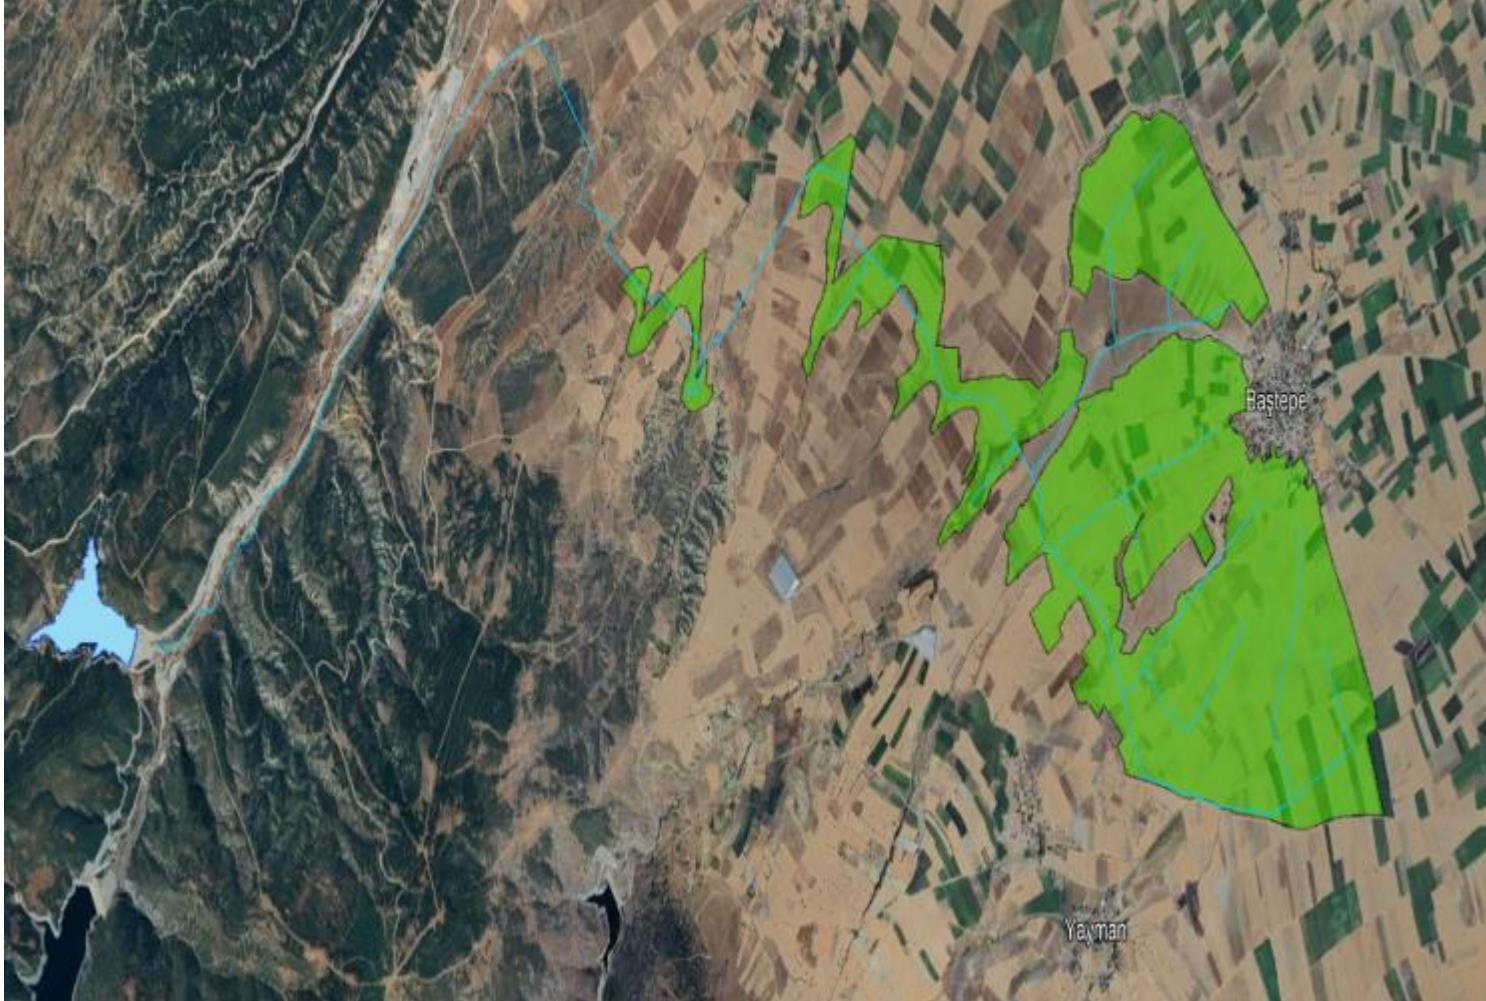

Sulama Alanı (ha)	519
Zirai Gelir Artışı (TL)	44.115.000
İhale Tarihi	06.07.2023
Sözleşme Tarihi	12.09.2023
Sözleşme Bedeli (TL)	66.789.000
İşe Başlama Tarihi	20.09.2023
Son İş Bitim Tarihi	14.11.2025
Yüklenici	Ares Harita
2025 Yılı Fiyatlarıyla Maliyet (TL)	140.398.000
2025 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyet (TL)	14.256.000
2025 Yılı Ödeneği (TL)	2
2025 Yılı Revize Ödeneği (TL)	-
2025 Yılı Harcama (TL)	-
Parasal Gerçekleşme (%)	90
Fiziki Gerçekleşme (%)	100

Açıklama: İş tamamlanmıştır.

AFYONKARAHİSAR SANDIKLI EŞÖREN GÖLETİ SULAMASI İKMALİ





T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI



AFYONKARAHİSAR – ŞUHUT BAŞÖREN TEKKE KAVAKLI GÖLETİ İKMALİ



Projenin Maksadı: 236 ha Sulama – 1,60 hm ³ İçmesuyu	Gövde Tipi: SSB	Gövde Hacmi: 0,225 hm ³	Projenin Maksadı	236 ha Sulama – 1,60 hm ³ İçmesuyu
Rezervuar Kaplama: Yok	Aktif Hacim: 1,950 hm ³	Gövde Yüksekliği: 39 m / 41.5 m (Talveg / Temel)	İhale Tarihi	30.01.2019
			Sözleşme Tarihi	03.05.2019
			Sözleşme Bedeli (TL)	51.282.000
			İşe Başlama Tarihi	13.05.2019
			Son İş Bitim Tarihi	08.06.2025
			Yüklenici	NVS + AK-YAL İnşaat
			2025 Yılı Fiyatlarıyla Maliyet (TL)	637 324 000
			2025 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyet (TL)	37 016 000
			2025 Yılı Ödeneği (TL)	10 000 000
			2025 Yılı Revize Ödeneği (TL)	10 000 000
			2025 Yılı Harcama (TL)	-
			Parasal Gerçekleşme (%)	94
			Fiziki Gerçekleşme (%)	99
			Açıklama: İş performans programına teklif edilmiştir. Bu sene iş tamamlanarak su tutulması planlanmaktadır. Gövde dolgusu yaklaşık 150.000 m ³ imalat yapılmış olup son 22.000 m ³ dolgu imalatı kalmıştır.	



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

ARZ EDERİM

