



**KARAYOLLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA**



AFYONKARAHİSAR İLİ KOORDİNASYON

KURULU TOPLANTISI

18 NİSAN 2025



KARAYOLLARI
3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

AFYONKARAHİSAR İLİ YATIRIM DURUMU GÖSTERİR İCMAL DURUMU

1	YATIRIMCI KURULUŞUN ADI	Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü
2	SEKTÖRÜ	Ulaştırma
3	TOPLAM PROJE SAYISI	7
4	TOPLAM PROJE TUTARI	8,021 Milyar ₺
5	2024 SONU HARCAMA	5,302 Milyar ₺
6	2025 YILI TOPLAM ÖDENEK MİKTARI	434,476 Milyon ₺
7	2025 YILI DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	3 Milyon ₺
8	2025 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)	%1
9	2025 YILI FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	%6
10	BİTEN PROJE SAYISI	1
11	DEVAM EDEN PROJE SAYISI	6
12	BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	-
13	İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	-

Ayrıca Afyonkarahisar ilinde, Bakım, Trafik, Kamulaştırma çalışmaları ve diğer hizmetler için 50.657.156,79 TL harcama yapılmıştır.



KARAYOLLARI
3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BEDELİ	8,021 Milyar ₺
2024 SONU HARCAMA	5,302 Milyar ₺
2025 YILI ÖDENEĞİ	434,476 Milyon ₺
2025 YILI HARCAMA	3 Milyon ₺ (Ayrıca, Bakım ,Trf , Kamulaştırma vb. için 50.657.156,79 ₺ harcama yapılmıştır.)

AFYONKARAHİSAR İLİ YOL AĞI	
DEVLET YOLU	551 Km
İL YOLU	466 Km
TOPLAM	1.017 Km

BY ve BSK DURUMU	
BÖLÜNMÜŞ YOL (Yol ağı dışına çıkan 9 km dahil)	596 Km
BSK'LI YOL (Yol ağına bulunan)	650 Km

2025 YILI		
	HEDEF	GERÇEKLEŞME
BY	1,7 Km	-
BSK	2,5 Km	-
TY	0,8 Km	-
SK	29 Km	-



KARAYOLLARI
3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

AFYONKARAHİSAR İL HARİTASI



İL SINIRI


ŞUBE SINIRI

BÖLGE SINIRI



KARAYOLLARI
3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

AFYONKARAHİSAR İLİ PROJELERİ

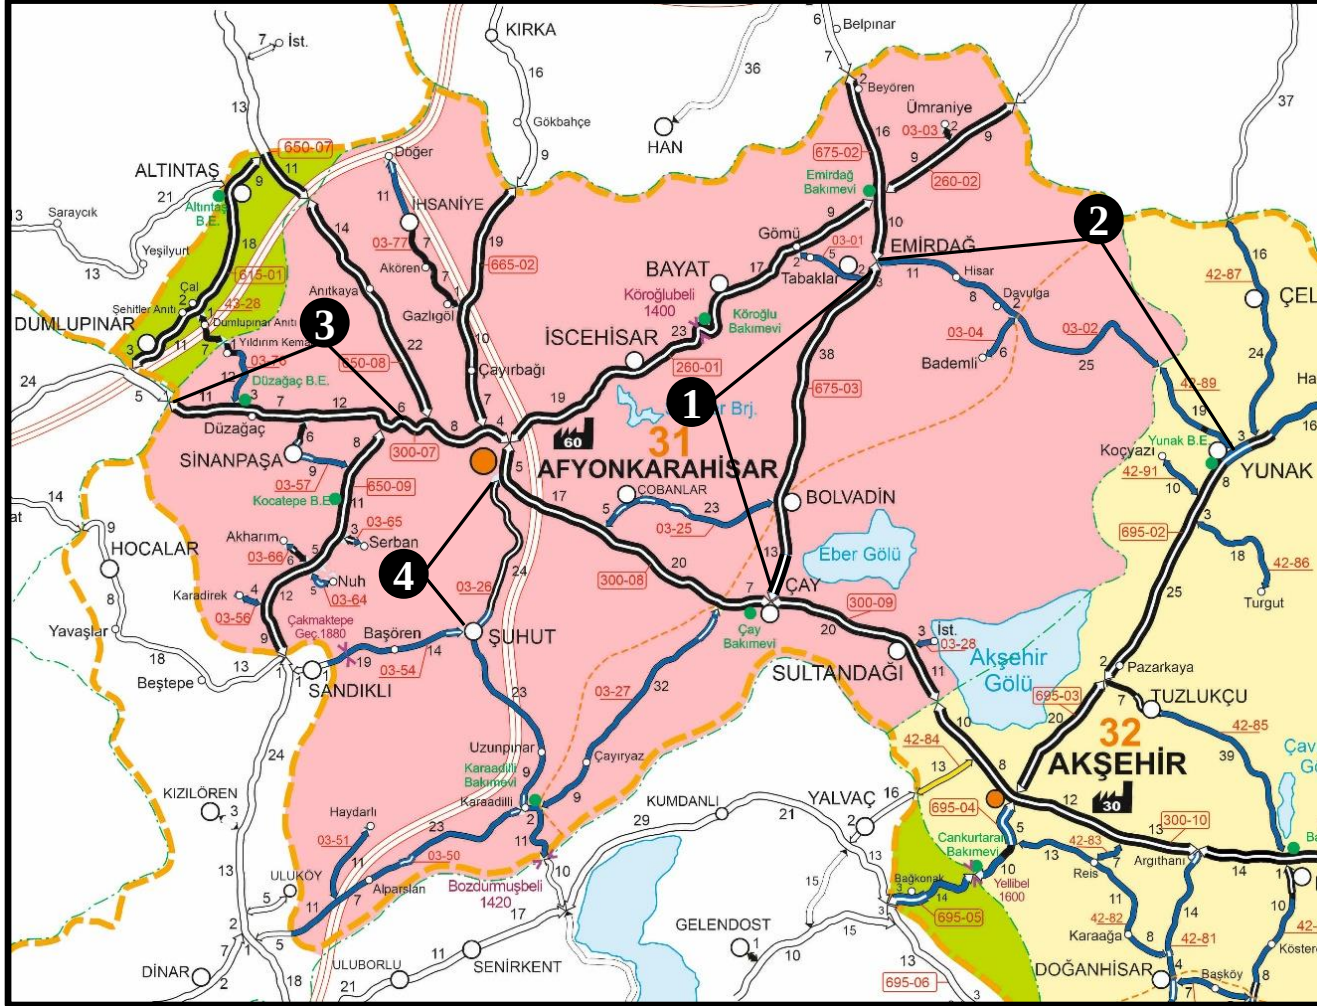

1 ÇAY-BOLVADİN-EMİRDAĞ YOLU

2 EMİRDAĞ-DAVULGA-YUNAK YOLU

3 AFYONKARAHİSAR-UŞAK YOLU

4 AFYONKARAHİSAR-ŞUHUT YOLU



İL SINIRI



ŞUBE SINIRI



BÖLGE SINIRI



KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



1-ÇAY-BOLVADİN-EMİRDAĞ YOLU

- ❑ Proje kapsamında 52,9 km BY-BSK yapım işi bulunmaktadır.
- ❑ 2024 sonu itibarıyla 52,9 BY-BSK yapımı tamamlanmıştır.
- ❑ 2025 yılında Km:11+800-21+800 arası kesimde 10 km BY-Aşınma ve heyelan ıslahında çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
- ❑ Projenin 2026 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

MÜTEAHHİDİ: Kızılırmak İnş.




Km: 29+100 - 29+450



Km: 11+100



KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

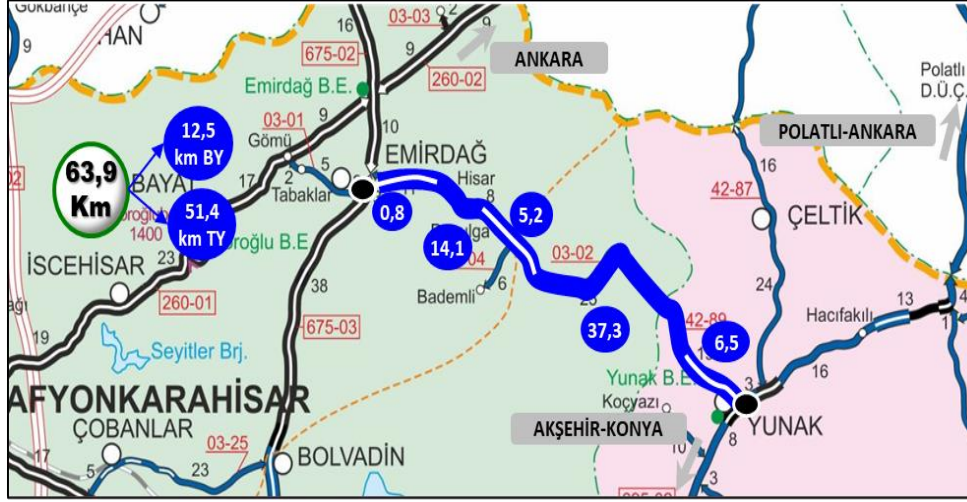

Km: 49+500



Km: 52+200


2-EMİRDAĞ - DAVULGA - YUNAK

- ❑ Proje bünyesinde yer alan 63,9 km BSK kaplamalı yol 12,5 km BY- 51,4 km TY olarak projelendirilmiştir.
- ❑ 2024 yılı sonuna kadar toprak işleri ve sanat yapıları seviyesinde çalışılmıştır.
- ❑ 2025 yılında Km: 40+000 - 58+000 arasında toprak işlerinde çalışma yapılması ve Km: 0+000 – 1+000 arasında Suvermez Kavşak bağlantısının Bölünmüş Yol olarak tamamlanması planlanmaktadır.
- ❑ Projenin 2028 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

MÜTEAHHİDİ:As-Yol&MKBE İnş



KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

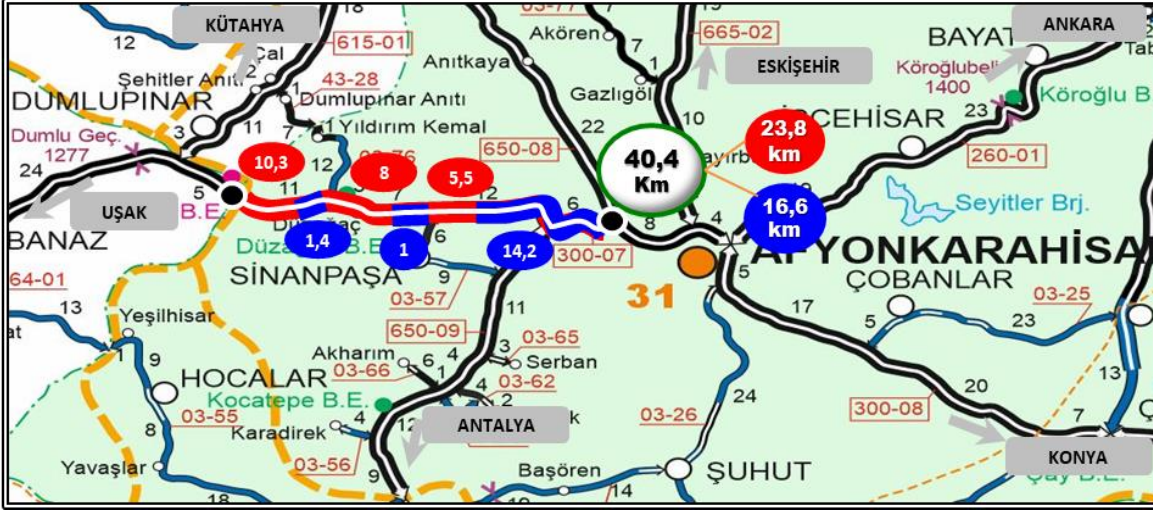

3- AFYONKARAHİSAR – UŞAK BSK ONARIMI:

- ❑ Proje kapsamında önceki yıllarda BY-BSK olarak tamamlanan 40,4 km'lik yolun BY-BSK onarım işleri yer almaktadır.
- ❑ 2024 yılı sonu itibariyle 23,8 km BY-BSK onarımı yapılmıştır.
- ❑ 2025 yılında Km:30+300-45+400 arası kesimde 15,1 km BY-BSK Onarımı yapılması planlanmaktadır.
- ❑ Projenin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

MÜTEAHHİDİ: Öztaşoğlu İnş.




Km: 27+000



Km: 28+000



KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

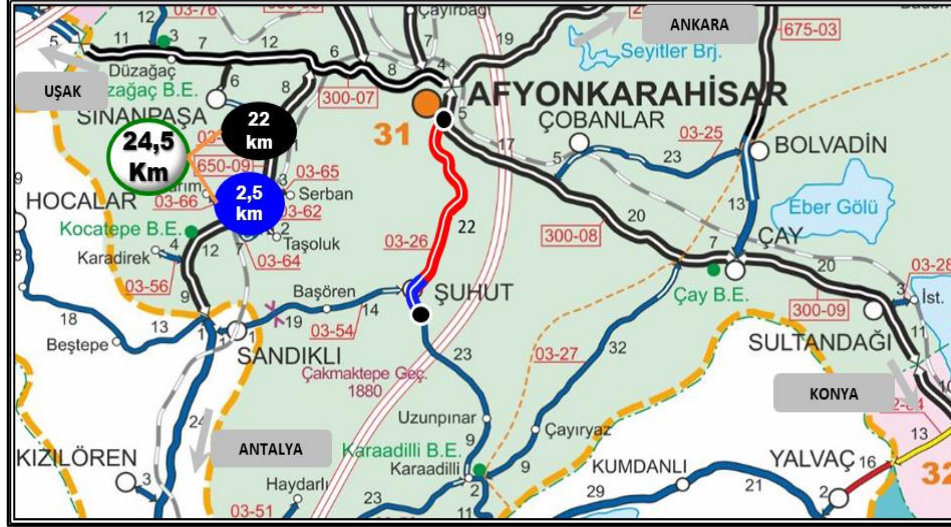

Km: 14+050



Km: 17+050

4- AFYONKARAHİSAR-ŞUHUT YOLU İKMAL İŞİ:

- ❑ Toplam 24,5 Km uzunluğunda BY-BSK standardındaki yolda 2023 yılı sonuna kadar önceki ihaleler kapsamında 22 Km'lik kesim binder seviyesinde bölünmüş yol olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır
- ❑ Proje kapsamında 24,5 Km uzunluğundaki kesimde 22 Km BY-Binder üstü Aşınma ile Şuhut şehir geçişinde 1,7 Km BY-BSK ve 0,8 Km TY-BSK imalatı yapılacaktır.
- ❑ 2024 yılı sonu itibariyle 5 km BY-Binder üstü Aşınma imalatı tamamlanmıştır.
- ❑ 2025 yılında Km:22+000-24+500 (1,7 Km BY-BSK, 0,8 Km TY-BSK) arası kesimin tamamlanması, aşınma imalatlarına devam edilmesi, Şuhut, Salar ve Sülün'de yağmur suyu drenajı ile tretuvar çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır.
- ❑ Projenin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

MÜTEAHHİDİ: Öztaşoğlu İnş.



KARAYOLLARI
3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TRAFİK HİZMETLERİ

2025 yılında ayrıca;

- Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri için 30,5 Milyon ₺,
- Trafik Hizmetleri için 11,5 Milyon ₺,
- Kamulaştırma ve diğer hizmetler için 8,5 Milyon ₺ harcanmıştır.

2025 yılında

- 1000 m otokorkuluk
- 11.390 m² yatay işaretleme
- 145 m² düşey işaretleme yapılmıştır.
- Afyonkarahisar Çevre Yolu Triovista mevkiinde ve Afyonkarahisar – Gazlıgöl – Kırka yolu Yurtlar Bölgesinde üstgeçit imalatları devam etmektedir.



665-02 K.K. No.lu Afyonkarahisar- Eskişehir Devlet Yolu



KARAYOLLARI
3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAYOLLARI 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Arz Ederim .

Gökhan KÖROĞLU
Bölge Müdürü
