

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJELERİN SEKTÖREL DAĞILIMI	ADEDİ
TURİZM	20
DİĞER	2
TOPLAM	22
2017 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ	6.648.266 TL
2017 YILI HARCAMA	2.302.420 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	%34
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%52

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sektörün Adı	Proje Adı	2017 Ödeneği	Dönem Sonu Harcama	AÇIKLAMALAR
Turizm	Akdağ TP Kır Lokantası	400.000	50.000	Kır Lokantası Yapımı
Diğer	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Projesi	50.000	0	Kedi Köpek Evi Yapımı
Turizm	Muhtelif İşler Akdağ Tabiat Parkı Bakım Onarım	180.000	180.000	Orman Köşklerinin Bakım onarımı
Turizm	26 Ağustos Tabiat Parkı Çevre Düzenleme	150.000	95.000	Çevre Düzenleme
Turizm	Akdağ Tabiat Parkı Çevre Düzenleme	150.000	36.000	Çeşme ve Orman Köşklerinin Çevre düzenlenmesi ve WC
Turizm	Akdağ Tabiat Parkı Makine Teçhizat Alımı	10.000	5.710	Kamera Alımı
Turizm	Plan Proje Yapımı	40.000	17.700	Yöresel Ürün Satış Stantları fikir proje ve mimari uygulama projeleri
Turizm	İstiklal Tanıtım Merkezi Maket Yapımı	141.000	0	Maket Yapımı
Turizm	Korunan Alanlara Kamelya Yapımı	900.000	0	Kamelya Yapımı

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sektörün Adı	Proje Adı	Program Ödeneği	Dönem Sonu Harcama	Açıklamalar
Turizm	Başkomutan TMP Ahmetpaşa-Çiğiltepe Şehitliği arası yol yapımı	621.800	621.800	Ahmetpaşa Günü Birlik Kullanım Alanı Yolun Kilit Parke Taşı Döşenmesi
Turizm	Başkomutan TMP Sinanpaşa-Çiğiltepe Şehitliği arası yol yapımı	309.100	309.100	Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği -Sinanpaşa Arası Yolun Kilit Parke Taşı Döşenmesi
Turizm	Başkomutan TMP Serban kasabası üzeri Kacatepe yolu	468.456	468.456	Serban Kocatepe yolu
Turizm	Başkomutan TMP (Şehitliklerin Bakım ve Onarımı)	100.000	72.000	Anıt ve Şehitliklerin Bakım-Onarım
Turizm	Başkomutan TMP (Çevre Düzenleme)	360.000	23.000	Sinanpaşa ve Tınaztepe GBKA
Turizm	Başkomutan TMP (Kır Lokantası)	551.000	321.000	Erkmen GBK Kır Lokantası
Turizm	Başkomutan TMP (Akharım Kasabası Çiğiltepe Şehitliği arası yol yapımı)	1.200.000	0	Akharım Kasabası-Çiğiltepe Şehitliği Arası yolun kilit parke taşı döşemesi

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sektörün Adı	Proje Adı	Program Ödeneği	Dönem Sonu Harcama	Açıklamalar
Turizm	Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi	18,000	0	Tanıtım Filmi Yapımı
Turizm	Başkomutan TMP (Altyapı ve Tesisler)	102.000	101.094	Erkmen Günü Birlik Kullanım Alanı 50 KW trafo ve enerji nakil hattı tesisi Yapımı
Turizm	Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi	2.000	1.650	Büyüktaarruz Şehitliğine tırpan alımı
Turizm	Başkomutan TMP (Erkmen GBKA Yol Yapımı)	185.000	0	Erkmen GBKA Yol Yapımı
Turizm	Başkomutan TMP (Erkmen GBKA Gözlem Kulesi)	110.000	0	Erkmen GBKA Gözlem Kulesi
Turizm	İstiklal Tanıtım Merkezi Önü Yol Yapımı (1,5 Km)	600.00	0	İhale Aşamasındadır.
TOPLAM		6.648.356	2.302.510	

AFYONKARAHİSAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



AKDAĞ TABİAT PARKI

İlçesi

Sandıklı

2017 yılı yatırımları

Akdağ TP Kır Lokantası Yapımı
Ödeneği : 400.000 TL



Kır lokantası ihalesi yapılmış olup, yer teslimi yapılmıştır. Fiziki Gerçekleşme % 30 'dur.

AKDAĞ TABİAT PARKI

İlçesi	Sandıklı
2017 yılı yatırımları	Akdağ TP Çevre Düzenleme Ödeneği : 150.000 TL



Akdağ Tabiat Parkında oyun parkı, çeşme yapılmıştır. 1 adet WC ihale hazırlığı yapılmaktadır. Fiziki gerçekleştirme %40'dir.

AKDAĞ TABİAT PARKI

İlçesi	Sandıklı
2017 yılı yatırımları	Akdağ TP Bakım Onarım Ödeneği : 180.000 TL



Akdağ TP'nin orman köşkerinin yarım ay kaplama ve ızalasyon projesi tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme %100'dür.

26 AĞUSTOS TABİAT PARKI

İlçesi	Sinanpaşa
2017 yılı yatırımları	26 Ağustos TP Çevre Düzenleme. Ödeneği : 150.000 TL



26 Ağustos Tabiat Parkına fidan dikimi, Elektrik hattı, Çok amaçlı binasının mantolama ve bakım onarım işleri yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme %70'dur.

26 AĞUSTOS TABİAT PARKI


İlçesi	Sinanpaşa
2017 yılı yatırımları	Muhtelif Sahalara Plan Proje yapımı Ödeneği : 40.000 TL



26 Ağustos Tabiat Parkı Yöresel Ürün Satış Standı fikir ve statik ve mimari proje yapımı tamamlanmak üzeredir. **Fiziki Gerçekleşme % 90 'dir.**

26 AĞUSTOS TABİAT PARKI

İlçesi	Sinanpaşa
2017 yılı yatırımları	İstiklal Tanıtım Merkezi maket yapımı Ödeneği : 141.000 TL

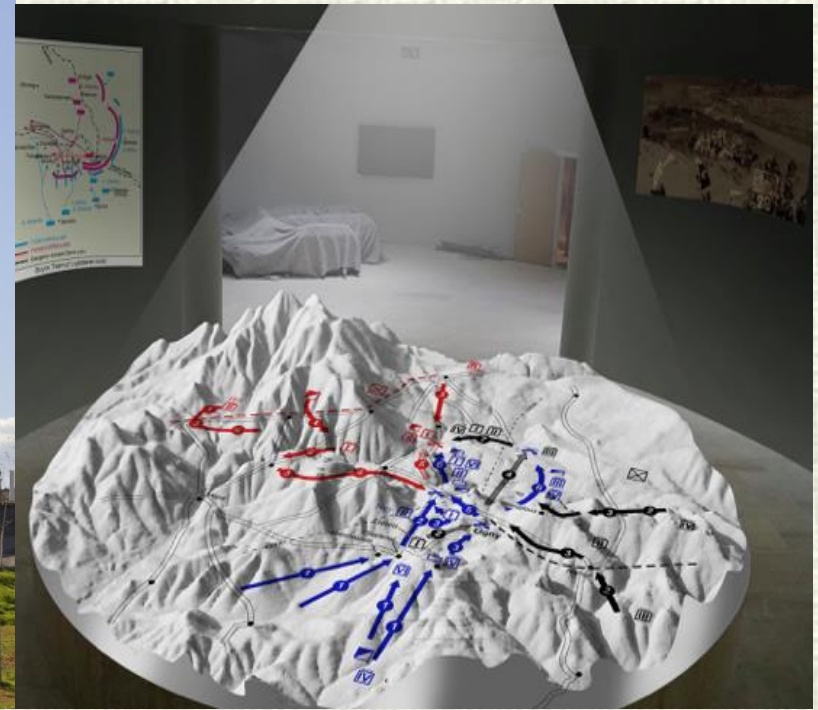

Geçici kabul aşamasında bulunan İstiklal Tanıtım Merkezi içerisine Büyük Taarruzun geçtiği alanın üç boyutlu arazi maketi yapımı işi ihale edilmiş olup; sözleşme aşamasındadır.

26 AĞUSTOS TABİAT PARKI

İlçesi	Sinanpaşa
2017 yılı yatırımları	İstiklal Tanıtım Merkezi önü yol yapımı Ödeneği : 600.000 TL



Geçici kabul aşamasında bulunan İstiklal Tanıtım Merkezi ile 26 TP arkası 1,5 Km'lik yol yapım ihalesi 14.07.2017 tarihinde yapılmıştır.

26 AĞUSTOS TABİAT PARKI

İlçesi	Muhtelif
2017 yılı yatırımları	Korunan Alanlara Kamelya Yapımı Ödeneği : 900.000 TL



Başkomutan Tarihi Milli Parkı içerisinde bulunan mola noktaları ve Korunan alanlarda kullanılmak üzere 400 adet kamelya yapımı ihalesi yapılmış olup; sözleşme aşamasındadır.



BAŞKOMUTAN TARİHİ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ



**TÜRK VATANINI EBEDİ ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTURAN
BÜYÜK TAARRUZ
26 AĞUSTOS 1922 SAAT 04:30**


20 Ağustos 1922 saat 16:00 Akşehir'de toplanan komutanlar 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz karar verdiler. Başkomutanlık Karargahı 24 Ağustos'ta Akşehir'den Şuhut'a geldi 24 Ağustos gecesi Kocatepe'ye hareket edildi. Aynı gece 30 Mehmetçikten oluşan öncü birlik ve muharebe birliği Kocatepe'ye çıktı. Başkomutan ve diğer komutanlar için sipir ve gözleme çukuru ve irtibat mekânı hazırlandı. 26 Ağustos gecesi Büyükkalecik köyü arka dağ eteklerinden ayaklarına keçeler sarılmış meşek, katır ve atları üzerinde bazen yaya olarak Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa 42 subay ve 35 erden oluşan karargah sabaha karşı Kocatepe'ye ulaştı.

26 Ağustos 1922 sabah 04:30'da planlanan Büyük Taarruz yoğun sis nedeniyle saat 05:00'de Topçu atıyla başladı. Düşmanın yitirce uğraşarak yaptığı tel engeller 2 saat içinde parçalanarak açılmış 27 Ağustos 1922 saat 17:30'da Afyonkarahisar düşman işgalinden kurtulmuş ve Başkomutanlık Karargahı Afyonkarahisar'a taşınmıştır.

Büyük Taarruzla başlayan büyük kükreyişle düşman Anadolu'dan kovulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Türk Uluşu ebediyen özgürlüğe kavuşmuştur.

Yüce Kahramanları Minnetle Anıyoruz.

BAŞKOMUTAN TARİHİ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

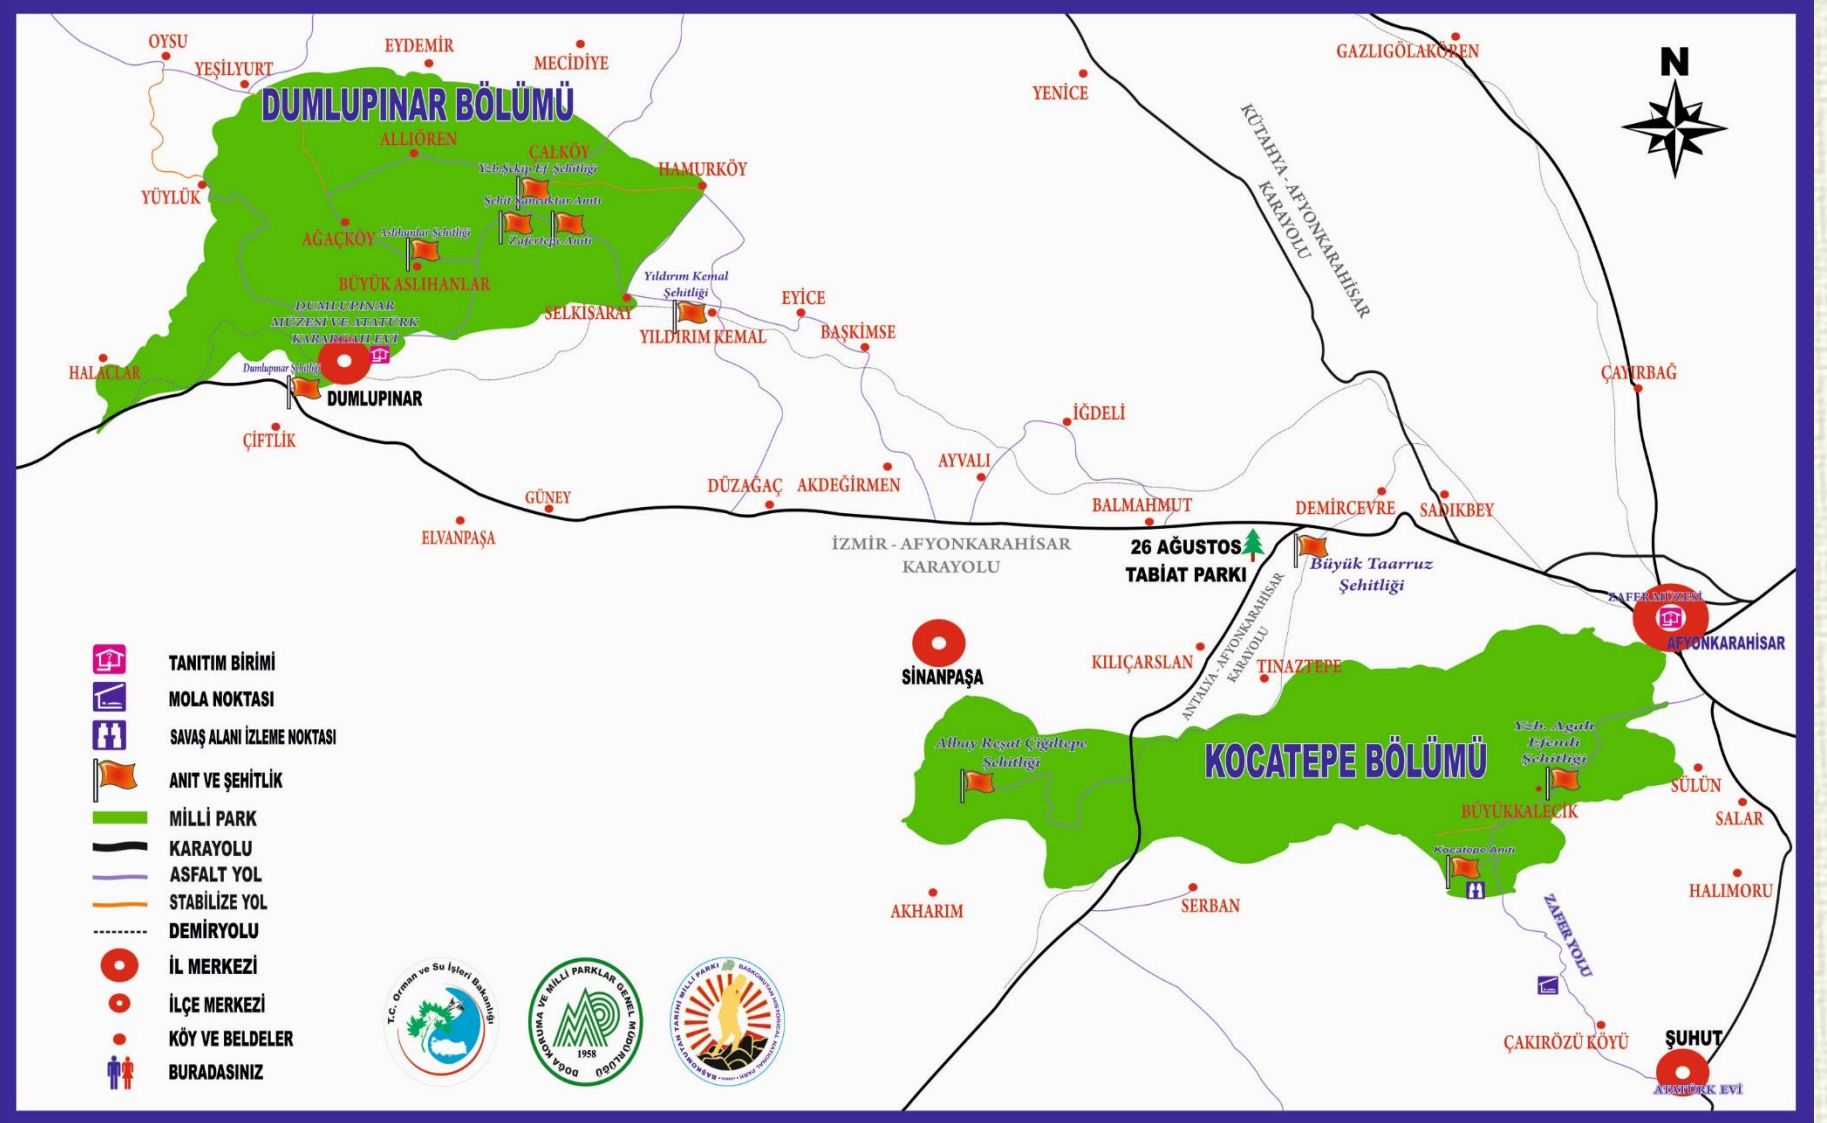

BAŞKOMUTAN TARIHI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

İlçesi	Sinanpaşa
2017 yılı yatırımları	Ahmetpaşa-Çiğiltepe Şehitliği arası yol yapımı Ödeneği: 621.800 TL



Ahmetpaşa –Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği arasındaki yol çalışmalarına 2016 yılında 1.200.000 TL ödenekle başlanmış olup, **proje tamamlanmıştır.**

BAŞKOMUTAN TARIHI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

İlçesi	Sinanpaşa
2017 yılı yatırımları	Sinanpaşa-Çiğiltepe Şehitliği arası yol yapımı Ödeneği: 309.100TL



Albay Reşat Çiğiltepe- Sinanpaşa arasındaki yol çalışmalarına 2016 yılında 1.112.000TL ödenekle başlanmış olup, **proje tamamlanmıştır.**

İlçesi	Sinanpaşa
2017 yılı yatırımları	Serban kasabası üzeri Kocatepe yolu Ödeneği: 468.456 TL



Antalya Yolundan Kocatepe'ye Çıkan Serban yolu çalışmalarına 2016 yılında 3.170.000 TL ödenekle başlanmış olup, **proje tamamlanmıştır.**



BAŞKOMUTAN TARİHİ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ



İlçesi	Sandıklı
2017 yılı yatırımları	Akharım Kasabası-Çiğiltepe Şehitliği arası yol yapımı Ödeneği: 1.200.000 TL



Albay reşat Çiğiltepe Şehitliği ile Akharım Kasabası arası yolu kilit parke taşı ile döşenmesi ihalesi 1.172.000 TL ihalesi yapılmış olup; sözleşmesi imzalanmıştır.

BAŞKOMUTAN TARIHI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

İlçesi	Merkez
2017 yılı yatırımları	Başkomutan TMP Trafo ve Enerji Hattı Ödeneği: 102.000TL



Erkmen Günü Birlik Kullanım Alanı 50 KW trafo ve enerji nakil hattı tesisi yapımı tamamlanmıştır.

BAŞKOMUTAN TARİHİ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

İlçesi	Merkez
2017 yılı yatırımları	Başkomutan TMP Kır Lokantası Ödeneği: 551.000 TL



Erkmen Günöbirlik Kullanım Alanı Kır Lokantası Yapımı devam etmektedir. Proje tamamlanmak üzeredir. Fiziki Gerçekleşme % 80 'dir.

BAŞKOMUTAN TARIHI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

İlçesi	Merkez
2017 yılı yatırımları	Başkomutan TMP Gözlem Kulesi Ödeneği: 110.000 TL



Erkmen Günöbirlik Kullanım Alanı gözlem kulesi yapımı ihalesi yapılmış olup; yapım aşamasındadır. Fiziki Gerçekleşme % 10 'dur.

BAŞKOMUTAN TARIHI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

İlçesi	Muhtelif
2017 yılı yatırımları	Başkomutan TMP Şehitliklerin Bakım Onarımı Ödeneği: 100.000 TL



Başkomutan TMP Müdürlüğü uhdesinde bulunan Şehitliklerin bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmaktadır. Fiziki Gerçekleşme % 80 'dir

İlçesi	Muhtelif
2017 yılı yatırımları	Başkomutan TMP Çevre Düzenleme Ödeneği: 360.000 TL



Çevre Düzenleme faaliyeti kapsamında Sinanpaşa ilçesi Kuruçay Göleti günü birlik kullanım alanı yapımı ihalesi yapılmış olup; sözleşme aşamasındadır.

BAŞKOMUTAN TARIHİ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ



Zafer Müzesinin Resterasyonu için ödenek Afyonkarahisar İl Özel İdaresine aktarılmış olup; Konya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından Yaklaşık Maliyeti hazırlanmaktadır.
