







**TCDD 7.Bölge Müdürlüğü**  
mıntıkasında bulunan 1361 km  
Demiryolu hattının 398 km ' si  
Afyonkarahisar İl sınırlarında  
bulunmaktadır.

**İl dahilinde 272 Memur 226 İşçi personel**  
görev yapmaktadır. Günlük 6 yolcu treni 20 yük Treni  
işletilmektedir. Bölge genelinde Yıllık 3 milyon ton  
yük dolumu, 1 milyon yolcu taşınması  
programımız vardır.

*AFYONKARAHİSAR İLİ*  
*2017 YILI*  
*YATIRIM DURUMU*

<b>1-TOPLANTI DÖNEMİ</b>	<b>:</b>	<b>2017/III</b>
<b>2-YATIRIMCI KURULUŞUN ADI</b>	<b>:</b>	<b>TCDD 7.Bölge Müdürlüğü -AFYONKARAHİSAR</b>
<b>3-TOPLAM PROJE SAYISI</b>	<b>:</b>	<b>51</b>
<b>4-PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI</b>	<b>:</b>	<b>Demiryolu-Ulaştırma</b>
<b>5-TOPLAM PROJE TUTARI</b>	<b>:</b>	<b>1.087.019.359 TL</b>
<b>6-ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI</b>	<b>:</b>	<b>429.342.882 TL</b>
<b>7-YILI ÖDENEĞİ</b>	<b>:</b>	<b>181.510.938 TL</b>
<b>8-DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA</b>	<b>:</b>	<b>72.892.796 TL</b>
<b>9-PARASAL GERÇEKLEŞME</b>	<b>:</b>	<b>40 %</b>
<b>10-FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	<b>:</b>	<b>40 %</b>
<b>11-BİTEN PROJE SAYISI</b>	<b>:</b>	<b>5</b>
<b>12-DEVAM EDEN PROJE SAYISI</b>	<b>:</b>	<b>23</b>
<b>13-İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI</b>	<b>:</b>	<b>17</b>
<b>14-BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI</b>	<b>:</b>	<b>6</b>
<b>15-BAŞLANMAMA NEDENLERİ</b>	<b>:</b>	<b>1 adet yatırım Afyonkarahisar Belediyesinin kamulaştırma çalışmalarını tamamlayamaması</b>
<b>16-ÇÖZÜMLENMESİ İSTENİLEN SORUN VE DARBOĞAZLAR</b>	<b>:</b>	<b>1 adet yatırım Afyonkarahisar Belediyesinin kamulaştırma çalışmalarını tamamlayamaması</b>
<b>17-SORUN VE DARBOĞAZLARIN NEDENİ</b>	<b>:</b>	<b>Kamulaştırma, diğer kurumlara ait deplaselerin yapılmaması.</b>
<b>18-ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER</b>	<b>:</b>	<b>Kamulaştırma, diğer kurumlara ait deplaselerin biran evvel yapılması.</b>



Sr. No	Sektörün Adı	Projenin Adı	Projenin Yeri	Başlama ve Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	Program Yılı Ödeneği	Dönem Sonu Harcama	Nakdi Gerç. (%)	Fiziki Gerç. (%)	Açıklamalar
1	Demiryolu Ulaştırma	7. Bölge Müdürlüğü dahilinde köprülerin kutu menfeze dönüştürülmesi ve menfezlerin uzatılması projelerinin hazırlanması mühendislik ve danışmanlık hizmetleri (%25'i Afyonkarahisar ilindedir)	Afyonkarahisar	2016-2017	103.707	8.730	94.978	11.573	20%	90%	Çalışmalar devam etmektedir.
2	Demiryolu Ulaştırma	7.Bölge Müdürlüğüne 20 adet 60 E1'lik Raya Uygun beton traversli makas temini ve montajı (ÇAMAF)(Eskişehir-Afyon Hattı) (10 adedi Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2016-2018	2.446.510		500			50%	Çalışmalar devam etmektedir.
3	Demiryolu Ulaştırma	7.Bölge Müdürlüğüne 18 adet 60 E1'lik Raya Uygun beton traversli makas temini ve montajı (ÇAMAF) (Afyon-Karakuyu Hattı)	Afyonkarahisar	2016-2018	4.403.718		1.000				Çamaf tarafından temin edilmesine müteakip çalışmalara başlanılacaktır.
4	Demiryolu Ulaştırma	7.Bölge Müdürlüğüne 62 adet 60 E1'lik Raya Uygun beton traversli makas temini ve montajı (ÇAMAF) (Afyon-Konya Hattı) (23 adedi Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2016-2018	5.626.973		371				Çamaf tarafından temin edilmesine müteakip çalışmalara başlanılacaktır.
5	Demiryolu Ulaştırma	7.Bölge Müdürlüğüne 22 adet 60 E1'lik Raya Uygun beton traversli makas temini ve ferşi (Alsacak-Eğirdir Hattı) (22 adet merkez VADEMSAŞ) (11 adedi Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2016-2017	2.691.161		2.691.161	2.352.970	87%	87%	Çalışmalar devam etmektedir.

SR. NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKDİ GERÇ. (%)	FİZİKİ GERÇL. (%)	AÇIKLAMALAR
6	Demiryolu Ulaştırma	7.Bölge Müdürlüğüne 21 adet 60 E1'lik raya uygun beton traversli makas temini ve ferşi (17 adedi Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar Sinanpaşa	2016-2017	3.987.486	2.527.900	1.178.478	954.006	87%	90%	Çalışmalar devam etmektedir.
7	Demiryolu Ulaştırma	7.Bölge Müdürlüğüne 40 adet 49 E1 raylı, beton traversli makas temini ve ferşi (Eskişehir-Afyon ve Afyon-Konya Hattı) (19 adedi Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2016-2017	3.840.776		3.840.776	2.840.500	74%	75%	Çalışmalar devam etmektedir.
8	Demiryolu Ulaştırma	7.Bölge Müdürlüğüne 11 adet 49 E1 raylı, beton traversli makas temini ve ferşi (Afyon-Karakuyu Hattı)	Sinanpaşa Sandıklı Kızıllören	2016-2017	2.255.508	1.676.400	579.108		74%	80%	Çalışmalar devam etmektedir.
9	Demiryolu Ulaştırma	7.Bölge Müdürlüğüne 31 adet 49 E1 raylı beton traversli makas temini ve ferşi (31 adet merkez VADEMSAŞ) (6 adedi Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2016-2017	1.301.712		1.301.712	1.111.181	85%		Çalışmalar devam etmektedir.
10	Demiryolu Ulaştırma	7. Bölge Müdürlüğü mntığında 41.482 m istasyon yol yenileme (29.616 mt yapılacak) (21.403 mt Afyonkarahisar ilindedir.)	Sandıklı Dinar Afyonkarahisar İhsaniye	2016-2017	20.982.694	8.072.953	3.310.570	545.900	41%	45%	Çalışmalar devam etmektedir.
11	Demiryolu Ulaştırma	Afyon-Sandıklı arası 65 km. yol yenilemesi	Afyonkarahisar Sandıklı	2016-2017	42.141.882	35.406.397	5.379.765	92.271	84%	85%	Çalışmalar devam etmektedir.



2017 YILI YATIRIM İZLEME RAPORU											
SR. NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKDİ GERÇ. (%)	FİZİKİ GERÇL. (%)	AÇIKLAMALAR
12	Demiryolu Ulaştırma	Karakuyu-Bozanönü arası 50 Km 49E1 Yol Yenilemesi (17 Km'si Afyonkarahisar ilinde)	Dinar	2016-2017	13.504.130	2.151.348	5.780.000	383.367	19%		Malzeme teminleri yapılmış olup Temmuz ayı içerisinde makinalı tamirat çalışmalarına başlanacaktır.
13	Demiryolu Ulaştırma	Dumlupınar-Afyon Arası 65 Km yol Yenilemesi tamamlama işi (51 Km'si Afyonkarahisar ilinde)	Afyonkarahisar Sinanpaşa	2016-2017	2.058.362	892.419	1.165.943	1.035.476	94%	100%	Çalışmalar tamamlanmıştır.
14	Demiryolu Ulaştırma	7.Bölge Müdürlüğü mıntıkasında 260 adet alüminotermit kaynağı yapılması Eskişehir-Konya (60 adedi Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2016-2017	46.800	27.750	19.050		59%	84%	Çalışmalar devam etmektedir.
15	Demiryolu Ulaştırma	7. Bölge Müdürlüğüne 12 adet 49 E1 raylı, aışap traversli makas temini ve ferşi	Afyonkarahisar	2016-2017	1.365.162	990.190	180.000	96.046	80%	90%	Çalışmalar devam etmektedir.
16	Demiryolu Ulaştırma	Sütlaç-Dinar istasyonları arası Km:374+294'de bulunan çelik köprünün yenilenmesi işi	Dinar	2016-2017	1.485.254		1.485.254	766.536	52%	55%	Çalışmalar devam etmektedir.
17	Demiryolu Ulaştırma	7.Bölge Müdürlüğü Yol Mekanik Atelye Müdürlüğüne Y08-50 tasnifli buraj makinesi için 1 adet BF6M1013 FC komple deutz motorunun aksesuarları ve montajı ile birlikte alımı.	Afyonkarahisar	2017-2017	80.878		80.878			5%	Çalışmalar devam etmektedir.

SR. NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKDİ GERÇ. (%)	FİZİKİ GERÇL. (%)	AÇIKLAMALAR
18	Demiryolu Ulaştırma	Eskişehir-Konya Hattı 169+900 - 172+400 arasında 1 Adet Sayding ve Yükleme Yollarının Yapılması	Afyonkarahisar	2017-2017	7.314.043		7.314.043				İhale aşamasındadır.
19	Demiryolu Ulaştırma	Eskişehir-Konya Hattı Km:193+500 İle Km:396+700 Arasında 8 Adet Sayding Yapılması ( 2 adedi Afyonkarahisar ilindedir.)	Çay	2017-2017	2.270.650		2.270.650				İhale aşamasındadır.
20	Demiryolu Ulaştırma	7. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında 21.235 m istasyon yolu yenilemesi ( 6.565 mt. Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2017-2017	5.480.608		2.389.014				İhale aşamasındadır.
21	Demiryolu Ulaştırma	7. Bölge mintıkasında 4.472 adet ray kaynağı yapılması ( 1983 adedi Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2017-2018	1.157.011		1.157.011				İhale aşamasındadır.
22	Demiryolu Ulaştırma	7. Bölge Müdürlüğüne 43 Adet 49 E1 Raylı Ahşap Traversli Makas Temini Ve Ferşi (Afyon-Konya Hattı, Alayunt-Balıkesir Hattı, Alsancak-Eğirdir Hattı, Basmane-Afyon Hattı, Kütahya-Seytiömer Hattı) ( 14 adedi Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2017-2018	3.489.335		326				Çamaf tarafından temin edilmesine müteakip çalışmalara başlanılacaktır.
23	Demiryolu Ulaştırma	7. Bölge Müdürlüğüne 31 Adet 49e1 Raylı Ve 22 Adet 60e1 Raylı Makas Topu Alımı ( 17 adedi Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2017-2017	97.013		97.013				İhale aşamasındadır.



SR. NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKDİ GERÇ. (%)	FİZİKİ GERÇL. (%)	AÇIKLAMALAR
24	Demiryolu Ulaştırma	Basmane - Afyonkarahisar Hattı Km:402+205 (1.50*1.50) Prefabrik Menfez Yapım İşi Ve Eskişehir - Konya Hattı Km: 114+260 (3x2.0x1.50) Prefabrik Menfez Yapım İşi	Afyonkarahisar İhsaniye	2017-2017	62.306		62.306				İhale aşamasındadır.
25	Demiryolu Ulaştırma	7.Bölge Müdürlüğü'nde 576 Adet Hemzemin Geçitte İşaret Levhası Yapılması İşi ( 224 adedi Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar Sandıklı Çay Çobanlar İhsaniye	2016-2017	891.743		899.519			35%	Çalışmalar devam etmektedir.
26	Demiryolu Ulaştırma	7. Bölge Müdürlüğü'nde 97 Adet Hemzemin Geçitte Kaplama Yapılması ( 30 adedi Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar Sandıklı Çay Sultandağı Sinanpaşa İhsaniye	2016-2017	558.006		558.006			1%	Çalışmalar devam etmektedir.
27	Demiryolu Ulaştırma	7. Bölge Müdürlüğü'nde 84 Adet Hemzemin Geçitte İşaret Levhalarının Yenilenmesi (24 adedi Afyonkarahisar ilindedir.)	Sinanpaşa Sandıklı Kızılören Dinar Sultandağı Çay Çobanlar İhsaniye Merkez	2016-2017	154.352		154.352	36.433	24%	55%	Çalışmalar devam etmektedir.
28	Demiryolu Ulaştırma	Eskişehir-Konya hattı km:159+852'da karayolu altgeçiti yapılması. (Afyon-Merkez OSB)	Afyonkarahisar	2016-2018	5.328.966		5.329.000				İlgili kurum ve kuruluşlara ait deplaseler için yeterli alan olmaması nedeniyle projenin değiştirilmesine karar verilmiştir.İşin tasfiye edilerek ikmal ihalesi için proje ve keşif hazırlığı yapılmaktadır.
29	Demiryolu Ulaştırma	Eskişehir-Konya hattı km:159+459'da karayolu altgeçiti yapılması. (Afyon-Merkez Gazlıgöl)	Afyonkarahisar	2016-2018	15.499.619		1.550.000				Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapılan kamulaştırma çalışmalarının bitmesine müteakip ihalesine çıkılacaktır.

SR. NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKDİ GERÇ. (%)	FİZİKİ GERÇ. (%)	AÇIKLAMALAR
30	Demiryolu Ulaştırma	7. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında hemzemin geçit yönetmeliği kapsamında 13 adet hemzemin geçide ait alt/üstgeçit projelerinin hazırlanması, Mühendislik ve danışmanlık hizmetleri (6 adedi Afyonkarahisar ilindedir.)	Sandıklı Dinar Afyonkarahisar Çobanlar	2016-2017	91.260	10.140	91.260		11%	20%	Çalışmalar devam etmektedir.
31	Demiryolu Ulaştırma	7. Bölge Müdürlüğü Hemzemin Geçitlerin İyileştirilmesi Etüt ve Proje işleri (Projelerin 64 adedi Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2017-2017	273.521		27.352				İhale aşamasındadır.
32	Demiryolu Ulaştırma	Dinar Gar sahasında bulunan muhtelif binalara doğal gaz dönüşümü işi	Dinar	2017-2017	384.084		384.084				İhale aşamasındadır.
33	Demiryolu Ulaştırma	Dazkırı Gar sahasına ihata yapılması	Dazkırı Afyonkarahisar	2017-2017	50.986		50.986				İhale aşamasındadır.
34	Demiryolu Ulaştırma	TMİ Merkezlerine Ses Kayıt Cihazı Alım İşİ (%25'i Afyonkarahisar ilindedir)	Afyonkarahisar	2017-2017	9.750		9.750				İhale aşamasındadır.
35	Demiryolu Ulaştırma	Afyonkarahisar Gar YHT ve Konveksiyonel hatlar için Kumanda merkezi binası yapılması.	Afyonkarahisar	21.6.2016-2017	8.144.100	5.034.782	5.000.000	3.569.380	94%	100%	27.03.2017 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.



SR. NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKDİ GERÇ. (%)	FİZİKİ GERÇL. (%)	AÇIKLAMALAR
36	Demiryolu Ulaştırma	Afyon-Karakuyu Yol Boyu sinyalizasyon Sistemleri Yapımı	Afyonkarahisar Sinanpaşa Sandıklı Kızıllören Dinar	22.06.2015 -2017	24.254.509	6.438.800	14.918.500	3.872.634	42%	16%	*Karakuyu'dan başlayarak toprak kazı, beton kanal ve kablo serim işleri devam etmektedir. *Ray devresi testleri başlayacaktır. *Proje kapsamında istasyonlar ile ilave yapılan Kızık, Örenkaya ve Kazanpınar saydinglerinde teknik bina inşaatları devam etmektedir. *Koruma altındaki Sandıklı ve Afyonşehir'de yapılacak teknik binalar için Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile yazışmalar devam etmektedir.
37	Demiryolu Ulaştırma	Afyon-Sandıklı, Isparta-Burdur-Karakuyu Hattı Toplam 150,602 Km Poz Aplikasyonu ve Güzergah Ölçümleri Yapılarak Sayısallaştırılma (72 km'si Afyonkarahisar İlindedir.)	Afyonkarahisar Sinanpaşa Sandıklı Dinar	2017-2017	364.499		364.499				İhale aşamasındadır.
38	Demiryolu Ulaştırma	72 YBOM ve 73 YBOM mntıkasında (Alayunt-Konya hat kesimi) toplam 324,30 km poz aplikasyonu ve güzergah sayısallaştırılması işi (132 km'si Afyonkarahisar İlindedir.)	Afyonkarahisar	2017-2017	423.393		423.393	869	1%		29.06.2017 tarihinde ihalesi yapılmış, teklif veren tek isteklinin iş bitirme belgesi uygun olmadığı için ihale iptal edilmiştir.
39	Demiryolu Ulaştırma	7.Bölge Müdürlüğü yeni Hizmet Binası ile Mekanik Atölye Binası Proje Hizmet Alımı İşi	Afyonkarahisar	2017-2017	650.000		650.000				İhale aşamasındadır. İhale dosyası Genel Müdürlükçe hazırlanmaktadır.

SR. NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKDİ GERÇ. (%)	FİZİKİ GERÇ. (%)	AÇIKLAMALAR
44	Demiryolu Ulaştırma	Polatlı-Afyonkarahisar Alt Yapı Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmet Alımı	Afyonkarahisar	2017-	1.500.000		745.277	745.277	50%	50%	Genel Müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir.
45	Demiryolu Ulaştırma	Banaz-Afyonkarahisar Alt Yapı Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmet Alımı	Afyonkarahisar	2017-	500.000		500.000				Genel Müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir.
46	Demiryolu Ulaştırma	Ankara-Afyonkarahisar Hızlı Tren Projesi (%60 Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2017-	427.803.713	342.200.000	45.000.000	38.400.000	52%	45%	Çalışmalar devam etmektedir.
47	Demiryolu Ulaştırma	Afyonkarahisar-Uşak Hızlı Tren Projesi (%50 Afyonkarahisar ilindedir.)	Afyonkarahisar	2017-	439.500.000	23.905.073	37.500.000	16.000.000	5%	10%	Çalışmalar devam etmektedir.

SR. NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKİ GERÇ. (%)	FİZİKİ GERÇ. (%)	AÇIKLAMALAR
48	Demiryolu Ulaştırma	Eskişehir-Afyonkarahisar Demiryolu Projesi Etüt Proje Mühendislik ve Danışmanlık Hizmet Alımı	Afyonkarahisar	2017-	8.892.500		3.417.500			50%	Çalışmalar devam etmektedir.
49	Demiryolu Ulaştırma	Afyon Beton Travers Fabrikası Kazan Besi Suyu Şartlandırma Sistemi	Afyonkarahisar	2017-2017	13.000		13.000	11.500	88%	100%	Çalışmalar tamamlanmıştır.
50	Demiryolu Ulaştırma	Afyon Beton Travers Fabrikası Güvenlik Kamerası Modernizasyon Sistemi	Afyonkarahisar	2017-2017	65.490		71.000	65.490	100%	100%	Çalışmalar tamamlanmıştır.
51	Demiryolu Ulaştırma	Afyon Beton Travers Fabrikası Betoniyer Kumanda Odasına Klima Alımı	Afyonkarahisar	2017-2017	1.386		2.750	1.386	100%	100%	Çalışmalar tamamlanmıştır.
<b>TOPLAM :</b>					<b>1.087.019.359</b>	<b>429.342.882</b>	<b>181.510.938</b>	<b>72.892.796</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	

Sözleşme Tarihi 16.06.2016

Yer Teslimi 21.06.2016

İşin Süresi 240 Gün

İş Bitim Tarihi 27.03.2017

İhale Bedeli 8.144.100 TL

Projenin ilerleme durumu fiziki % 100, parasal %94 tür.



( Afyon-Denizli- Burdur- Isparta )

303 Km' lik hat kesiminin 112 Km' lik ilk etabı (Karakuyu-Afyon) ihale edilmiştir.



Sözleşme Tarihi 09.06.2015

Yer Teslimi 22.06.2015

İşin Süresi 690 + 240 + 203 Gün

İş Bitim Tarihi 30.11.2017


İhale Bedeli 24.254.509 TL

Projenin ilerleme durumu fiziki % 16, parasal %43 dür.







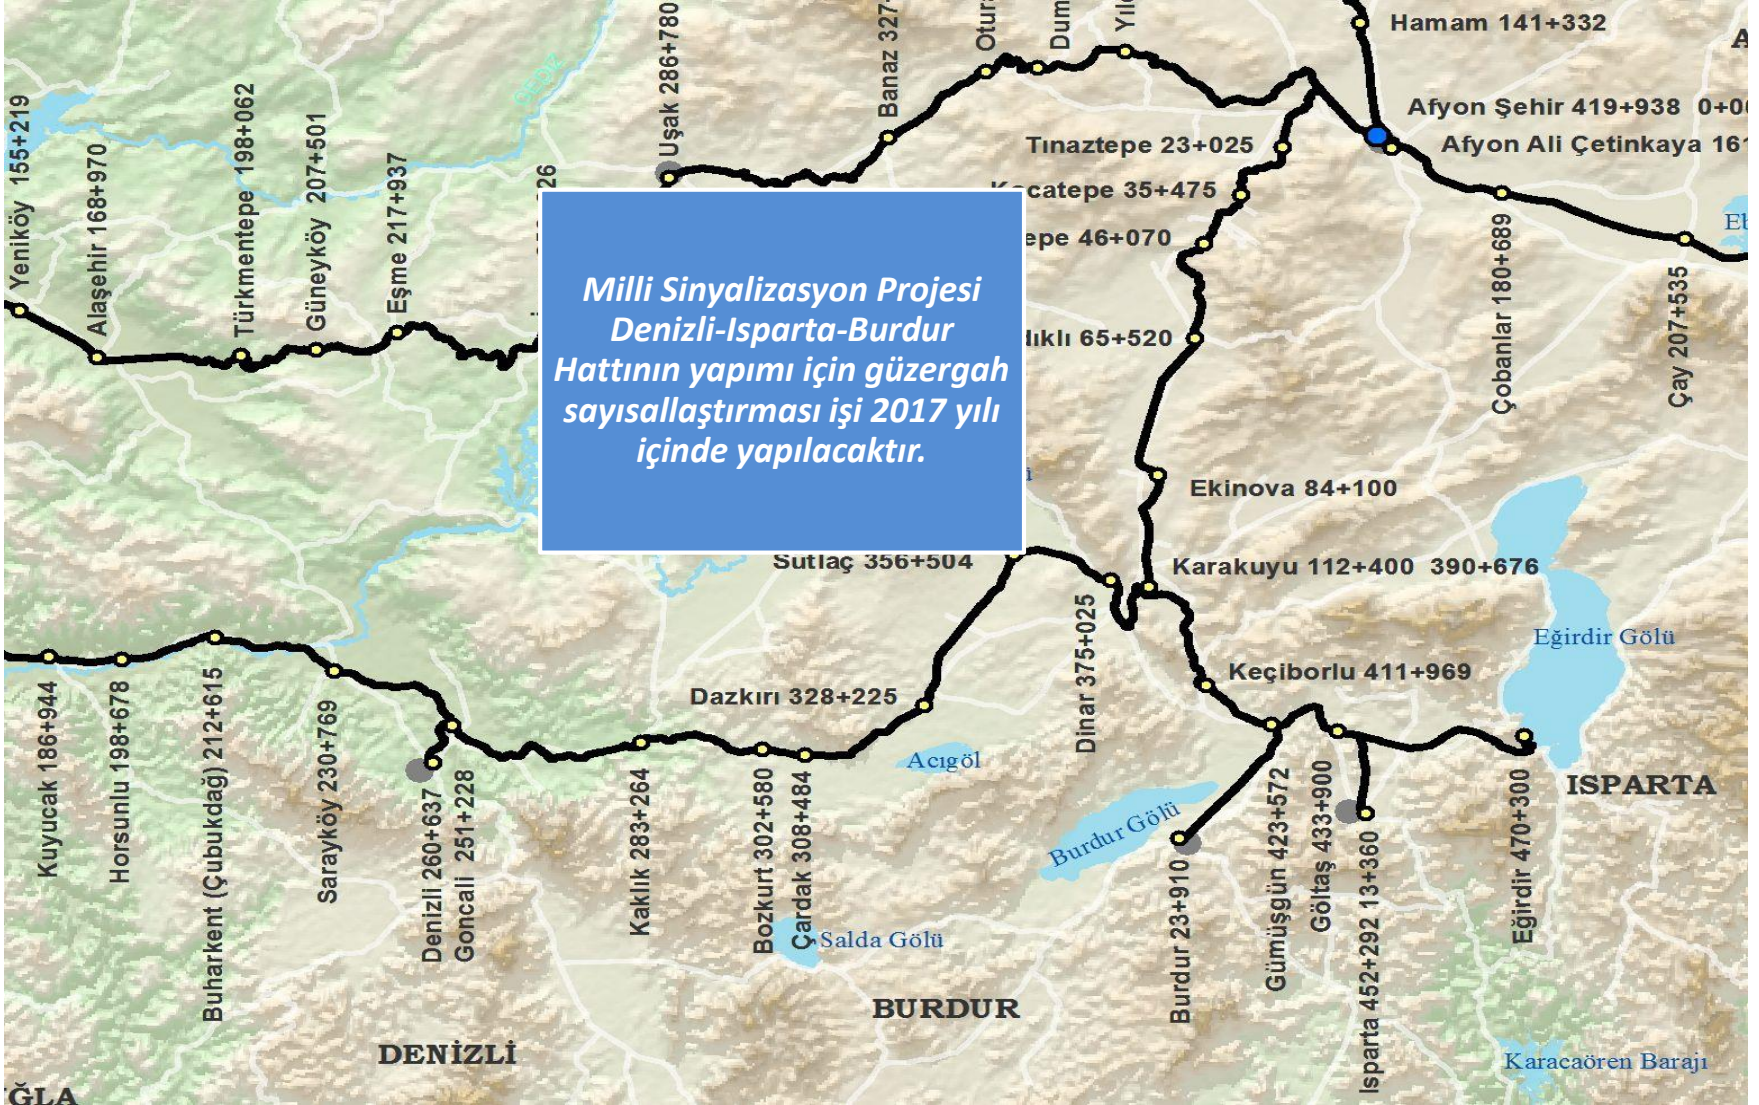



2018 yılında Alayunt-Afyon-Konya Hat Kesiminde Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon-Telekomünikasyon Projeleri yapılması planlanmaktadır.

## ALAYUNT-AFYON-KONYA

*Bu amaçla (72-73 YBOM mntıkası) Poz uygulasyonu ve Güzergah Sayısallaştırması işi yatırım programına alınmıştır.*



## Afyonkarahisar OSB Yük Merkezi ve İltisak Hattı Bağlanması

*Afyonkarahisar OSB Yük Merkez ve bağlantı hattı için 6 Km.lik demiryolu hattı planlanmıştır.*  
*Uygulama Projelerinin Hazırlanması için Mühendislik-Danışmanlık hizmeti alınması işine ödenek tahsis edilmiştir.*  
*İhale hazırlık aşamasındadır.*





## Afyonkarahisar İscehisar Mermer İhtisas OSB Yük Merkezi ve İltisak Hattı Bağlanması

*İscehisar OSB Yük Merkezi -Afyonkarahisar arasında 14 Km.lik demiryolu hattı planlanmıştır.  
Uygulama Projelerinin Hazırlanması için Mühendislik-Danışmanlık hizmeti alınması işine ödenek tahsis edilmiştir.  
İhale hazırlık aşamasındadır.*



Manisa-Uşak-Afyonkarahisar Hat Kesiminde (415km) Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon-Telekomünikasyon Projeleri yapılması 2010 E010070.07.01-02 PYP No ile yatırıma alınmıştır. (50 km'si Afyonkarahisar İlinde)

**MANİSA-UŞAK-AFYONKARAHİSAR**  
**2017 yıl sonuna kadar proje hazırlanması için ihale yapılması planlanmaktadır.**  
**Proje Bedeli (Afyonkarahisar): 22.279.520 TL**





## ***SİNYALİZASYON YATIRIMI İLE ;***

- ***Günlük çalıştırılan yük ve yolcu trenlerinden daha fazla tren işletilmesi ile hat kapasitesi artacaktır.***
- ***Sinyalizasyon projesi tamamlandığında kapanacak İstasyonlar ve makasların merkezden tanzimi nedeni ile faal personel tasarrufu sağlanacaktır.***
- ***Sinyalizasyon sistemi ile ray kırılması ve yolun genel olumsuzluklarını, sistemin ihbar etmesi, kazaların önlenmesi ve seyrüsefer emniyetini arttıracaktır.***


## **ELEKTRİFİKASYON YATIRIMI İLE ;**

- Elektrik enerjisi yönünden daha az dışa bağımlı olan kendi enerji kaynaklarımızdan azami derecede istifade edilerek, ithal edilen petrole ödenen dövizden tasarruf edilecektir.**
- Genel olarak 1 adet elektrikli lokomotifin çekeri 2 adet dizel lokomotifin çekerine eşittir. Böylece az lokomotif ile çok yük daha kısa sürede cer edileceğinden hat kabiliyeti artacaktır.**
- Maliyet olarak elektrikli lokomotiflerin gideri, dizel lokomotiflerin yakıt giderinin % 33 ne tekabül etmektedir.**
- Elektrikli lokomotifler işletme ve bakım kolaylığı sağlamaktadır.**





## ANKARA-AFYONKARAHİSAR- İZMİR YÜKSEK HIZLI TREN (YHT) ÇALIŞMALARI

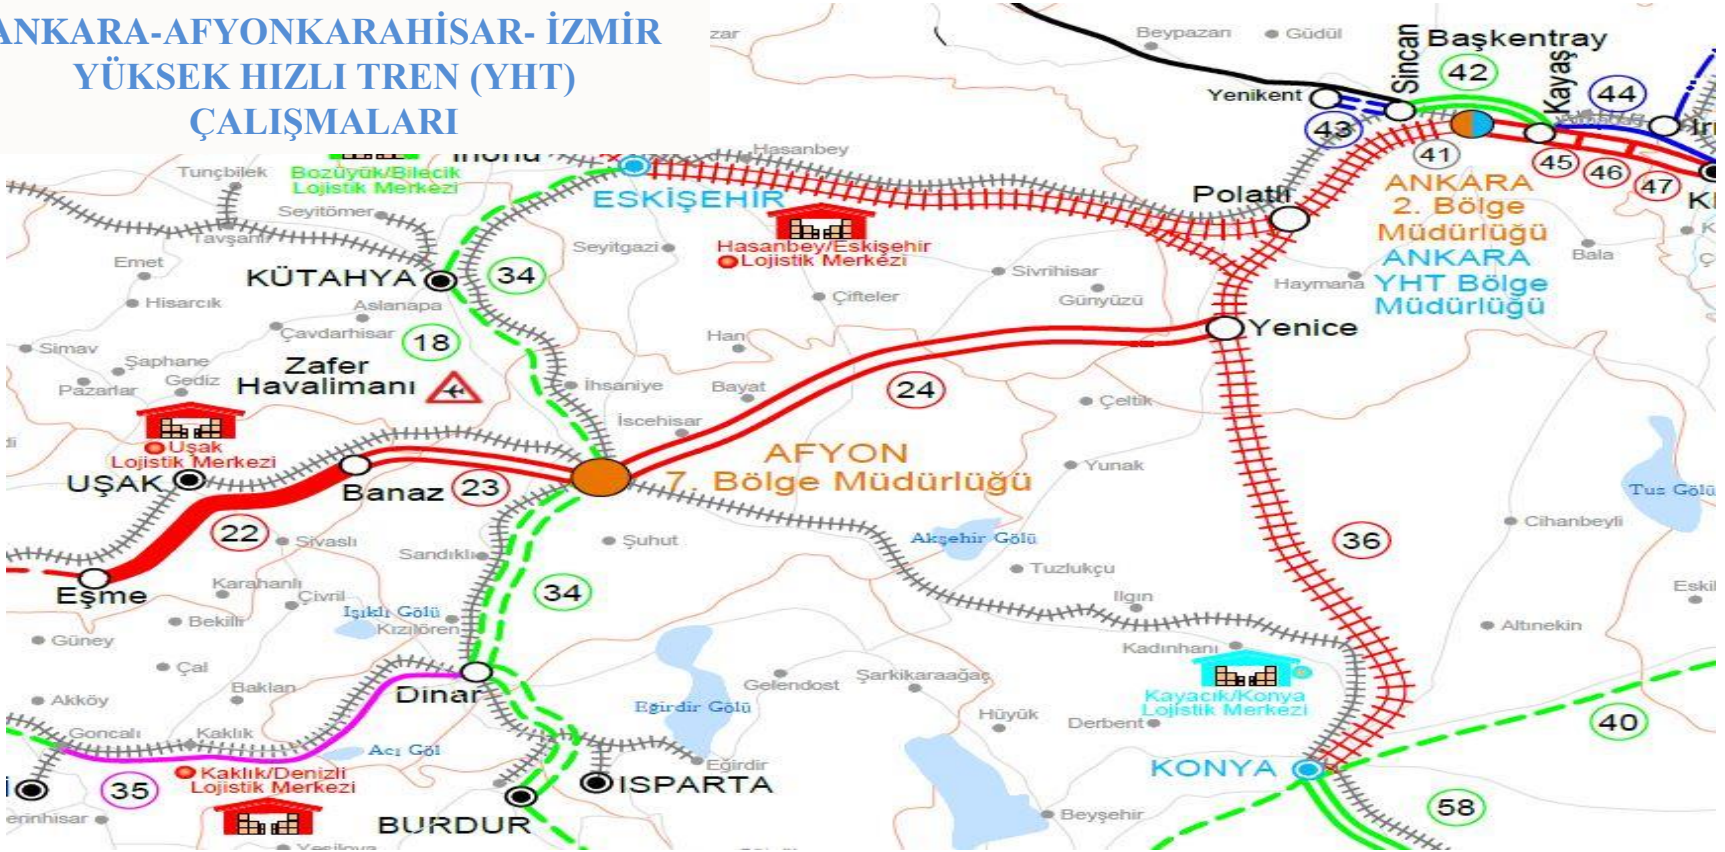


Yüksek Hızlı Tren (YHT) Ankara(Polatlı)-Afyonkarahisar-Uşak-Salihli-Manisa-İzmir olmak üzere 624 km.lik güzergâh, saatte 250 km. hıza uygun olarak inşa edilecektir. Böylece Ankara-İzmir arası 3 saat 30 dakika, Afyon-Ankara arası 1 saat 20 dakika olacaktır.

-Toplam uzunluğu 624 km. hattın 167 km.lik ilk bölümünü oluşturan Ankara (Polatlı)-Afyonkarahisar kesiminden altyapı çalışmaları %36 fiziki ilerlemeyle devam etmektedir. Üst yapı için 2017'de ihale ilanına çıkılması planlanmaktadır.



## ANKARA – AFYONKARAHİSAR – İZMİR YÜKSEK HIZLI TREN AFYONKARAHİSAR – BANAZ ARASI 88 KM

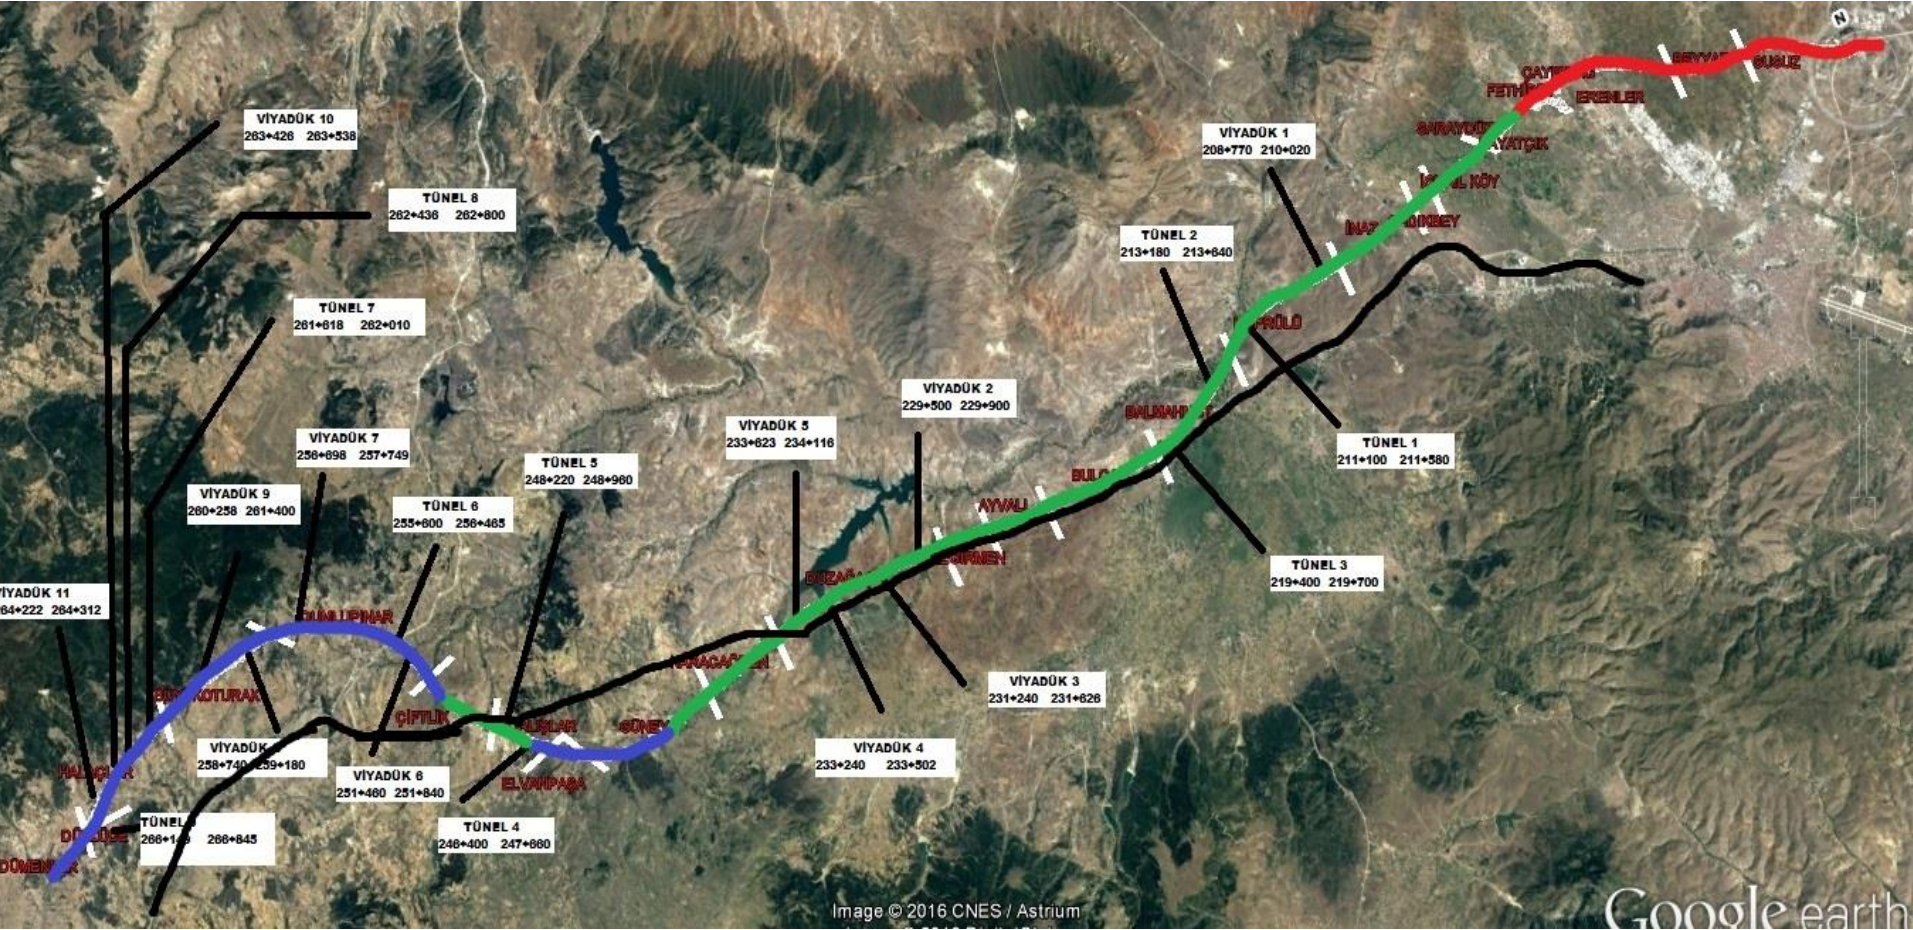


KAMULAŞTIRMA ORANI %50

- KAMULAŞTIRMA PLANLARI KONTROL AŞAMASINDA
- ÇALIŞMA YAPILABİLİR
- UZLAŞMA HAZIRLIKLARI YAPILDI
- KARAYOLU



## ANKARA – AFYONKARAHİSAR – İZMİR YÜKSEK HIZLI TREN AFYONKARAHİSAR – BANAZ ARASI 88 KM

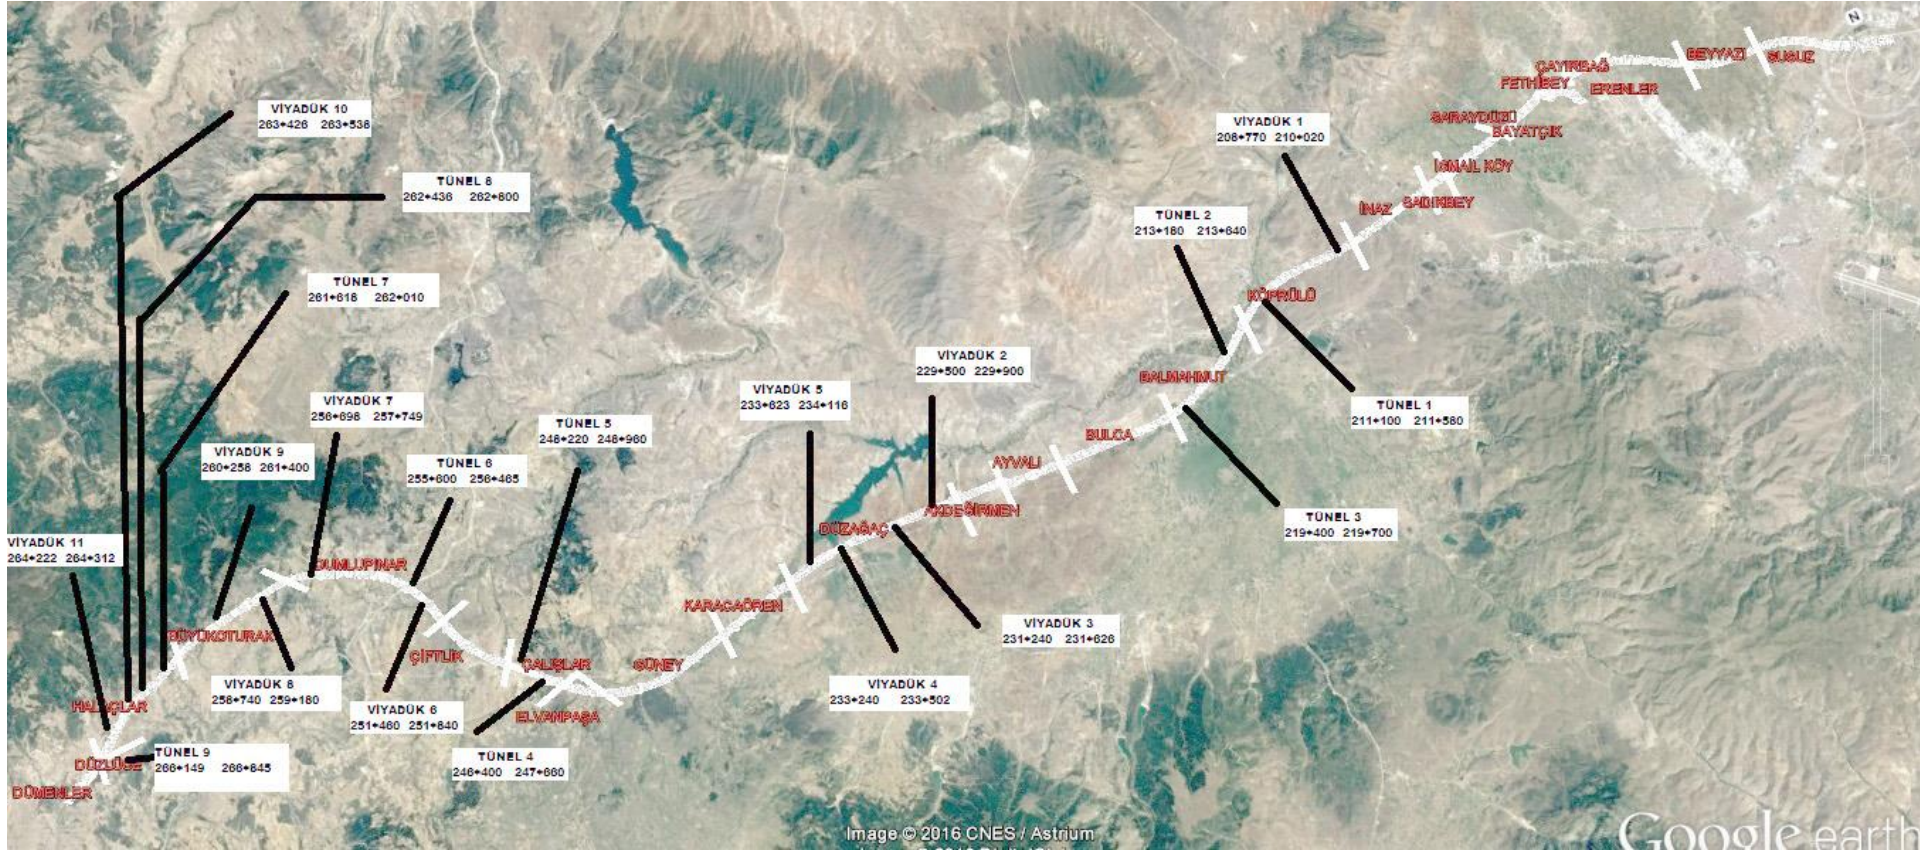

### PROJEDE;

8 Adet TÜNEL (5056 m)'den 2 Adedinde Delgi Çalışması Devam ediyor (T<sub>2</sub>, T<sub>3</sub>). 2 Adedinde Portal kazı (T<sub>4</sub>, T<sub>5</sub>) yapılıyor.

11 Adet VIYADÜK (7215 m)'den 1 Adedinde Kazık Çalışması Devam ediyor.

4 Adet KÖPRÜ

46 Adet ALTGEÇİT

15 Adet ÜSTGEÇİT


91 Adet MENFEZ 'den 4 Adet Menfezde İmalatlar Başlamıştır.

25.480.810 m<sup>3</sup> KAZI'dan 2.750.000 m<sup>3</sup> İmalat Tamamlandı.

13.024.860 m<sup>3</sup> DOLGU



## ANKARA – AFYONKARAHİSAR – İZMİR YÜKSEK HIZLI TREN POLATLI – AFYONKARAHİSAR ARASI 167 KM

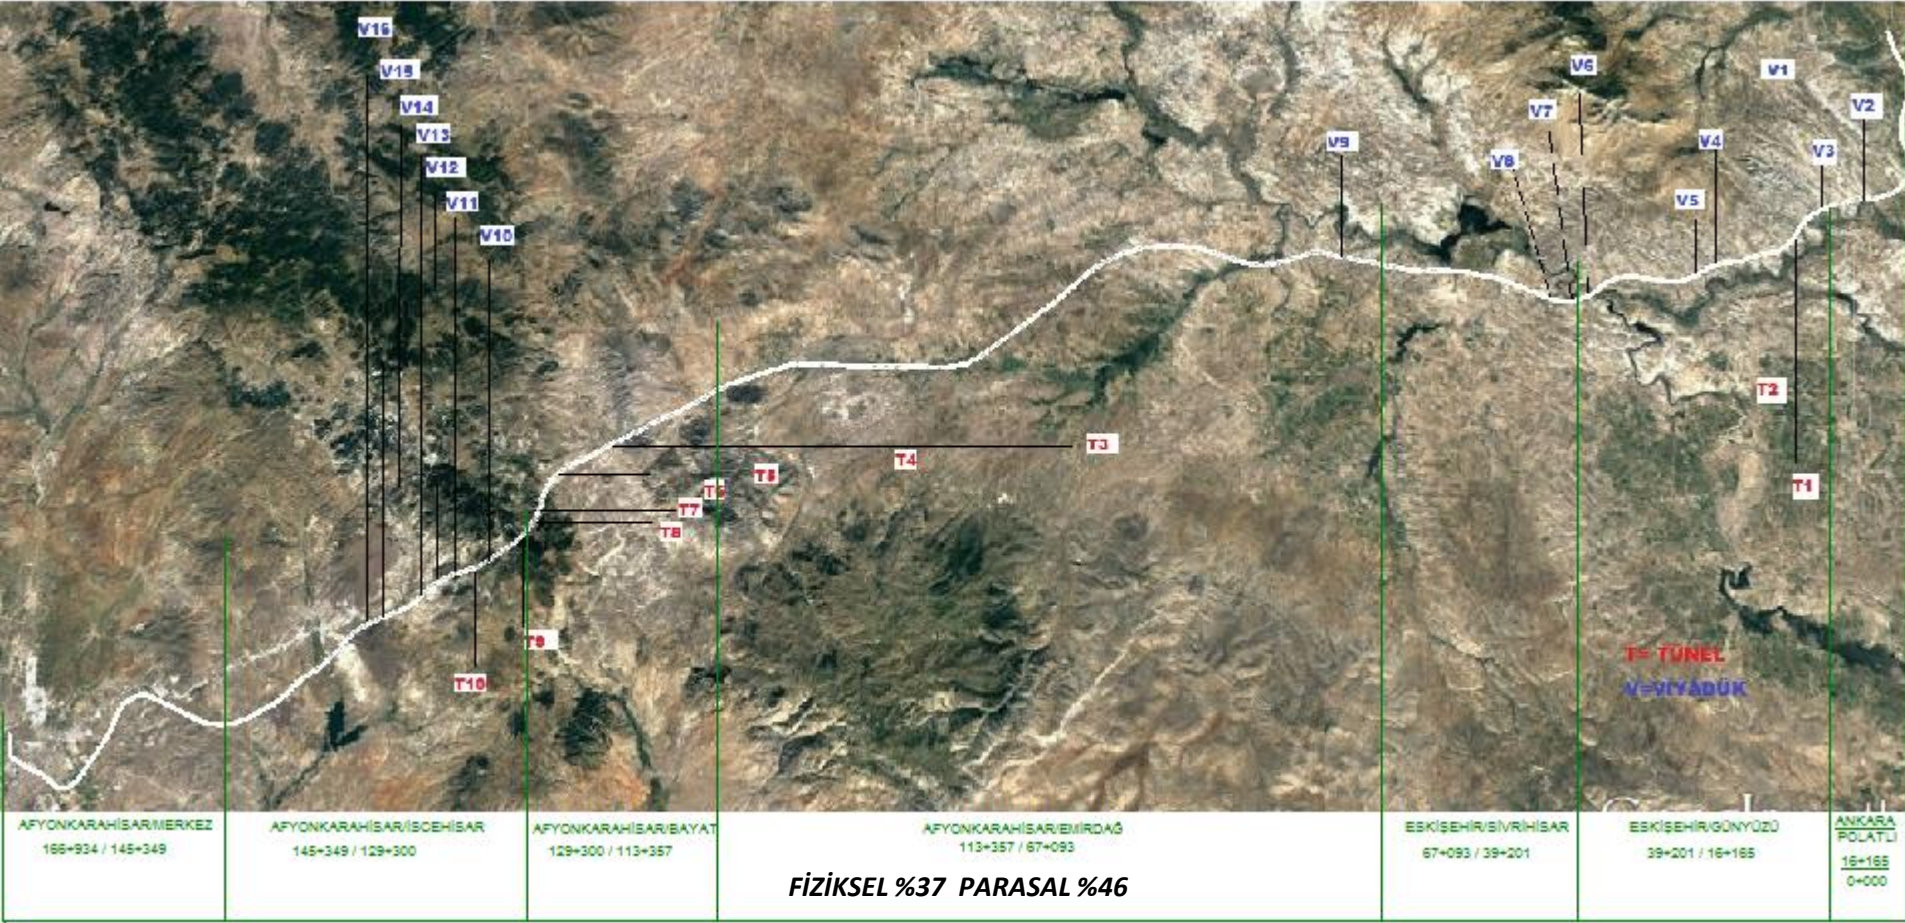

**PROJEDEKİ;** 10 Adet TÜNEL'den 6 Adedinde delme işlemi tamamlanmış  $T_6, T_7, T_8$  ile birleşen 5160 m<sup>3</sup>'lük KÖROĞLU Tüneli (2765 mt delinmiştir.) Kalmıştır.  $T_2$  (62 mt'si kalmış) tamamlanmak üzeredir.

**PROJEDEKİ;** 16 Adet VİYADÜK'ten 7 Adeti tamamlanmış, 4 Adet Viyadükte çalışmalar devam etmektedir.

**PROJEDEKİ;** 22 Adet KÖPRÜ'den 5 Adeti tamamlanmış, 8 Adet Köprüde çalışmalar devam etmektedir.

**PROJEDEKİ;** 79 Adet ALTGEÇİT'ten 28 Adet tamamlanmış, 5 Adet Altgeçitte çalışmalar devam etmektedir.

**PROJEDEKİ;** 28 Adet ÜSTGEÇİT'TEN 8 Adet tamamlanmış, 3 Adet Üstgeçitte çalışmalar devam etmektedir.


**PROJEDEKİ;** 182 Adet MENFEZ 'den 64 Adet tamamlanmış, 5 Adet Menfezde çalışmalar devam etmektedir.

**PROJEDEKİ;** 32.000.000 m<sup>3</sup> KAZI'nın 21.900.000 m<sup>3</sup> İmalat Tamamlanmıştır.

**PROJEDEKİ;** 16.500.000 m<sup>3</sup> DOLGU'nun 1.950.000 m<sup>3</sup> İmalat Tamamlanmıştır.



## ANKARA – AFYONKARAHİSAR – İZMİR YÜKSEK HIZLI TREN POLATLI – AFYONKARAHİSAR ARASI 167 KM

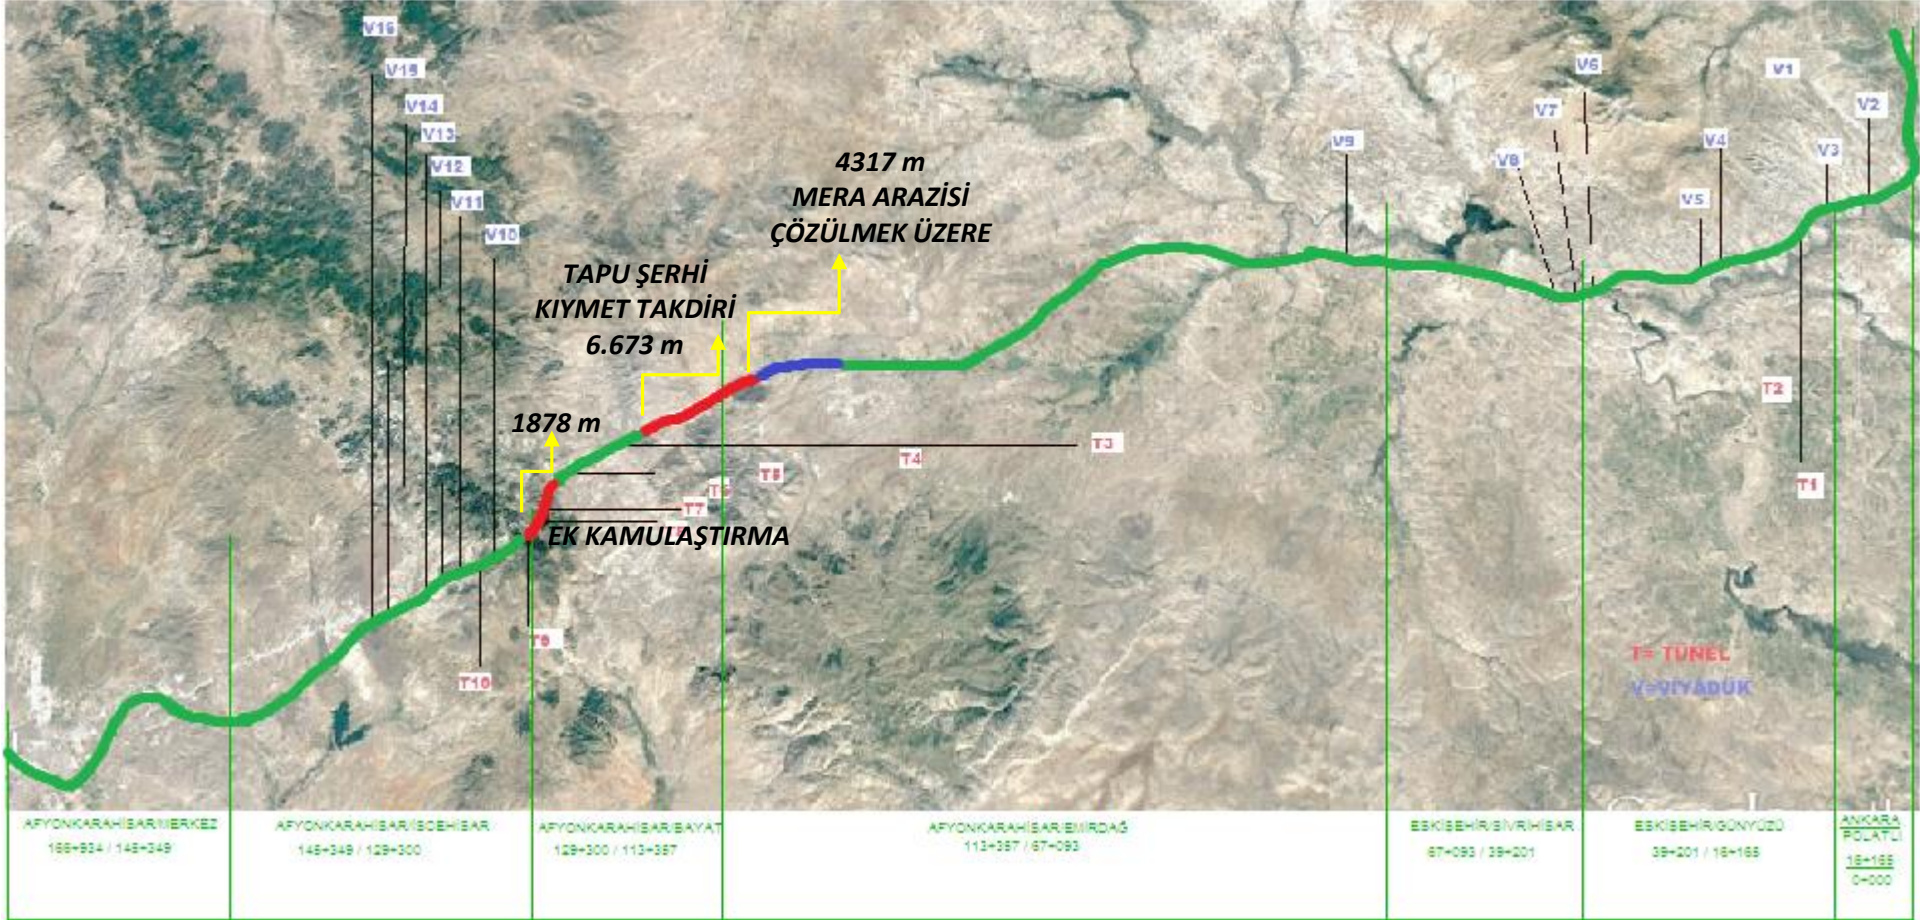

### KAMULAŞTIRMA

**KAMULAŞTIRILAN ALAN**

**SONRADAN İLAVE KAMULAŞTIRMA (MERA ARAZİSİ ÜZERİ YAPILAŞMA, KAYMAKAMLIK ÇÖZÜYOR)**

**TAPU ŞERHİ KONULDU, İŞLEMLER DEVAM EDİYOR**

**167 km'lik kesimin 158 km'lik kesimine (toplam hattın %95'ine) girilebilir.  
Bölge Müdürlüğümüzce şuana kadar 43.510.960 TL bedel harcanmıştır.**

































# ESKİŞEHİR-ANTALYA YÜKSEK HIZLI TREN ÇALIŞMALARI

✓ *Etüt-Proje, Fizibilite Etüdü ve ÇED Raporu çalışmalarının Toplam Proje Bedeli 35.570.000 TL olup, 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.*

✓ *Geliştirilen yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli proje 3 kesim halinde projelendirilmiştir.*

1. Eskişehir-Afyonkarahisar (140 km); kesiminin 1/5.000'lik güzergâh belirleme çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

2. Afyonkarahisar-Burdur (150 km); 06.02.2017 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır.

3. Burdur-Antalya(150 km); kesiminin kesin proje hazırlama işi için yüklenici firmaya 30.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

✓ *Genel Müdürlüğümüz Etüt Proje ve Yatırım Dairesi Başkanlığınca takibi yapılmaktadır.*



İSTASYONLAR	GELEN (TON)	GİDEN (TON )	TOPLAM ( TON )
AFYON A.ÇETİNKAYA	20.161	70.906	91.068
AFYON ŞEHİR	51.660	1.865	53.525
BÜYÜKÇOBANLAR	6.942	13.745	20.687
DAZKIRI	-	-	-
DİNAR	14.944	3.164	18.109
EKİNOVA	-	-	-
SANDIKLI	641	1.028	1.670
YILDIRIMKEMAL	-	-	-
ÇAY	194	6.369	6.563





İSTASYONLAR	GELEN (TON)	GİDEN (TON )	TOPLAM ( TON )
ÇİĞİLTEPE	-	-	-
İHSANİYE	230	437	667
<b>TOPLAM :</b>	<b>94.773</b>	<b>97.515</b>	<b>192.288</b>



***Afyonkarahisar İl sınırları içerisindeki 21 adet otomatik bariyerli, 6 adet bekçili bariyerli 224 adet çapraz işaretli serbest geçit ve 3 adet uzaktan idareli bariyerli olmak üzere Toplam: 254 adet hemzemin geçit bulunmaktadır. 2017 yatırım programında 29 adet hemzemin geçidin kauçuk kaplaması yapılacaktır. Toplam maliyet 539,406.00 TL'dir.***





✓ Afyon Gar'da :

\*2 Adet Mavi Tren ( Konya Mavi)

\*2 Adet Ekspres Tren (Pamukkale Ekspres Treni.)

\*2 Adet Afyon çıkışlı – varışlı Bölgesel Ekspres ( Afyon-Eskişehir-Afyon) Olmak üzere

**6 Trenle hizmet verilmektedir.**

**2017 Yılında altı aylık dönemde 15.757 yolcu taşınmıştır.**
