



**KARAYOLLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA**



19 TEMMUZ 2017 - AFYON



**T.C.
Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı**




YATIRIM İZLEME RAPORU

Toplam Proje Sayısı	: 20
Toplam Proje Tutarı	: 2,34 Milyar TL
Önceki Yılların Harcaması	: 1,5 Milyar TL
Yılı Ödeneği + Ek Ödenek	: 69,6 Milyon TL
Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama	: 35,7 Milyon TL
Parasal Gerçekleşme	: % 51
Fiziksel Gerçekleme	: % 65



KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

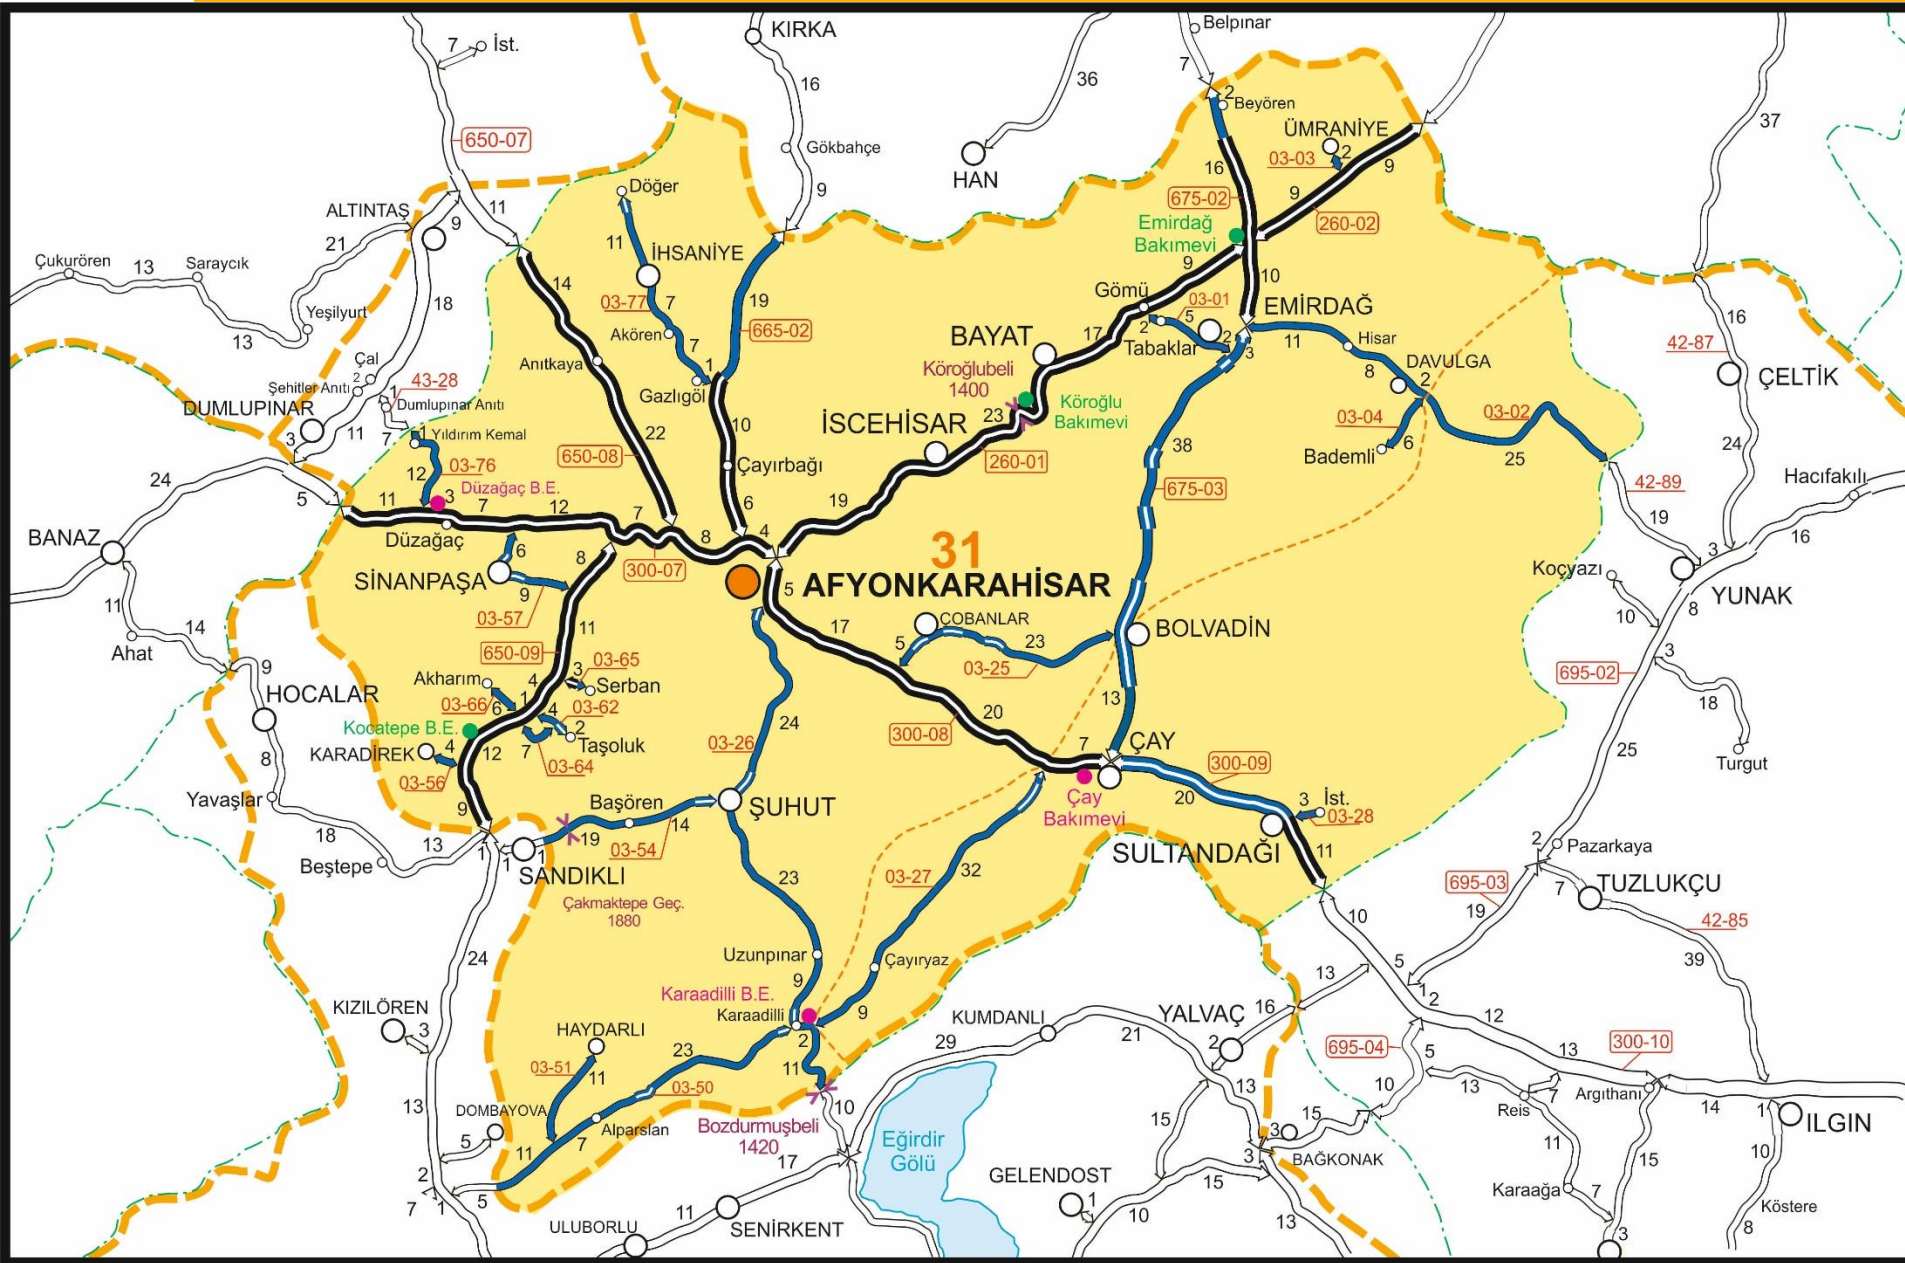



AFYON İLİ – YOL AĞI DURUMU

SATIŞ CİNSLERİNE GÖRE YOL AĞI (KM)

YOLUN CİNSİ	ASFALT YOLLAR		ŞEBEKE UZUNLUĞU	BÖLÜNmüş YOL
	ASFALT BETONU	SATHİ KAPLAMA		
Devlet Yolu	382	34	416	402
İl Yolu	20	349	369	20
Toplam	402	383	785	422

TOPLAM YOL AĞININ

402 Km ` si BSK

% 51

383 Km ` si Sathi Kaplama

% 49

} **% 100 Asfalt**

Afyon İli sınırlarında **461 km Bölünmüş Yol** yapımı öngörülmüş olup bugüne kadar **422 km bölünmüş yol (% 92)** tamamlanmıştır.



KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



2017 yılında;

Bölge Genelinde:188.471.000 TL

Afyon ilinde :35.707.000 TL


harcama yapılmıştır.



2017 YILINDA ÇALIŞILACAK ÖNEMLİ PROJELER

- ✓ (Afyon-Eskişehir)Ayr-Mahmudiye-Çifteler Yolu
 - ✓ Afyon-Gazlıgöl-Kırka Yolu Yapımı
 - ✓ Çay-Bolvadin-Emirdağ Yolu Yapımı
 - ✓ Afyon-Şuhut Yolu yapımı
 - ✓ Afyonkarahisar-Akşehir Yolu
 - ✓ Afyon-Uşak yolu Tünelli Geçiş
-

(Afyon-Eskişehir)Ayr-Mahmudiye-Çifteler Yolu

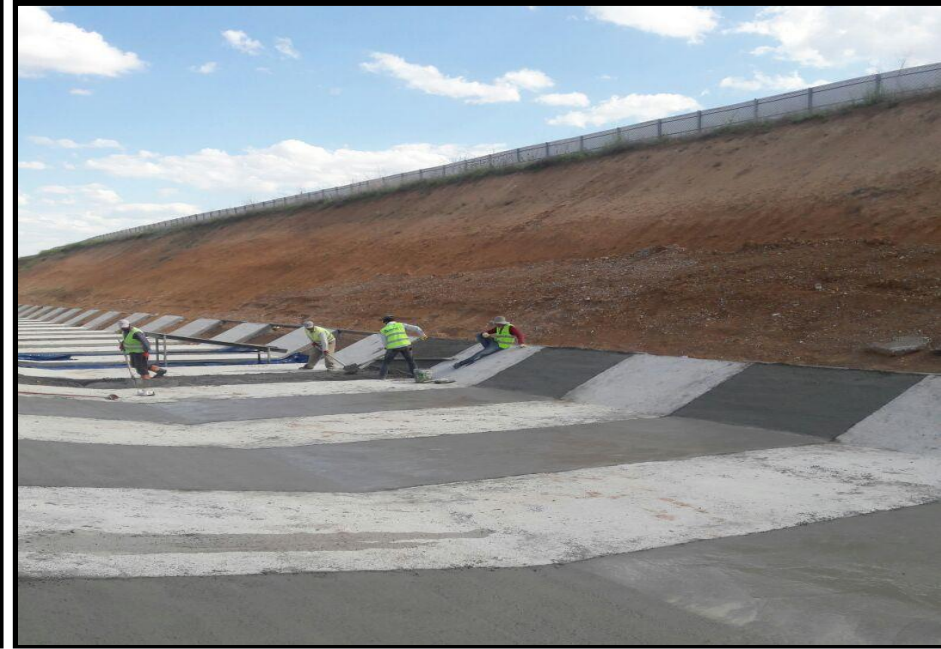

56 km uzunluğundaki yolun 27,5 km'si Afyon ili sınırlarında bulunmaktadır. 2016 yılı sonuna kadar **Afyon ilinde 27,5 km'si BSK kaplamalı bölünmüş yol** olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

2017 yılında kalan 10 km'nin aşınma tabakasında Temmuz ayı içinde çalışmalara başlanacaktır.


Afyon-Gazlıgöl-Kırka Yolu Yapımı



35 km uzunluğundaki yolun 2016 yılı sonuna kadar 29 km'si BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

2017 yılında 3 km BSK kaplamalı bölünmüş yol yapımı tamamlanmıştır.
Projenin 2017 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.


Çay-Bolvadin-Emirdağ Yolu Yapımı

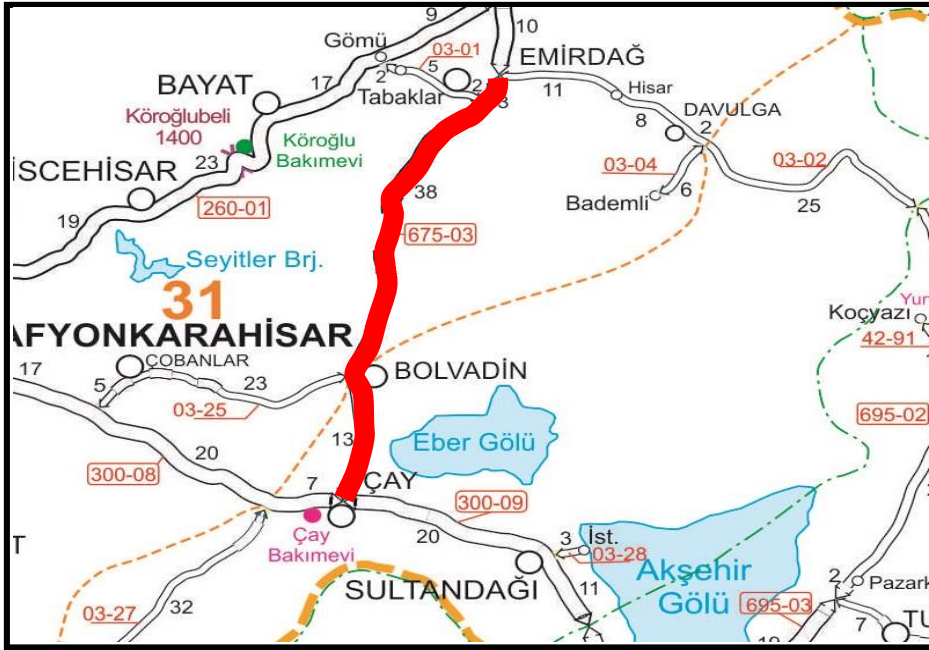

53 km uzunluğundaki yolun 34,5 km bölünmüş yol (21 km BSK-13,5 km SK) olarak tamamlanmıştır.

2017 yılında 5,3 km BSK kaplamalı bölünmüş yol yapımı tamamlanmıştır.


Afyon-Şuhut Yolu Yapımı

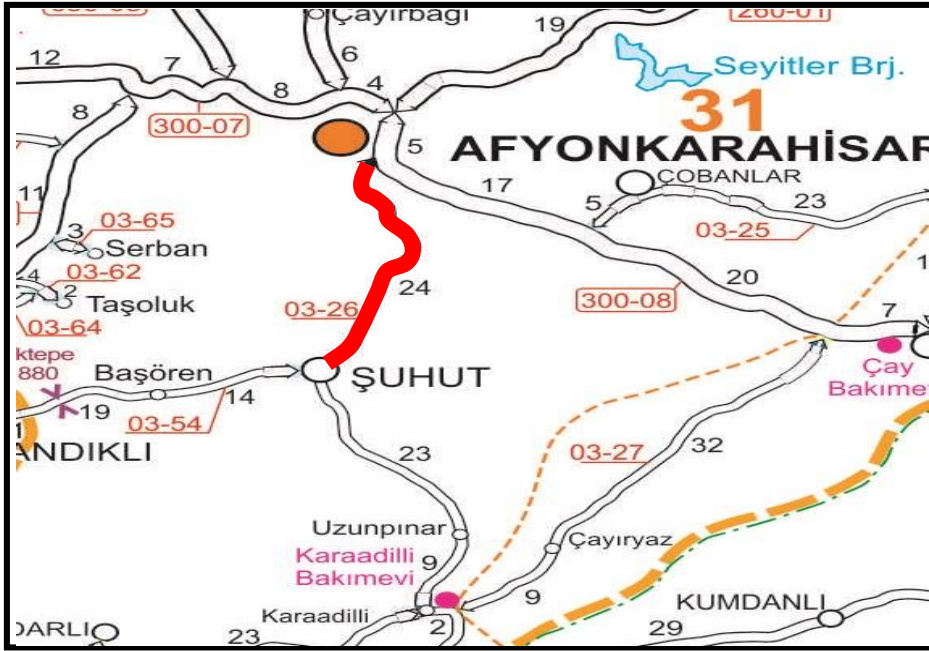

24 Km uzunluğundaki yolun 2016 yılı sonuna kadar 2 km'si BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

2017 yılında toprak işleri ve sanat yapıları çalışmalarında **%70-80** seviyelerine ulaşılmıştır.


Afyonkarahisar-Akşehir Yolu

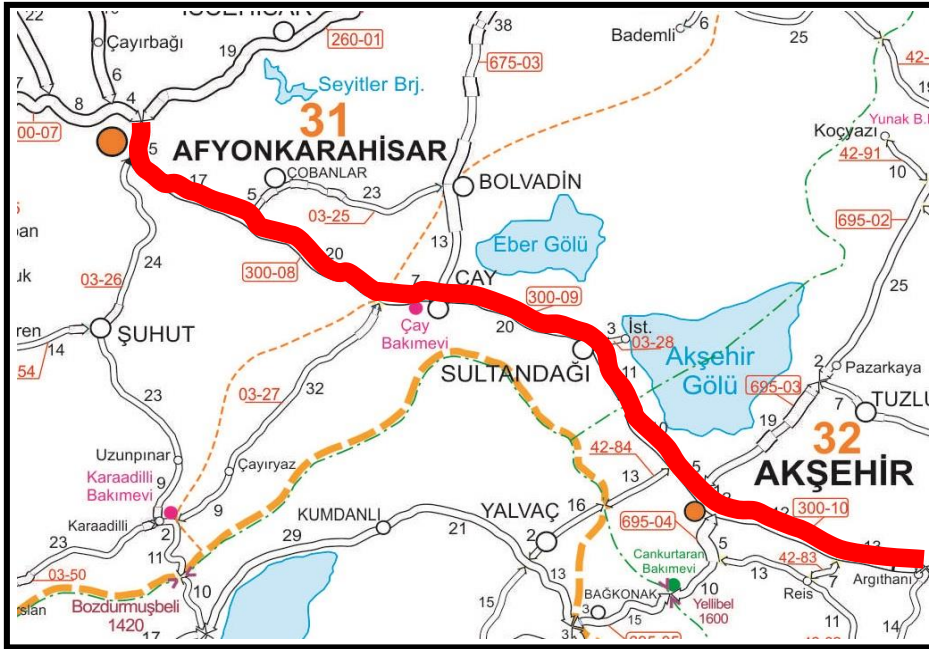

90 km uzunluğundaki yolun (75 km'si Afyon ili, 15 km'si Konya ilinde) 2016 yılı sonuna kadar 81,8 km'si (66,8 km'si Afyon ilinde) BSK kaplamalı tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

2017 yılında 3,5 km bölünmüş yolda SK üzeri BSK kaplama yapımı tamamlanmıştır.

Afyon-Uşak yolu Tüneli Geçiş

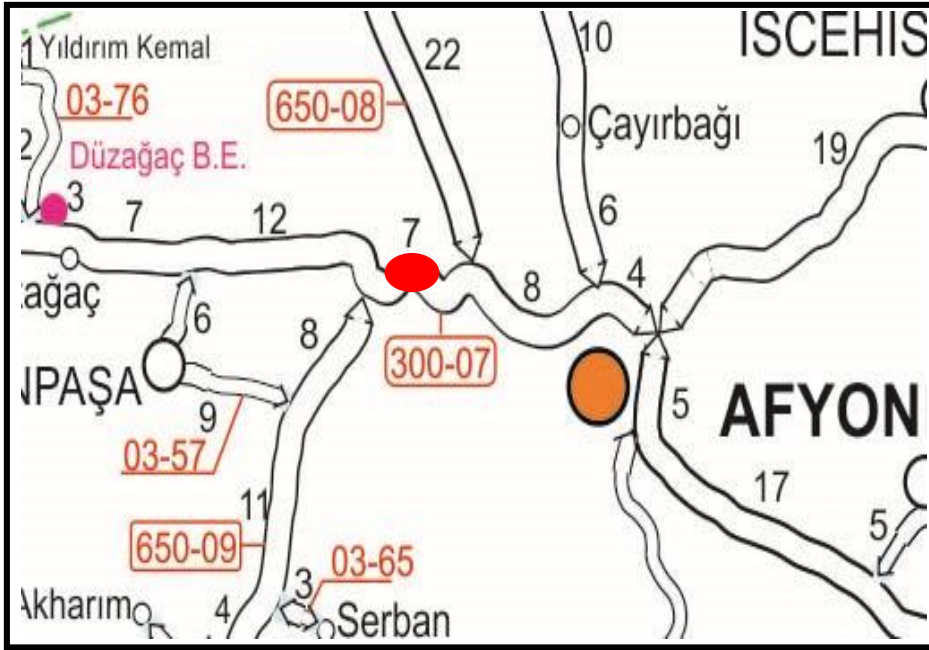

Söz konusu iş kapsamında 1 adet Kütahya Ayr. Köprülü Kavşağı (12 açıklıklı, 367 m) ve 1 çift tüp Afyon-Uşak Tüneli (365 m) yapılacaktır.

Kütahya Ayr. Köprülü kavşağında çalışmalarına 6 Eylül 2016 tarihinde başlanmış olup 17 Ocak 2017 tarihinde trafiğe açılmıştır.

Tünel yapım çalışmalarına 10 Temmuz 2016 tarihinde başlanmış tünel kazı çalışmaları bitirilmiş, nihai beton çalışmaları tamamlanmıştır. **2017 yılında tünel bağlantı yollarında 0,8 km BY-BSK çalışması yapılmıştır.**

Tünelin 2017 yılı içinde tamamlanması hedeflenmiştir.

Emirdağ Ayr.-Afyon



Emirdağ Ayr. KöprülÜ Kavşađı yapım çalışmaları tamamlanmış olup 2016 yılı Kasım ayında köprülÜ kavşak trafiđe açılmıştır. İscehisar KöprülÜ Kavşađında çalışmalara devam edilmekte olup 2017 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

SATHİ KAPLAMA, SANAT YAPILARI VE TRAFİK GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI

- 2017 Yılında **63 km sathi kaplama çalışması yapılması** hedeflenmiş olup hava şartları nedeniyle Haziran ayı içinde çalışmalara başlanmıştır.
- Kütahya Ayr. Köprülü Kavşağı 17 Ocak 2017 tarihinde trafiğe açılmıştır. İscehisar Köprülü Kavşağında çalışmalara devam edilmekte olup 2017 yılında çalışmalar tamamlanacaktır. DDY Üst Geçit ve Taşoluk Köprülerinin 2017 yılında ihalesi yapılmış olup 29.06.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
- 2017 yılında Afyon ilinde **32 km otokorkuluk, 1.353 adet levha, 223 km yatay işaretleme** yapılmıştır.



KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Resim : Afyonkarahisar-Akşehir Yolu
