



**KARAYOLLARI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  
KONYA**



# **Afyon İli 2018 Yılı -1.Dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısı**

11 NİSAN 2018 - AFYON



**T.C.  
Ulaştırma, Denizcilik ve  
Haberleşme Bakanlığı**



## YATIRIM İZLEME RAPORU

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	<b>: 19</b>
<b>Toplam Proje Tutarı</b>	<b>: 2 Milyar 542 Milyon 45 Bin TL</b>
<b>Önceki Yılların Harcaması</b>	<b>: 1 Milyar 608 Milyon 770 Bin TL</b>
<b>Yılı Ödeneği + Ek Ödenek</b>	<b>: 132 Milyon 298 Bin TL</b>
<b>Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama:</b>	<b>37 Milyon 489 Bin TL</b>
<b>Parasal Gerçekleşme</b>	<b>: % 27</b>
<b>Fiziksel Gerçekleme</b>	<b>: % 28</b>





## AFYON İLİ – YOL AĞI DURUMU

### SATIŞ CİNSLERİNE GÖRE YOL AĞI (KM)

YOLUN CİNSİ	ASFALT YOLLAR		ŞEBEKE UZUNLUĞU	BÖLÜNmüş YOL
	ASFALT BETONU	SATHİ KAPLAMA		
Devlet Yolu	396	20	<b>416</b>	407
İl Yolu	26	343	<b>369</b>	24
<b>Toplam</b>	<b>422</b>	<b>363</b>	<b>785</b>	<b>431</b>

### TOPLAM YOL AĞININ

**422** Km ` si BSK

% 54

**363** Km ` si Sathi Kaplama

% 46

} **% 100 Asfalt**

Afyon İli sınırlarında **461 km Bölünmüş Yol** yapımı öngörölmüş olup bugüne kadar **431 km bölünmüş yol (% 93)** tamamlanmıştır.



**2018** yılında;

**137 Milyon 205 Bin TL** harcama hedeflenmiş olup;


Bugüne kadar **37 Milyon 489 Bin TL** harcama yapılmıştır.



## 2018 YILINDA ÇALIŞILACAK ÖNEMLİ PROJELER

- ✓ Afyon-Uşak yolu Erkmen Köprülü Kavşağı
  - ✓ Emirdağ Ayr.-Afyon Yolu İscehisar ve Dört Yol Köprülü Kavşakları
  - ✓ (Afyon-Eskişehir)Ayr-Mahmudiye-Çifteler Yolu
  - ✓ Afyon-Gazlıgöl-Kırka Yolu Yapımı
  - ✓ Çay-Bolvadin-Emirdağ Yolu Yapımı
  - ✓ Afyon-Şuhut Yolu yapımı
  - ✓ Afyonkarahisar-Akşehir Yolu
  - ✓ Emirdağ-Davulga-Yunak
-

# Afyon-Uşak yolu Karahisar Tüneli, Karahisar ve Erkmen Köprülü Kavşakları

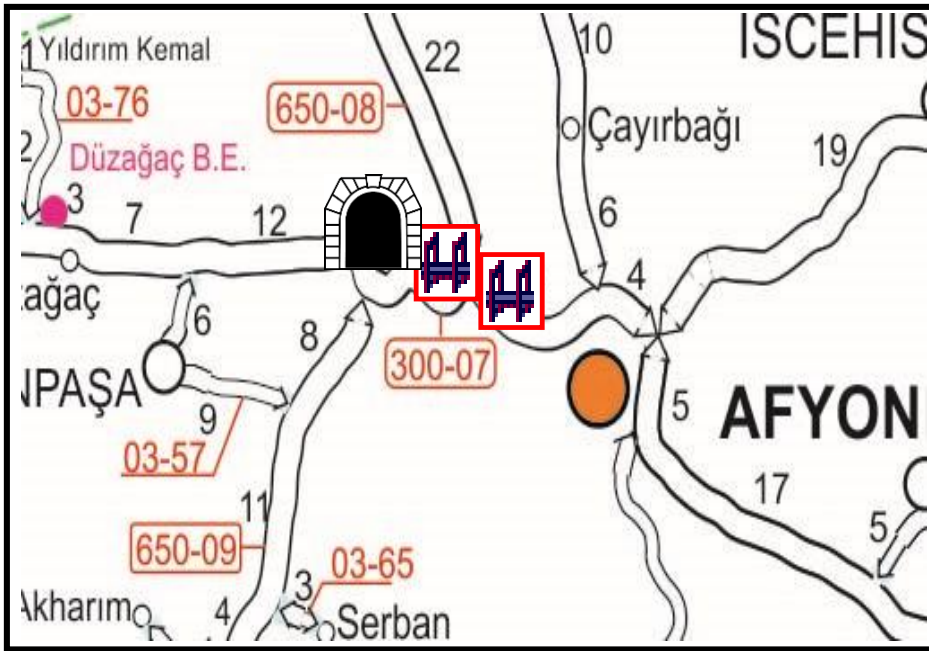

Bu iş kapsamında **Karahisar Köprülü kavşağı** çalışmaları tamamlanarak 17 Ocak 2017 tarihinde trafiğe açılmıştır.

**Karahisar Tüneli** çalışmalarına 2016 yılında başlanmış olup Ağustos 2017 itibari ile tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Tünel çalışmaları kapsamında 2 km BSK kaplamalı Bölünmüş yolda tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

**Erkmen Köprülü** Kavşağında çalışmalara başlanmış olup fiziki olarak yaklaşık **%70** seviyelerinde gerçekleşme sağlanmıştır. 2018 yılında çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir.

# Emirdağ Ayr.-Afyon Yolu İscehisar ve Dörtyol Köprülü Kavşakları



**Dörtyol Köprülü Kavşağı** yapım çalışmaları 2016 yılında tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

**İscehisar Köprülü Kavşağı**nda çalışmaları da 2017 yılında tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

Söz konusu yol üzerinde **Köroğlu Beli Tüneli** proje çalışmaları tamamlanmış olup ihale edilmesi planlanmaktadır.



# (Afyon-Eskişehir)Ayr-Mahmudiye-Çifteler Yolu



56 km uzunluğundaki yolun 27,5 km'si Afyon ili sınırlarında bulunmaktadır. 2016 yılı sonuna kadar **Afyon ilinde 27,5 km'si BSK kaplamalı bölünmüş yol** olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

Emirdağ-Çifteler yolunun **26 km'si BSK kaplamalı bölünmüş yol** olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

# Afyon-Gazlıgöl-Kırka Yolu Yapımı




36 km uzunluğundaki yolun 2017 yılı sonuna kadar 34,6 km'si BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

**2018 yılında 1,8 km BSK kaplamalı bölünmüş yol hedeflenmiştir.**

Projenin 2018 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

# Çay-Bolvadin-Emirdağ Yolu Yapımı

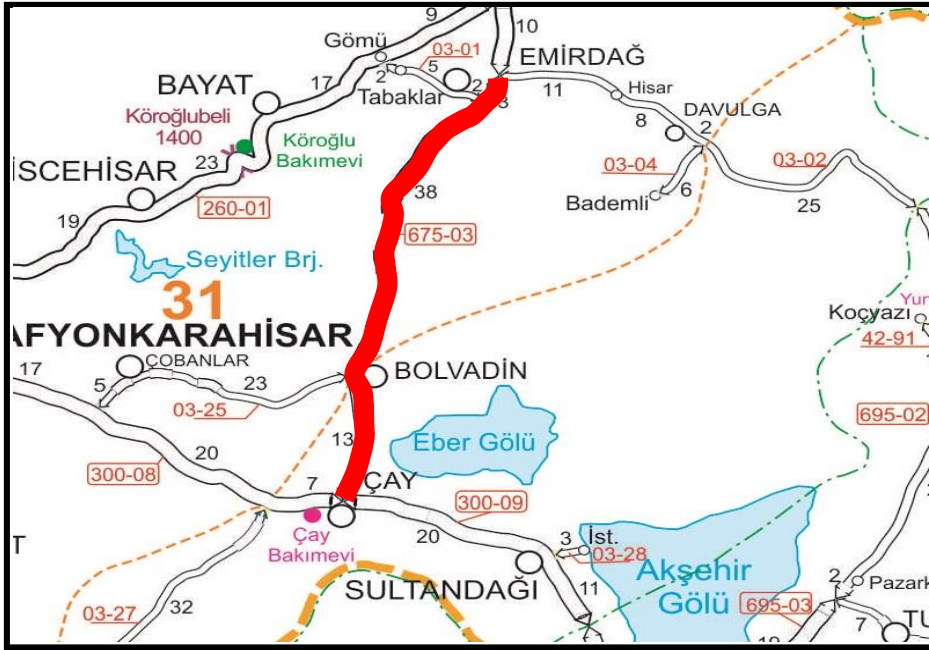


53 km uzunluğundaki yolun 2017 yılı sonuna kadar 45,3 km bölünmüş yol (30,3 km BSK-15 km SK) olarak tamamlanmıştır.

**2018 yılında 4 km SK üzeri BSK kaplamalı bölünmüş yol hedeflenmiştir.**

Projenin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.


# Afyon-Şuhut Yolu Yapımı

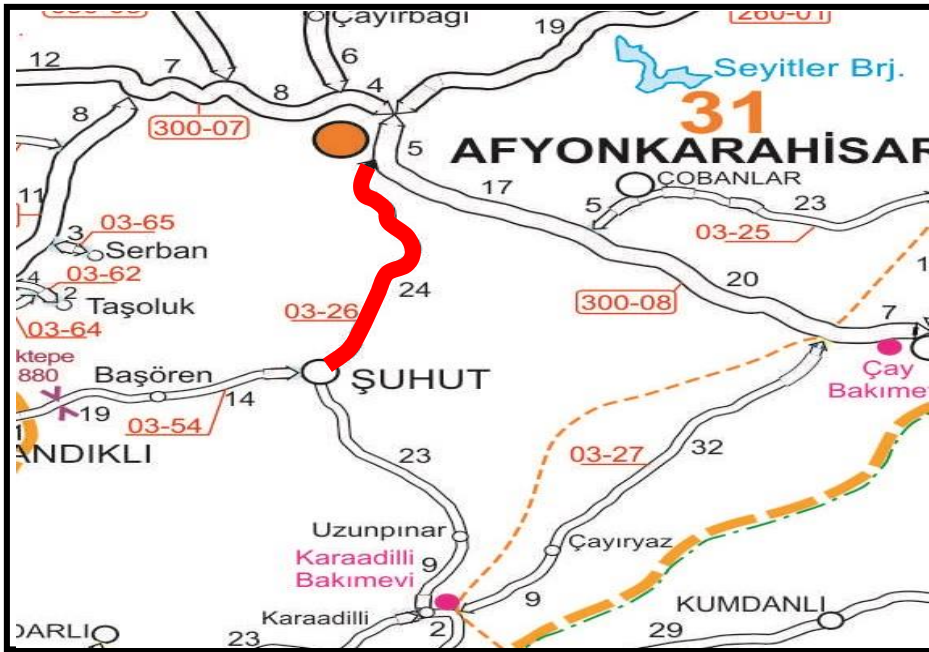

24 Km uzunluğundaki yolun 2017 yılı sonuna kadar 7 km'si BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

2018 yılında 4,15 km BSK kaplamalı bölünmüş yol hedeflenmiştir.

# Afyonkarahisar-Akşehir Yolu

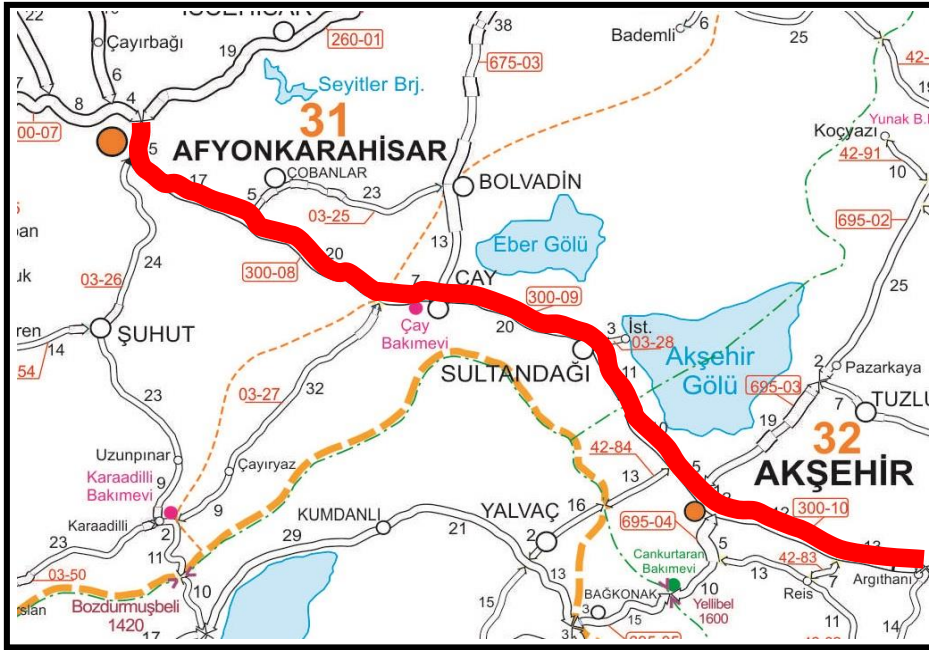

90 km uzunluğundaki yolun (75 km'si Afyon ili, 15 km'si Konya ilinde) 2017 yılı sonuna kadar 81,8 km'si (66,8 km'si Afyon ilinde) BSK kaplamalı tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

2018 yılında 25 km aşınma seviyesinde çalışma yapılması hedeflenmiştir.

# Emirdağ-Davulga-Yunak



**Emirdağ-Davulga-Yunak** yolu (03-02 ve 42-89 K.K.No.lu) toplam **64 km** uzunluğunda olup 2017 yılında Yatırım Programına alınmıştır.

Yolun proje çalışmaları tamamlanmış olup tamamı BSK kaplamalı olarak yapılmak üzere **29.01.2018 tarihinde ihale edilmiş olup ihale süreci devam etmektedir.**

# SATHİ KAPLAMA, SANAT YAPILARI VE TRAFİK GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI

- 2018 yılında **30 km sathi kaplama** hedeflenmiştir.
- **DDY Üst Geçit köprüsünde** çalışmalara devam edilmekte olup 2018 yılında tamamlanarak trafiğe açılması hedeflenmektedir.
- **Tarihi İscehisar (Kocaköprü)** Köprüsünün 2018 Yılı içinde restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.
- 2018 yılında Afyon ilinde **46 km** otokorkuluk, **4.828 adet** düşey işaretleme, **785 km** yatay işaretleme, **3 adet** sinyalizasyon hedeflenmiştir.



# KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



**Arz Ederim**

Resim : Afyonkarahisar-Akşehir Yolu
