




TCDD 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ



Adem SİVRİ
Bölge Müdürü

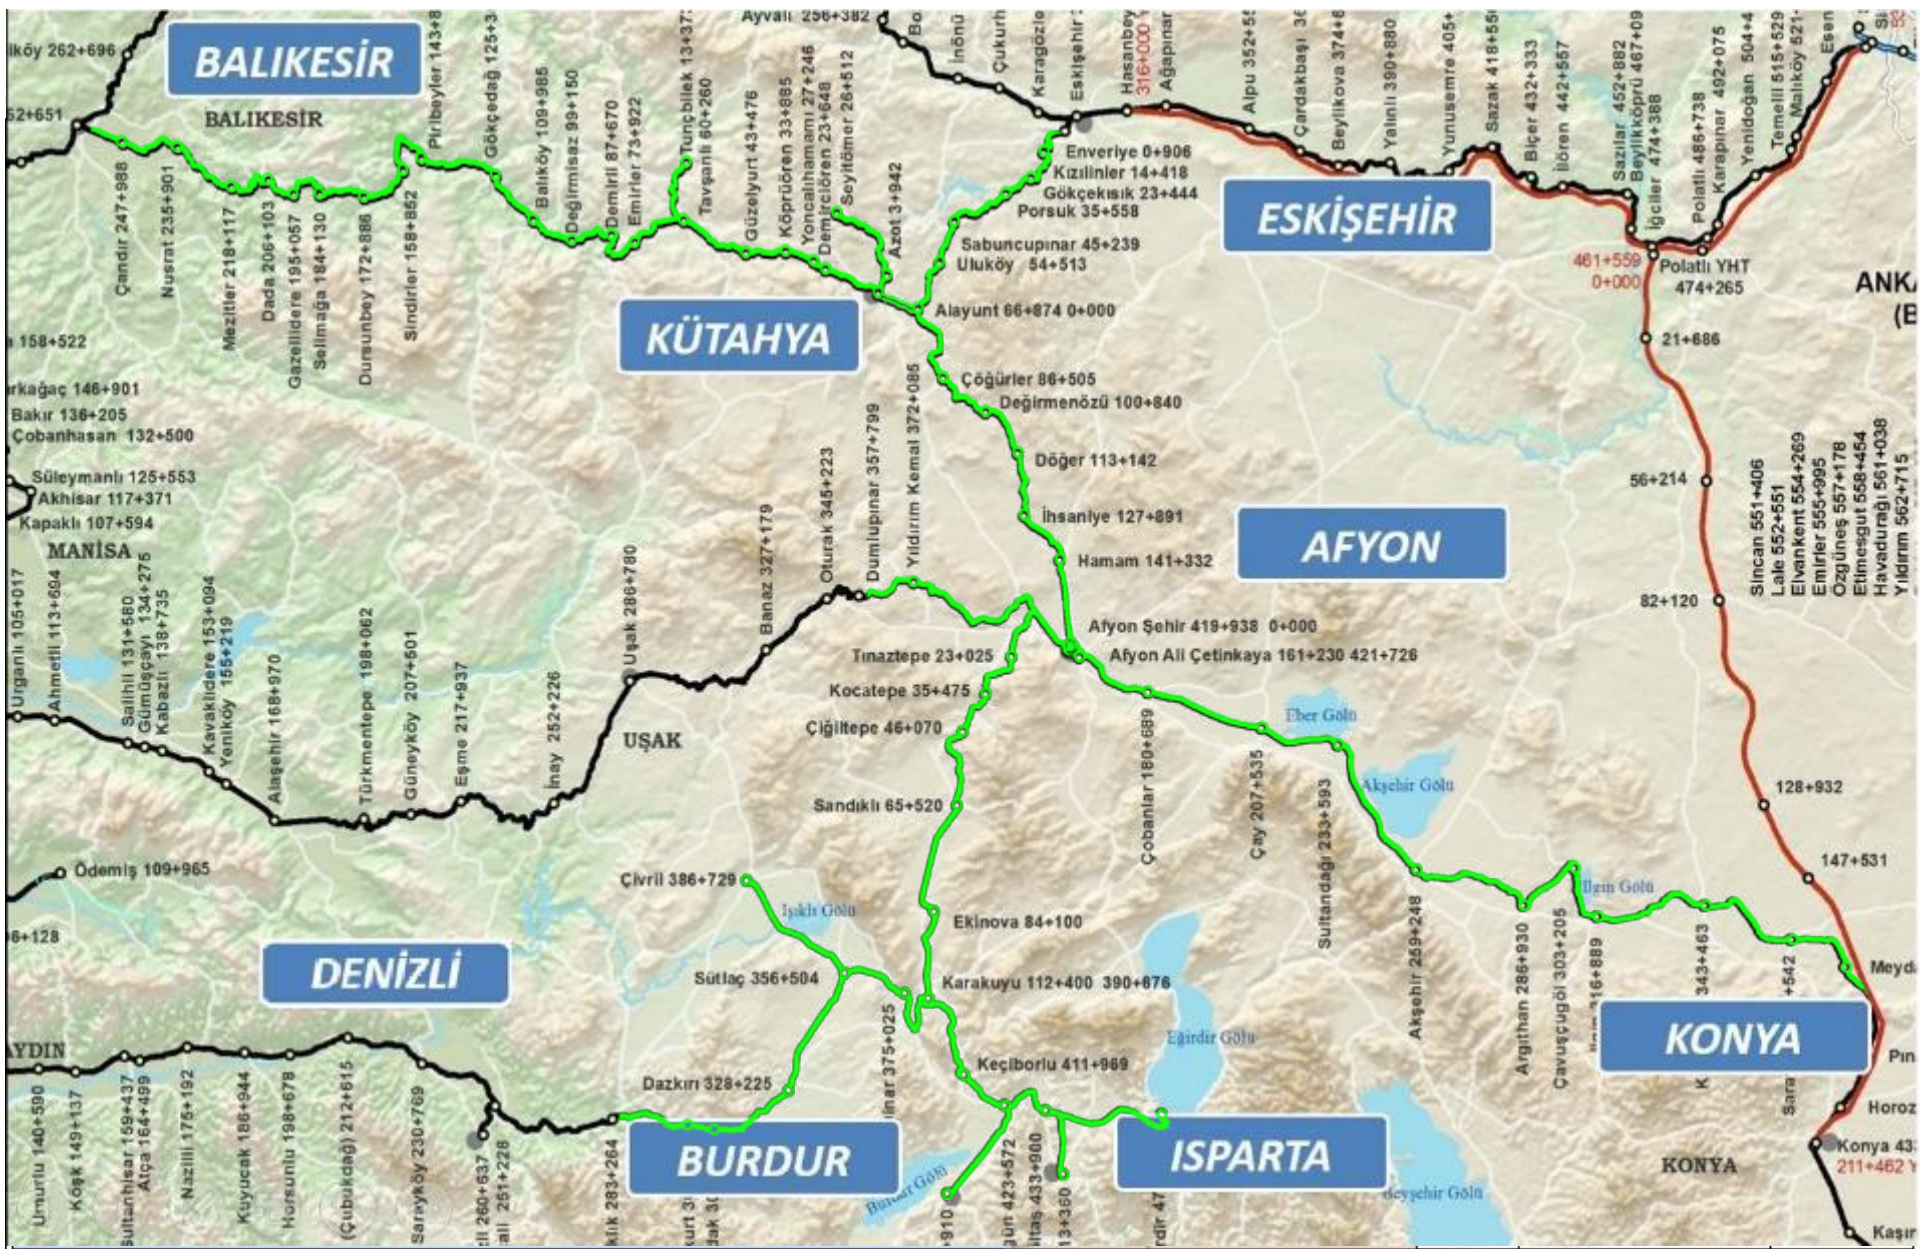



TCDD 7.Bölge Müdürlüğü bölgesinde bulunan 1387 km Demiryolu hattının 385 km ' si Afyonkarahisar il sınırlarında bulunmaktadır.

İl dahilinde 268 Memur 210 İşçi personel görev yapmaktadır. Günlük 6 yolcu treni 20 yük Treni işletilmektedir. Bölge genelinde Yıllık 3 milyon ton yük dolumu, 1 milyon yolcu taşınması programımız vardır.

AFYONKARAHİSAR İLİ
2017 YILI
YATIRIM DURUMU

1-TOPLANTI DÖNEMİ	:	2018/I
2-YATIRIMCI KURULUŞUN ADI	:	TCDD 7.Bölge Müdürlüğü -AFYONKARAHİSAR
3-TOPLAM PROJE SAYISI	:	49
4-PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI	:	Demiryolu-Ulaştırma
5-TOPLAM PROJE TUTARI	:	1.066.952.925 TL
6-ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	:	264.546.416 TL
7-YILI ÖDENEĞİ	:	348.924.750 TL
8-DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	:	318.532.442 TL
9-PARASAL GERÇEKLEŞME %	:	91
10-FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	:	67
11-BİTEN PROJE SAYISI	:	19
12-DEVAM EDEN PROJE SAYISI	:	25
13-İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	:	
14-BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	:	5
15-BAŞLANMAMA NEDENLERİ	:	1 adet yatırım Afyonkarahisar Belediyesinin kamulaştırma çalışmalarını tamamlayamaması
16-ÇÖZÜMLENMESİ İSTENİLEN SORUN VE DARBOĞAZLAR	:	1 adet yatırım Afyonkarahisar Belediyesinin kamulaştırma çalışmalarını tamamlayamaması
17-SORUN VE DARBOĞAZLARIN NEDENİ	:	Kamulaştırma, diğer kurumlara ait deplaselerin yapılmaması.
18-ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	:	Kamulaştırma, diğer kurumlara ait deplaselerin biran evvel yapılması.

TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR İLİ YATIRIMLARI

SR. NO	PROJE	PROJE SAYISI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL)	DÖNEM SONU HARCAMA (TL)	NAKDİ GERÇ. (%)
1	Yol Yenilemeleri ve İyileştirmeleri	30	38.786.651	37.941.107	98
2	Hemzemin Geçit İyileştirmeleri	7	1.841.533	1.683.347	91
3	Sinyalizasyon, Elektrifikasyon, Haberleşme ve Emniyet Tesisleri Tevsii ve Yenileme	3	29.685.520	6.438.800	22
4	Gar, İstasyon ve Diğer Hizmet Binaları ve Tesisleri Bakım ve Onarımı	4	4.316.070	3.634.212	84
5	Hızlı Tren Çalışmaları	2	274.216.600	268.756.600	98
6	Afyon Beton Travers Fabrikası Yatırımları	3	78.376	78.376	100
TOPLAM :		49	348.924.750	318.532.442	91

7. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Proje Hizmet Alımı

*18.09.2017 tarihinde 180.000 TL'ye sözleşme imzalandı.
Projenin yaklaşık yapım maliyeti : 14.000.000 TL olup 2018 yılı içinde
yapım ihalesi yapılacaktır.*











13 Nis 2017





ESKİŞEHİR - KONYA HATTI KM:159+852'DA KARAYOLU ALTGEÇİTİ
YAPILMASI (AFYON-MERKEZ OSB)

Sözleşme Tarihi

25.08.2016

Yer Teslimi

2.09.2016

İşin Süresi

240 gün

İşin Bitim Tarihi (Süre uzatımları dahil)

29.04.2017


Sözleşme Bedeli

5.328.966,12 TL

Diğer kurumlara ait deplaseler için yeterli alan olmaması, şevli kazının altgeçit etrafındaki yapıları tehdit etmesi nedeniyle projenin kazıklı sisteme dönüştürülmesine karar verilmiştir. İşin yeni sisteme göre projesi yaptırılmıştır.



AFYON-MERKEZ OSB

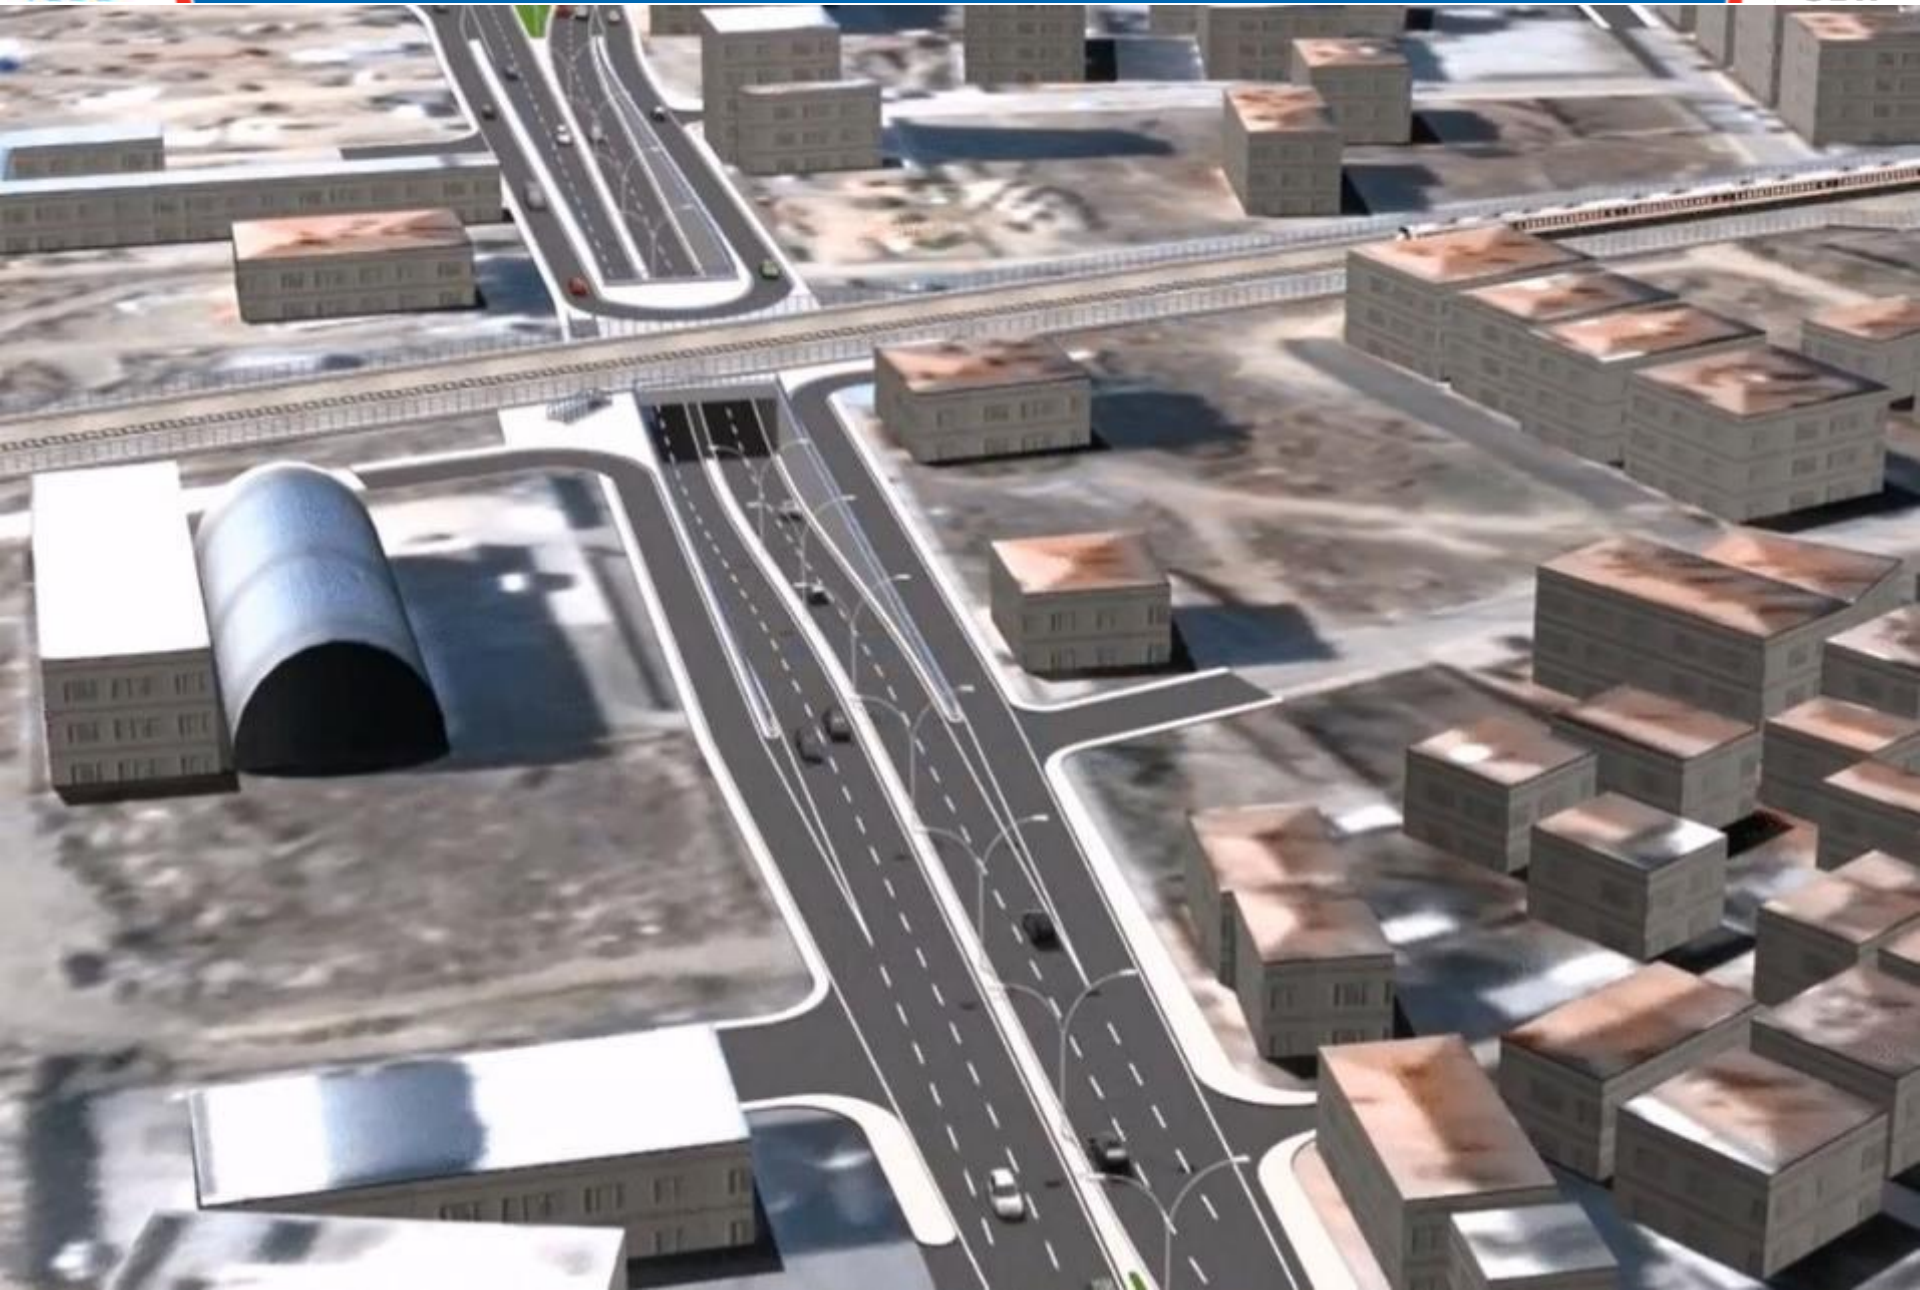

ESKİŞEHİR - KONYA HATTI KM:159+459'DA KARAYOLU ALTGEÇİTİ
YAPILMASI (AFYON-MERKEZ GAZLIGÖL)

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapılan kamulaştırma çalışmalarının bitmesine müteakip ihalesine çıkılacaktır





Afyonkarahisar İl sınırları içerisinde 21 adet otomatik bariyerli, 6 adet bekçili bariyerli, 224 adet çapraz işaretli (serbest) geçit ve 3 adet uzaktan idareli bariyerli olmak üzere Toplam: 254 adet hemzemin geçit bulunmaktadır. 2017 yatırım programındaki 28 adet hemzemin geçit den Bugüne kadar 12 adet hemzemin geçidin kauçuk kaplaması yapılmıştır.

6 Adet Hemzemin Geçit Alt-Üst Geçide dönüşümü projeleri Tamamlanma aşamasında olup 2018 yılı içinde yapım ihalesi yapılacaktır.

5 Adet Hemzemin Geçit Alt-Üst Geçide dönüşümü için proje ihalesi yapılacaktır.

(Afyon-Denizli- Burdur- Isparta)

303 Km' lik hat kesiminin 112 Km' lik ilk etabı ihale edilmiştir.



Sözleşme Tarihi 09.06.2015

Yer Teslimi 22.06.2015


İşin Süresi 690 + 240 + 203 +240 Gün

İş Bitim Tarihi 28.07.2018

İhale Bedeli 24.254.509 TL

Projenin ilerleme durumu fiziki % 24, parasal %53 dür.



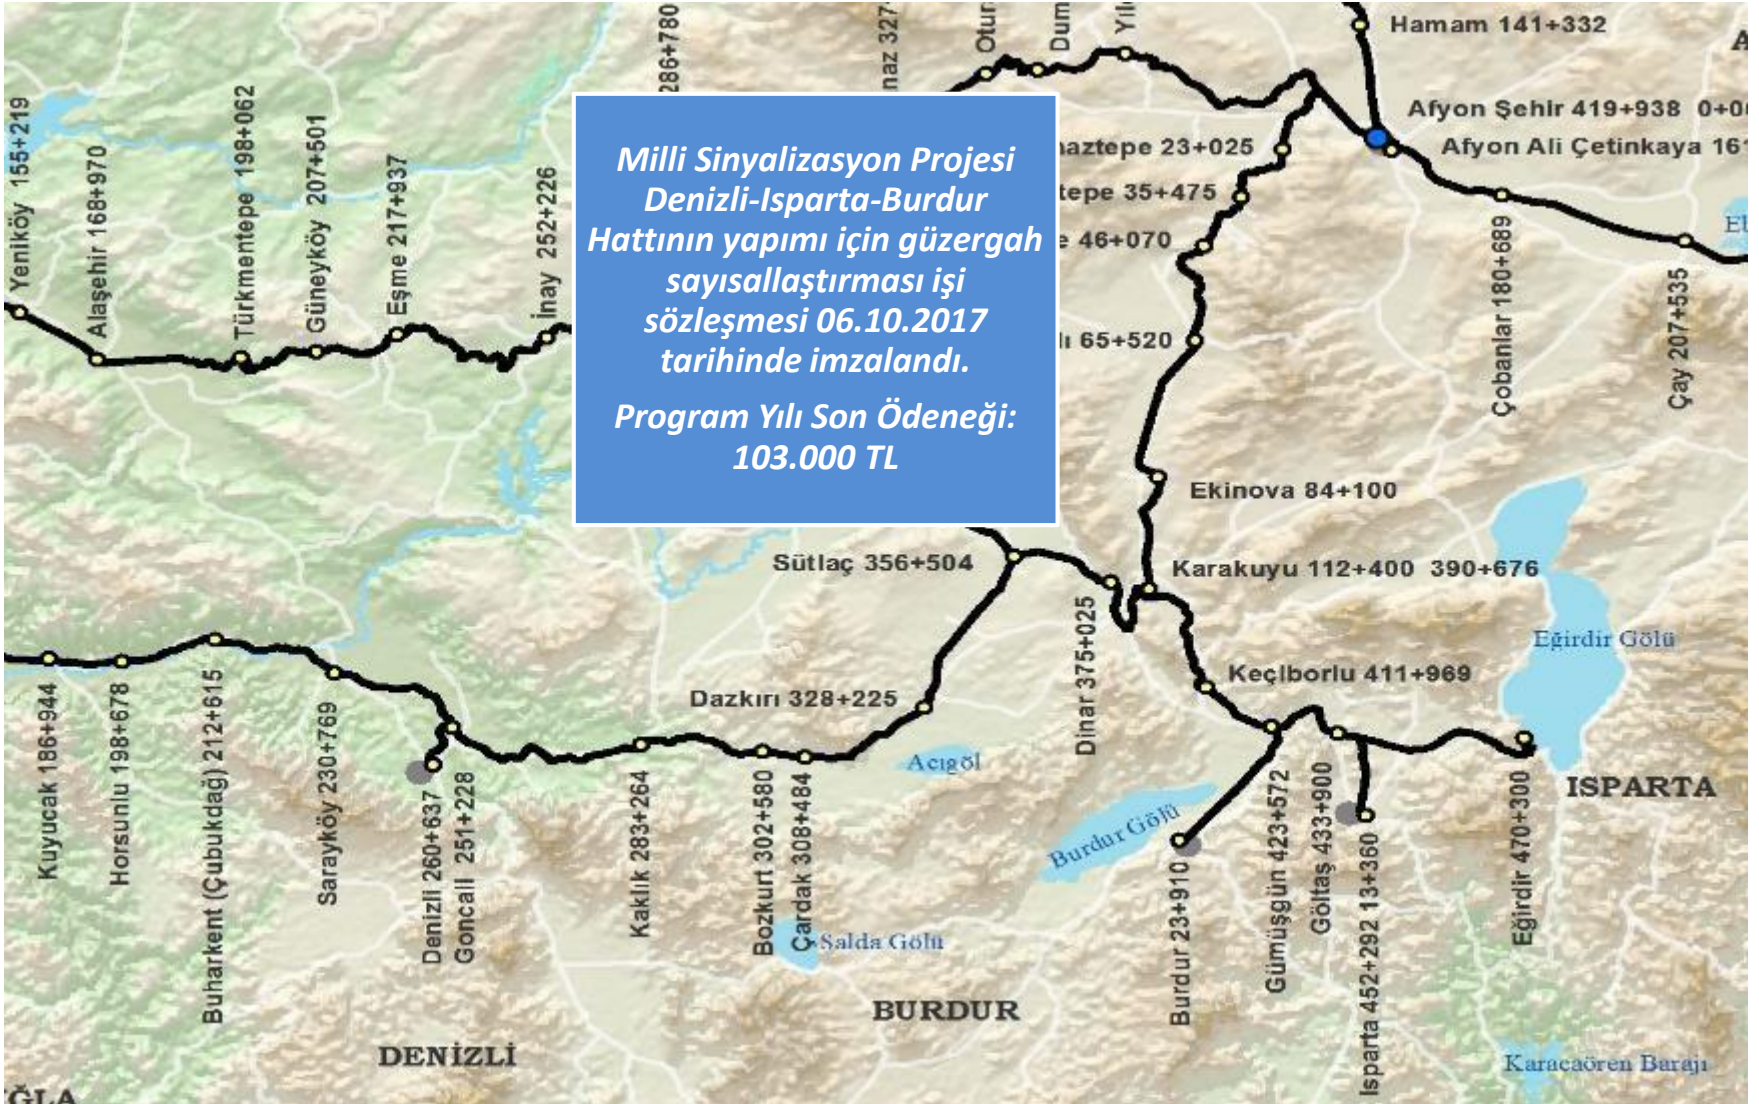

SİNYALİZASYON YATIRIMI İLE ;

- ***Günlük çalıştırılan yük ve yolcu trenlerinden daha fazla tren işletilmesi ile hat kapasitesi artacaktır.***
- ***Sinyalizasyon projesi tamamlandığında kapanacak İstasyonlar ve makasların merkezden tanzimi nedeni ile faal personel tasarrufu sağlanacaktır.***
- ***Sinyalizasyon sistemi ile ray kırılması ve yolun genel olumsuzluklarını, sistemin ihbar etmesi, kazaların önlenmesi ve seyrüsefer emniyetini arttıracaktır.***

2018 yılında Alayunt-Afyon-Konya Hat Kesiminde Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon-Telekomünikasyon Projeleri yapılması planlanmaktadır.

ALAYUNT-AFYON-KONYA

Bu amaçla (72-73 YBOM muntıkası) Poz aplikasyonu ve Güzergah Sayısallaştırması işi sözleşmesi 17.10.2017 tarihinde imzalandı.

Program yılı son ödeneği: 162.000 TL




Manisa-Uşak-Afyonkarahisar Hat Kesiminde (415km) Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon-Telekomünikasyon Projeleri yapılması 2010.E010070.07.01-02 PYP No ile yatırıma alınmıştır. (50 km'si Afyonkarahisar İlinde)



ELEKTRİFİKASYON YATIRIMI İLE ;

- Elektrik enerjisi yönünden daha az dışa bağımlı olan kendi enerji kaynaklarımızdan azami derecede istifade edilerek, ithal edilen petrole ödenen dövizden tasarruf edilecektir.**
- Genel olarak 1 adet elektrikli lokomotifin çekeri 2 adet dizel lokomotifin çekerine eşittir. Böylece az lokomotif ile çok yük daha kısa sürede cer edileceğinden hat kabiliyeti artacaktır.**
- Maliyet olarak elektrikli lokomotiflerin gideri, dizel lokomotiflerin yakıt giderinin % 33 ne tekabül etmektedir.**
- Elektrikli lokomotifler işletme ve bakım kolaylığı sağlamaktadır.**

Afyonkarahisar OSB Yük Merkezi ve İltisak Hattı Bağlanması

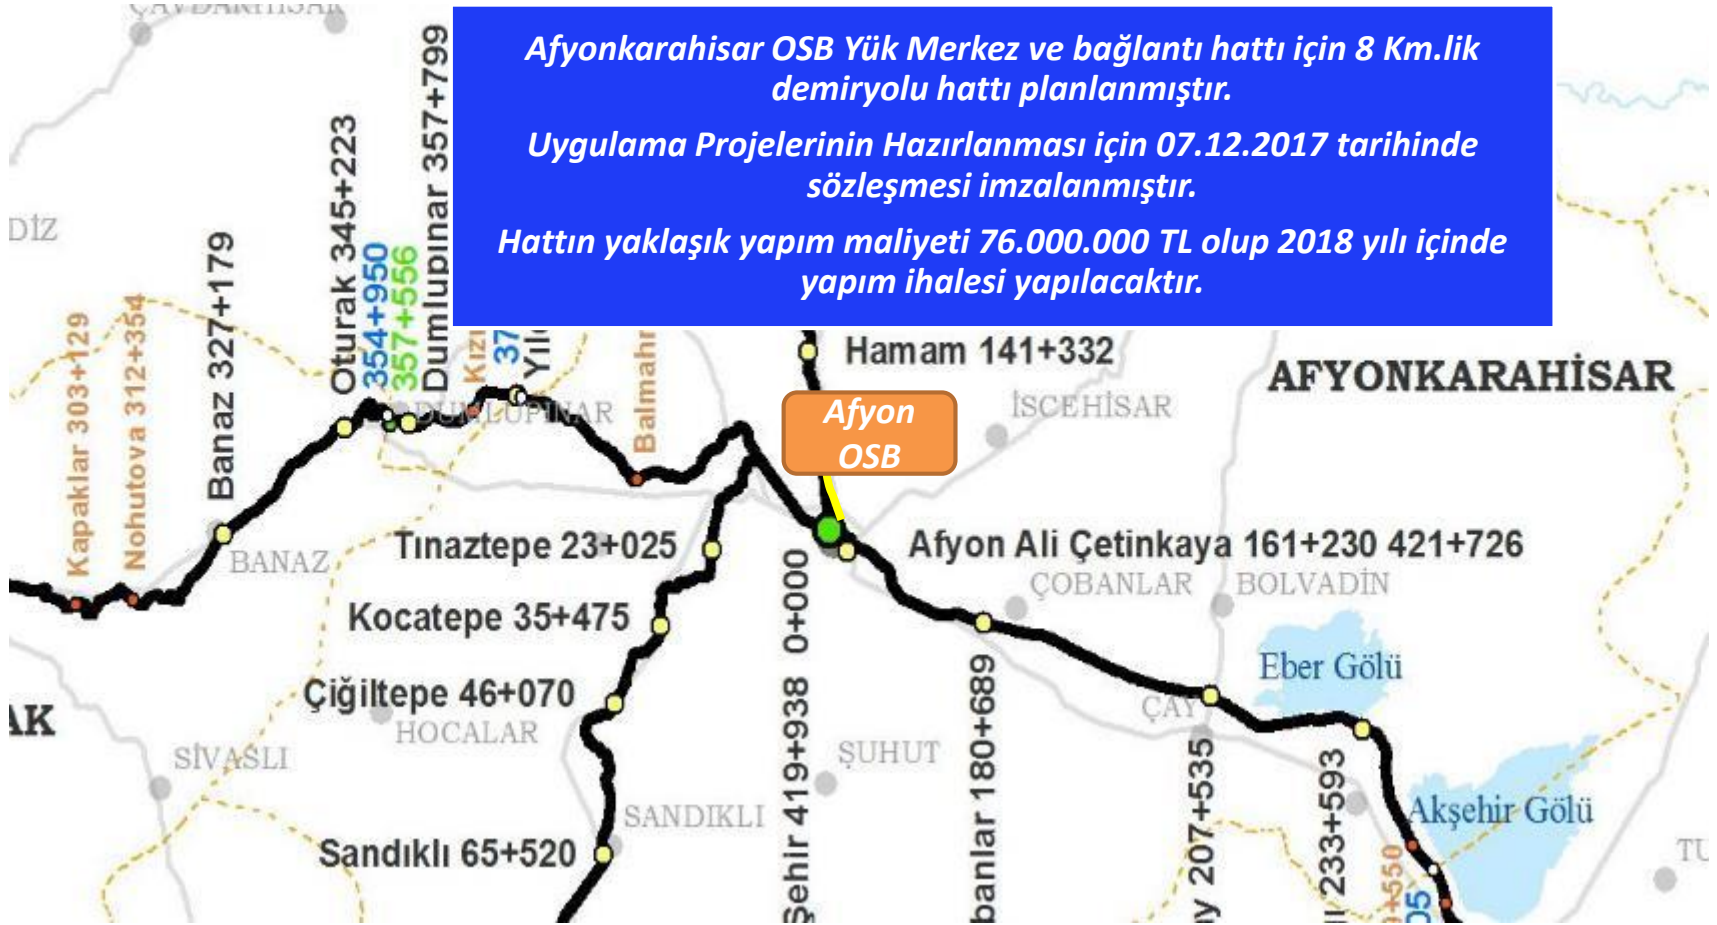


Afyonkarahisar OSB Yük Merkez ve bağlantı hattı için 8 Km.lik demiryolu hattı planlanmıştır.

Uygulama Projelerinin Hazırlanması için 07.12.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.


Hattın yaklaşık yapım maliyeti 76.000.000 TL olup 2018 yılı içinde yapım ihalesi yapılacaktır.

Afyonkarahisar OSB Yük Merkezi ve İltisak Hattı Bağlanması

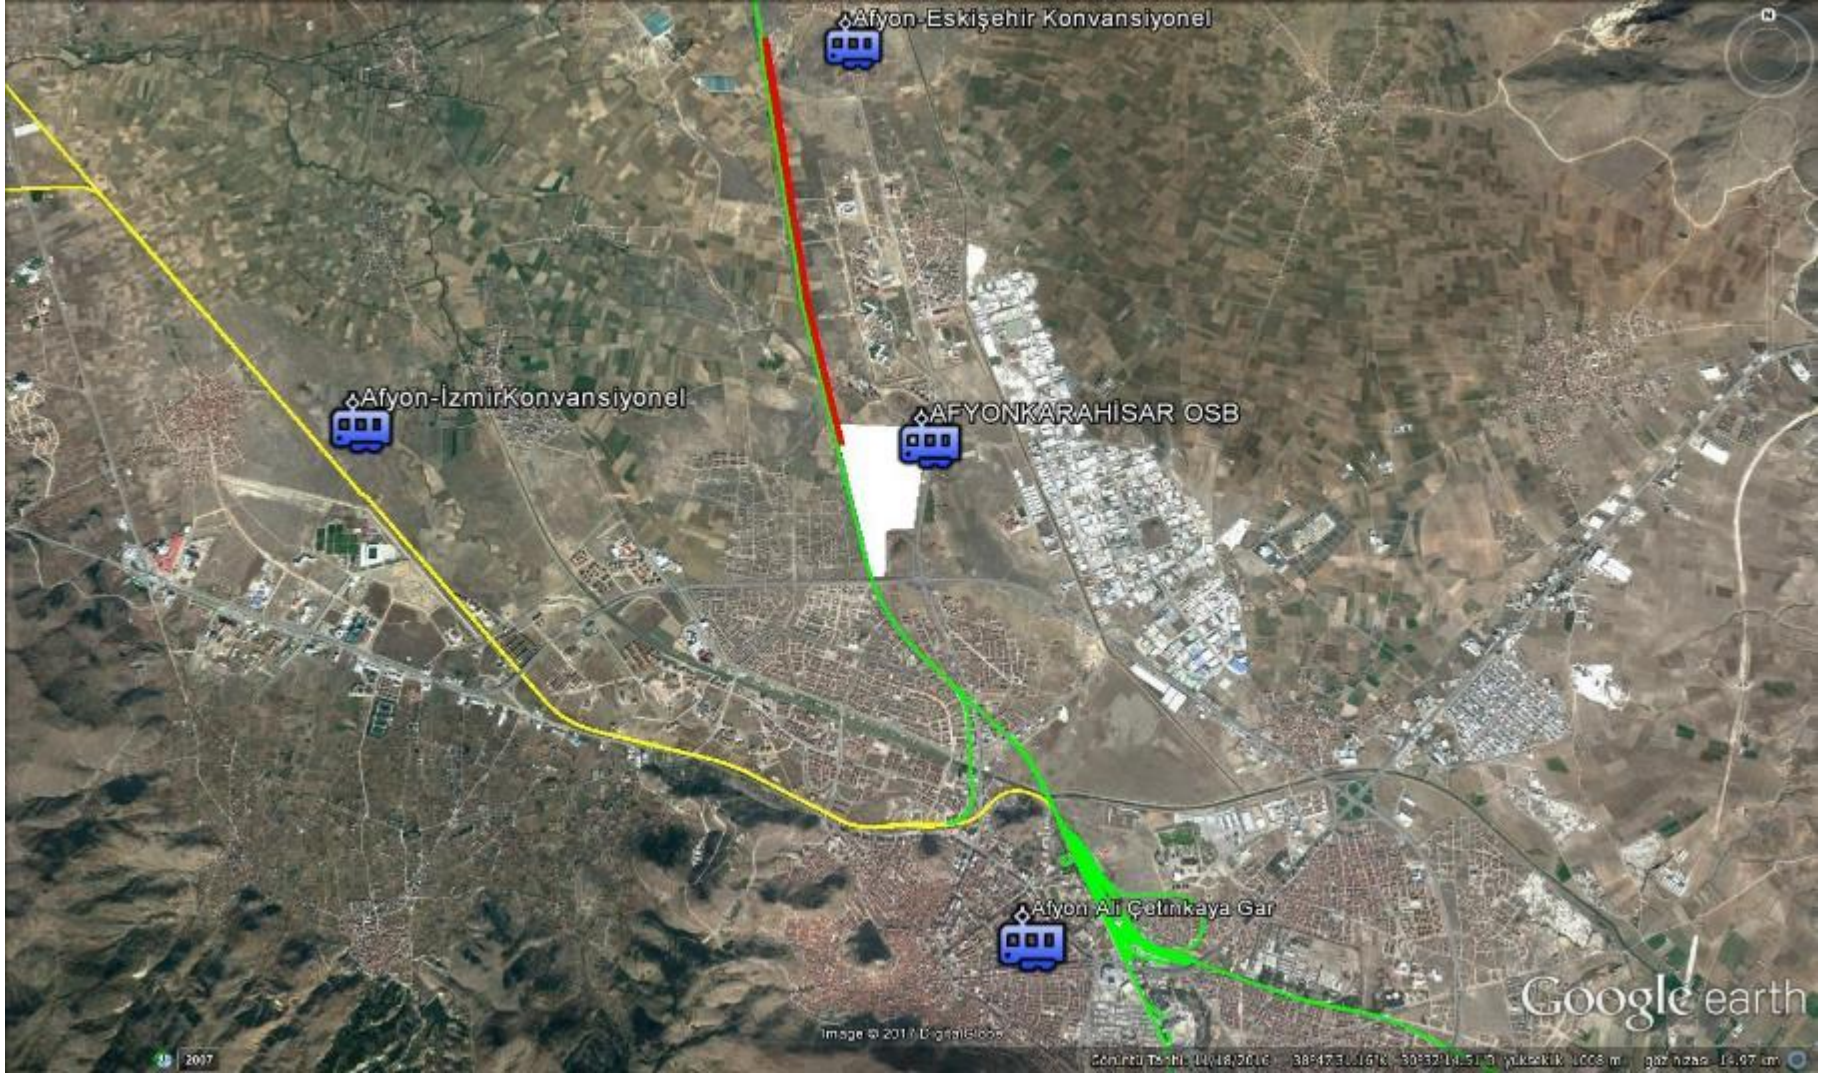

Afyonkarahisar İscehisar Mermer İhtisas OSB Yük Merkezi ve İltisak Hattı Bağlanması

İscehisar OSB Yük Merkezi -Afyonkarahisar arasında 14 Km.lik demiryolu hattı planlanmıştır.
Uygulama Projelerinin Hazırlanması için 04.12.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.Hattın yaklaşık yapım maliyeti 142.000.000 TL olup 2018 yılı içinde yapım ihalesi yapılacaktır.

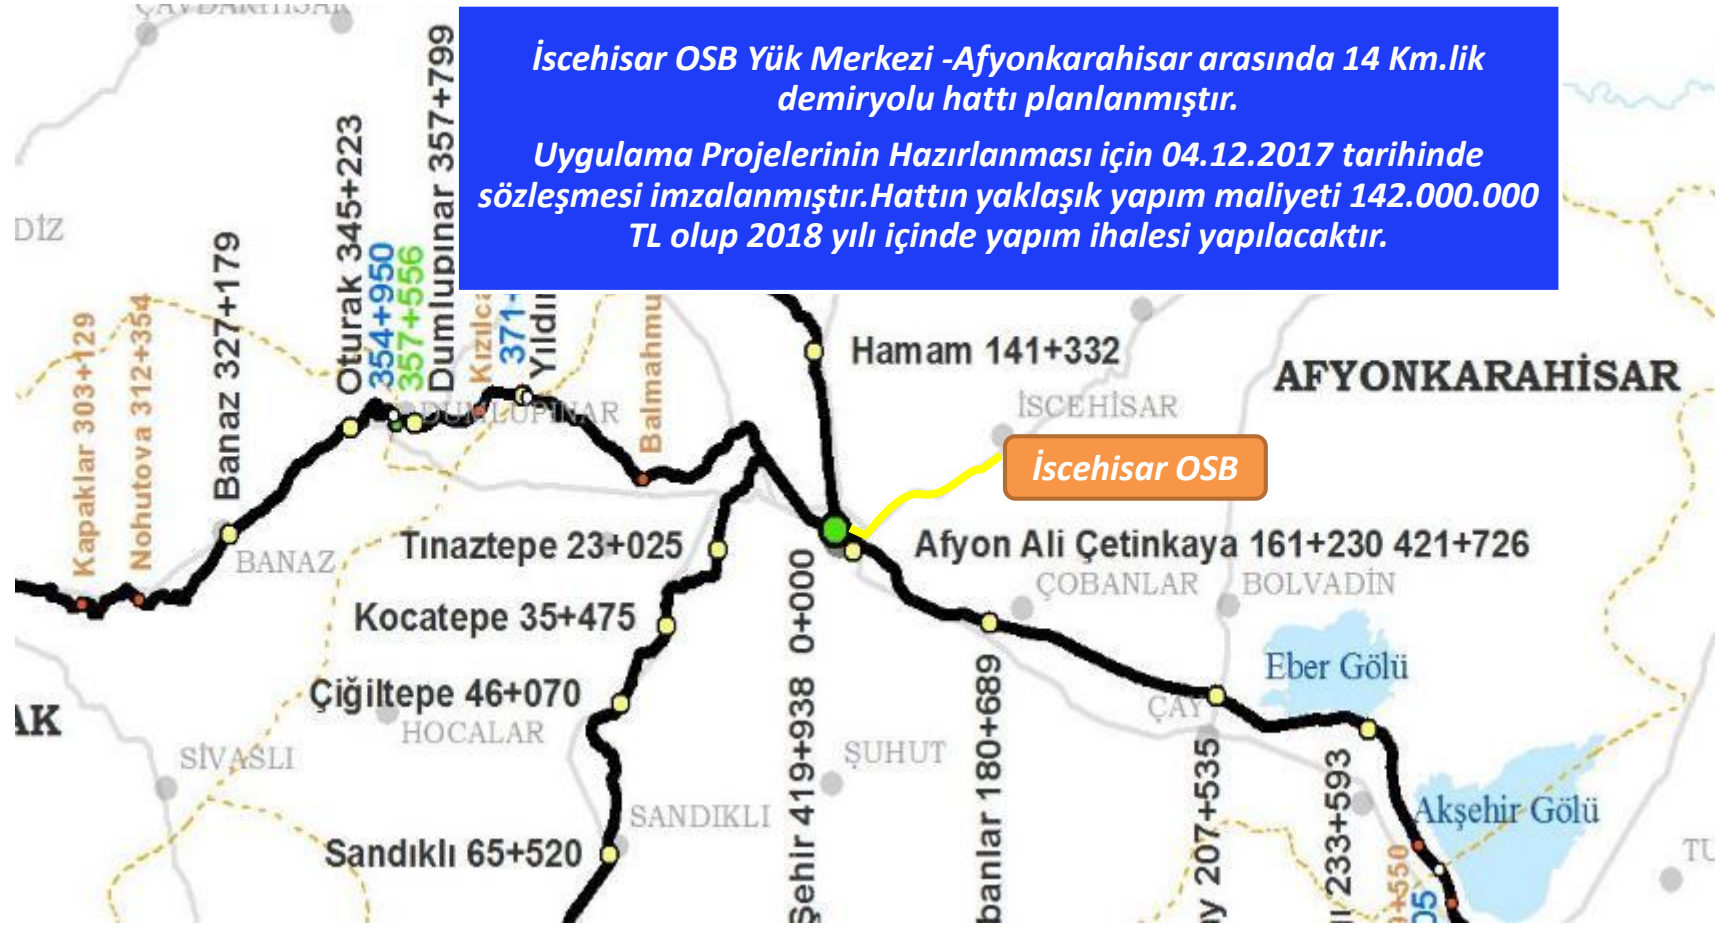


Afyonkarahisar İscehisar Mermer İhtisas OSB Yük Merkezi ve İltisak Hattı Bağlanması





ANKARA-İZMİR YHT

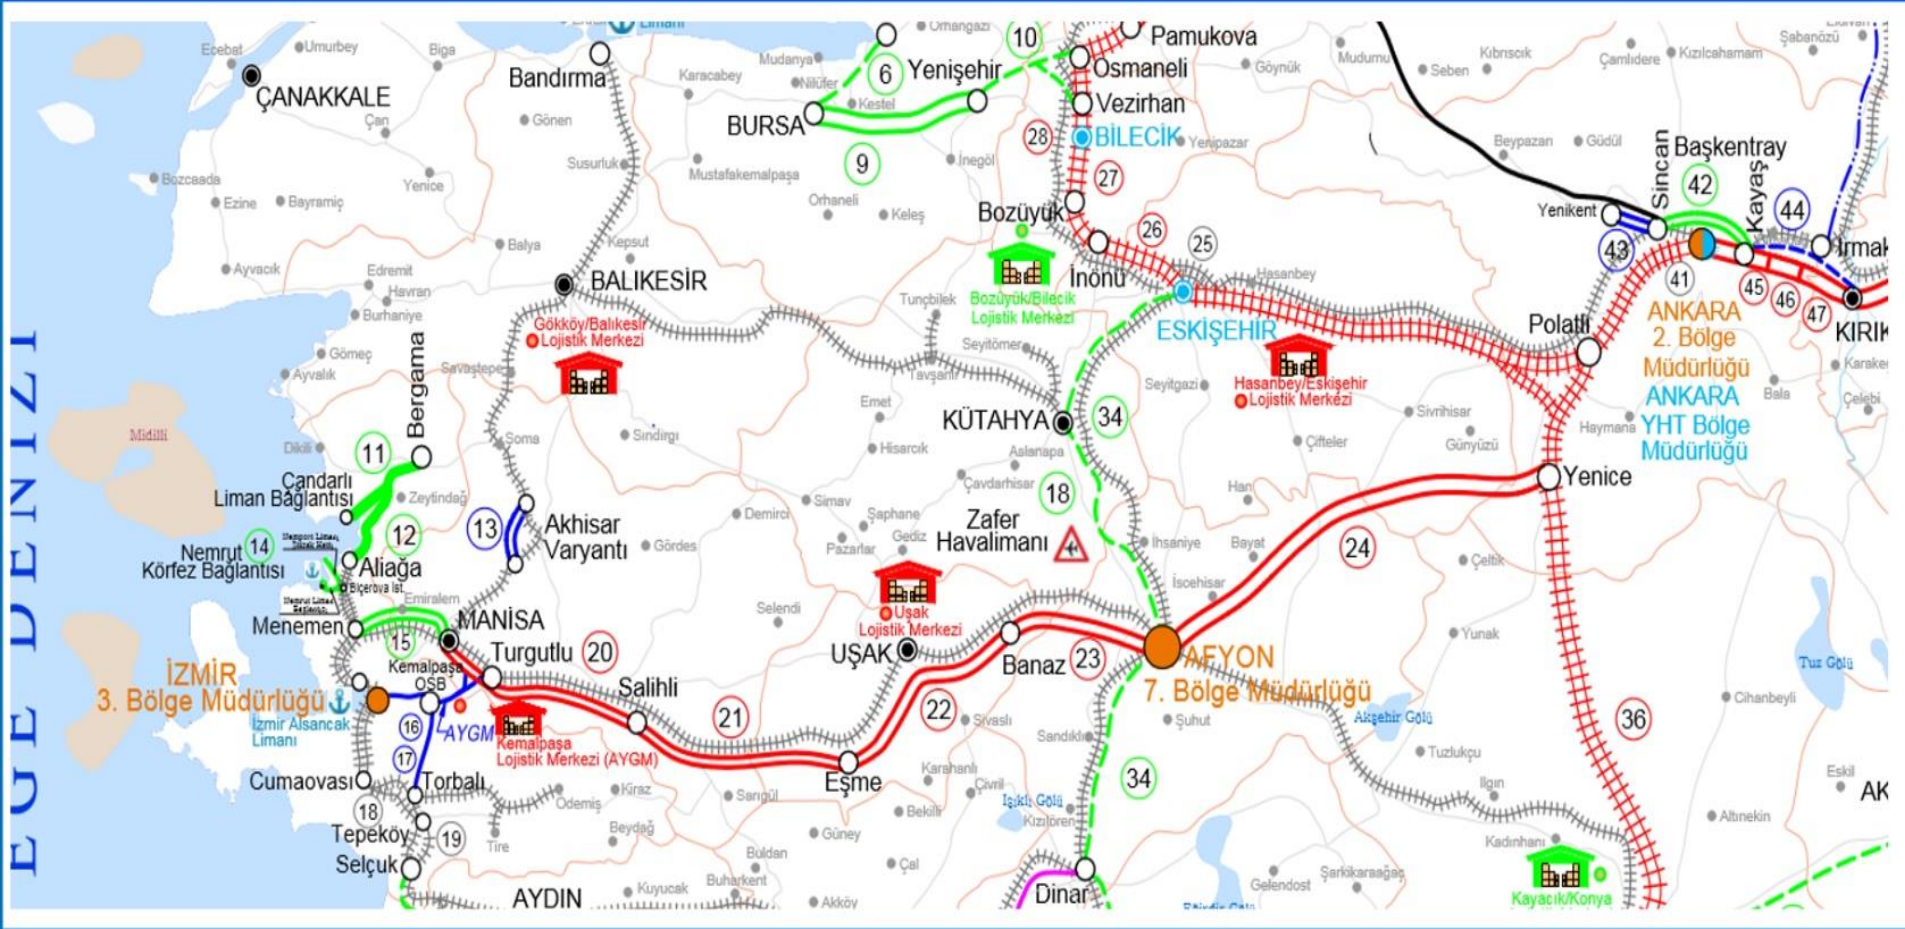












ESKİŞEHİR - KÜTAHYA (Alayunt) - AFYONKARHİSAR (Zafer Havaalanı) - BURDUR - ISPARTA - ANTALYA YENİ DEMİRYOLU

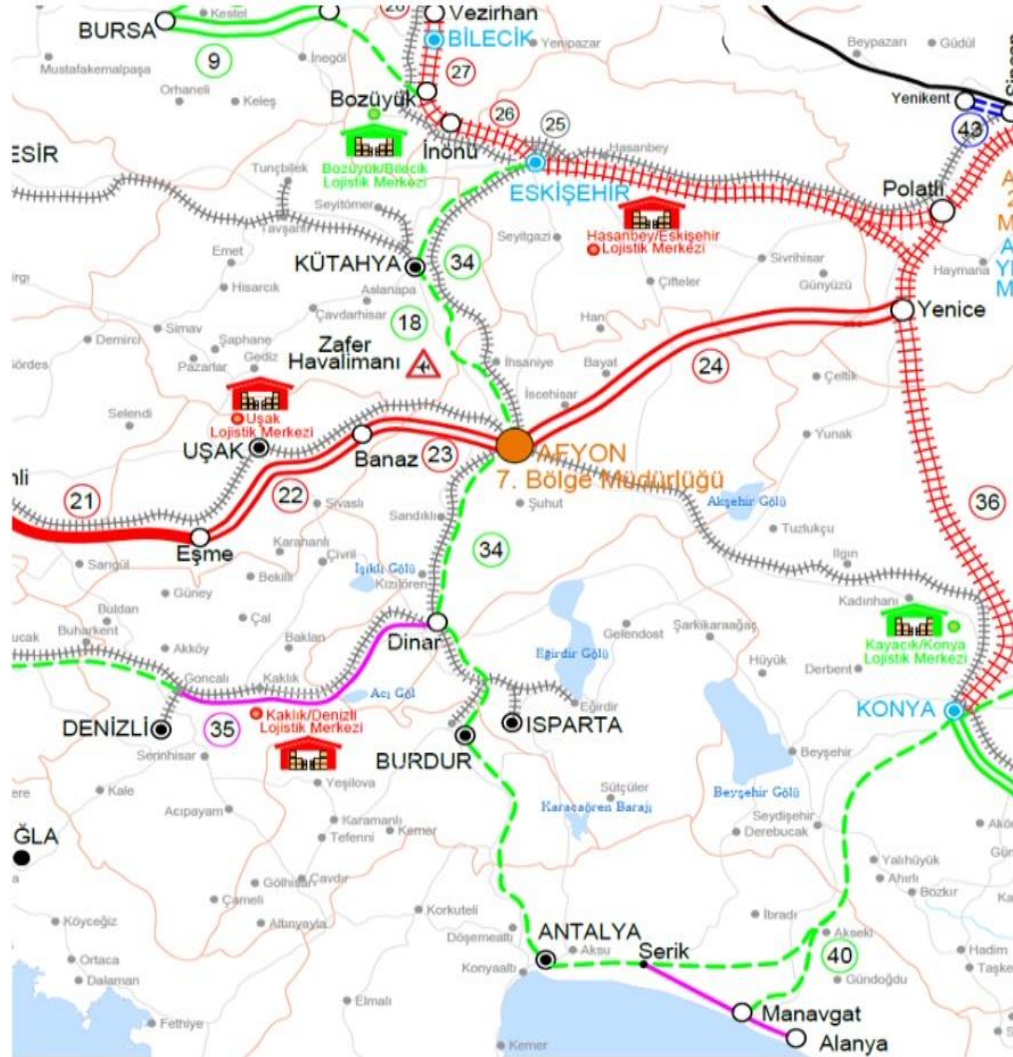

ESKİŞEHİR - KÜTAHYA (Alayunt) - AFYONKARHİSAR (Zafer Havaalanı)- BURDUR - ISPARTA - ANTALYA YENİ DEMİRYOLU (KUZEY-GÜNEY KORİDORU)		HEDEF 2018	
Proje Hazırlama Bedeli	35.570.000 TL	%8 FİZİKİ	%2 NAKDİ
Tahmini Yapım Bedeli	8.447.000.000 TL (AÜEST)		
Sözleşme Tarihleri	18.04.2016 (Esk-Afy) 06.02.2017 (Afyon-Burdur) 27.10.2016 (Bur.-Ant.)	Garanti	--
2017 Ödeneği	13.670.000 TL	Kamulaştırma Bedeli	--
<u>TEKNİK ÖZELLİKLER</u>		<u>ÖNEMLİ GELİŞMELER VE HEDEFLER:</u>	
Yüklenici Firma : --- Dizayn hızı 200 km/sa Eskişehir –Afyonkarahisar 137 km (Yüksel Domaniç) Afyonkarahisar – Burdur 133 km (Tekfen Müh.) Burdur - Antalya 142 km (Pro Yapı)		Eskişehir-Afyonkarahisar: Mayıs 2018'de tamamlanacaktır. Afyonkarahisar – Burdur: : Ekim 2018'de tamamlanacaktır. Burdur-Antalya: Mayıs 2018'de tamamlanacaktır.	
İşin Niteliği: Altyapı, Üstyapı Etüt-Proje İşi		2018 yılı içerisinde yapım olarak Yatırım Programına teklif edilecektir.	
Güzergah Uzunluğu	:412 km		
Toplam Hat Uzunluğu	: 824 km		



İSTASYONLAR	GELEN (TON)	GİDEN (TON)	TOPLAM (TON)
AFYON A.ÇETİNKAYA	49.928	158.538	208.466
AFYON ŞEHİR	100.929	5.495	106.424
BÜYÜKÇOBANLAR	10.943	13.760	24.703
DAZKIRI	30	1.679	1709
DİNAR	21.500	9.173	30.673
EKİNOVA	-	-	-
SANDIKLI	1.134	1.398	2.532
YILDIRIMKEMAL	700	-	700
ÇAY	1.509	18.909	20.418



İSTASYONLAR	GELEN (TON)	GİDEN (TON)	TOPLAM (TON)
ÇİĞİLTEPE	90	-	90
İHSANİYE	1.200	16.114	17.314
TOPLAM :	187.963	225.066	413.029



✓ Afyon Gar'da :

*2 Adet Mavi Tren (Konya Mavi)

*2 Adet Ekspres Tren (Pamukkale Ekspres Treni.)

*2 Adet Afyon çıkışlı – varışlı Bölgesel Ekspres (Afyon-Eskişehir-Afyon) Olmak üzere

6 Trenle hizmet verilmektedir.

2017 Yılında 35.880 yolcu taşınmıştır.



ARZ EDERİM

TCDD
